

【番号】さ28-1

凡例


- 通学路
- 要対策箇所

凡例

— — — —	通学路
---------	-----

—— 要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

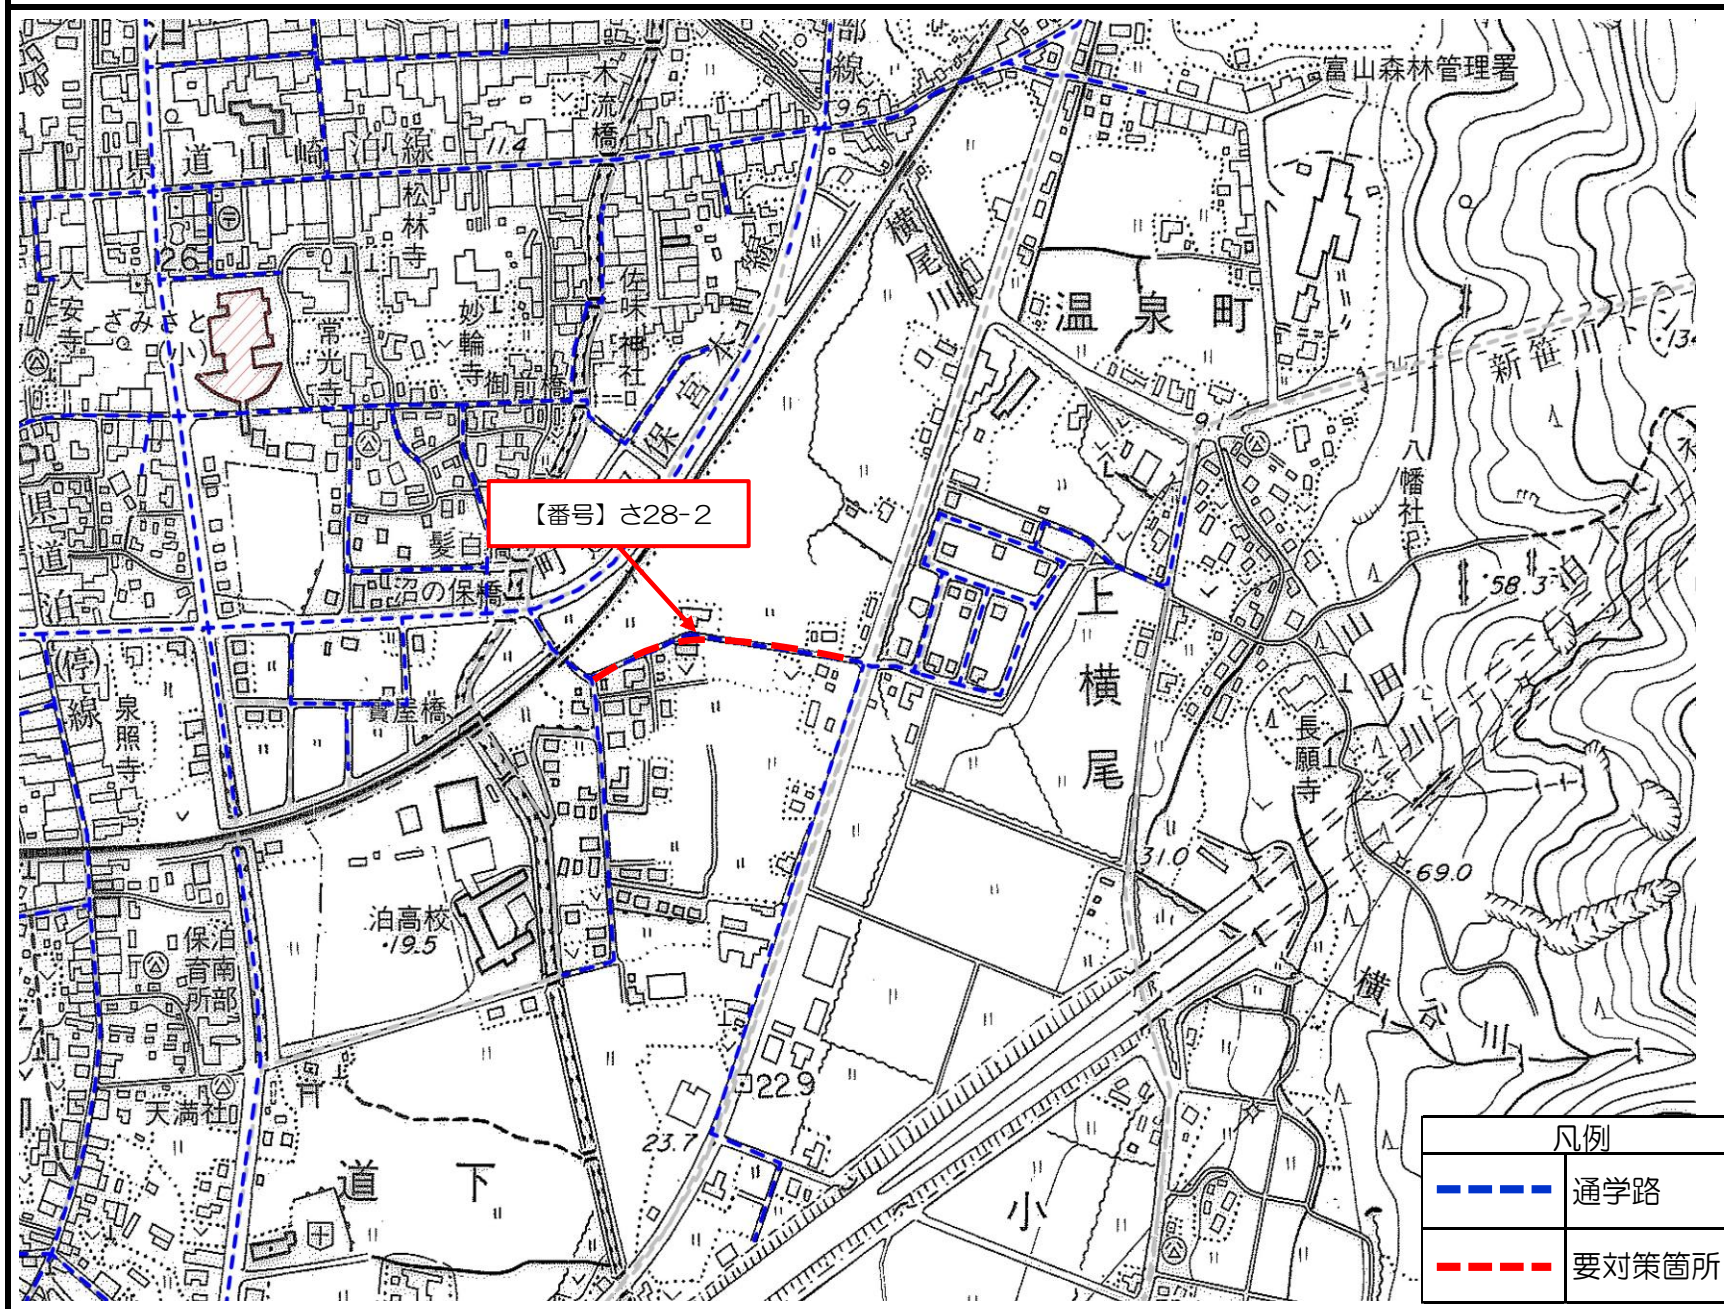

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】さ28-1 【箇所】泊地内 【路線】県道入善朝日線 【対策】実施中 【対策機関】富山県



【点検結果】

- ・歩道が無く、交通量が多いため危険である。

【対策内容と実施状況】

- 対策内容
道路の拡幅改良・歩道の整備
- 実施状況
R10年度に完成
(その他注意喚起の路面表示を追加)

【番号】さ28-2 【箇所】横尾地内 【路線】町道沼保横尾線 【対策】実施済 【対策機関】朝日町




【点検結果】

- ・道路幅員が狭く、歩道が無いいため危険である。

【対策内容と実施状況】

- 対策内容
道路の拡幅（路肩拡幅）
- 実施状況
実施済

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

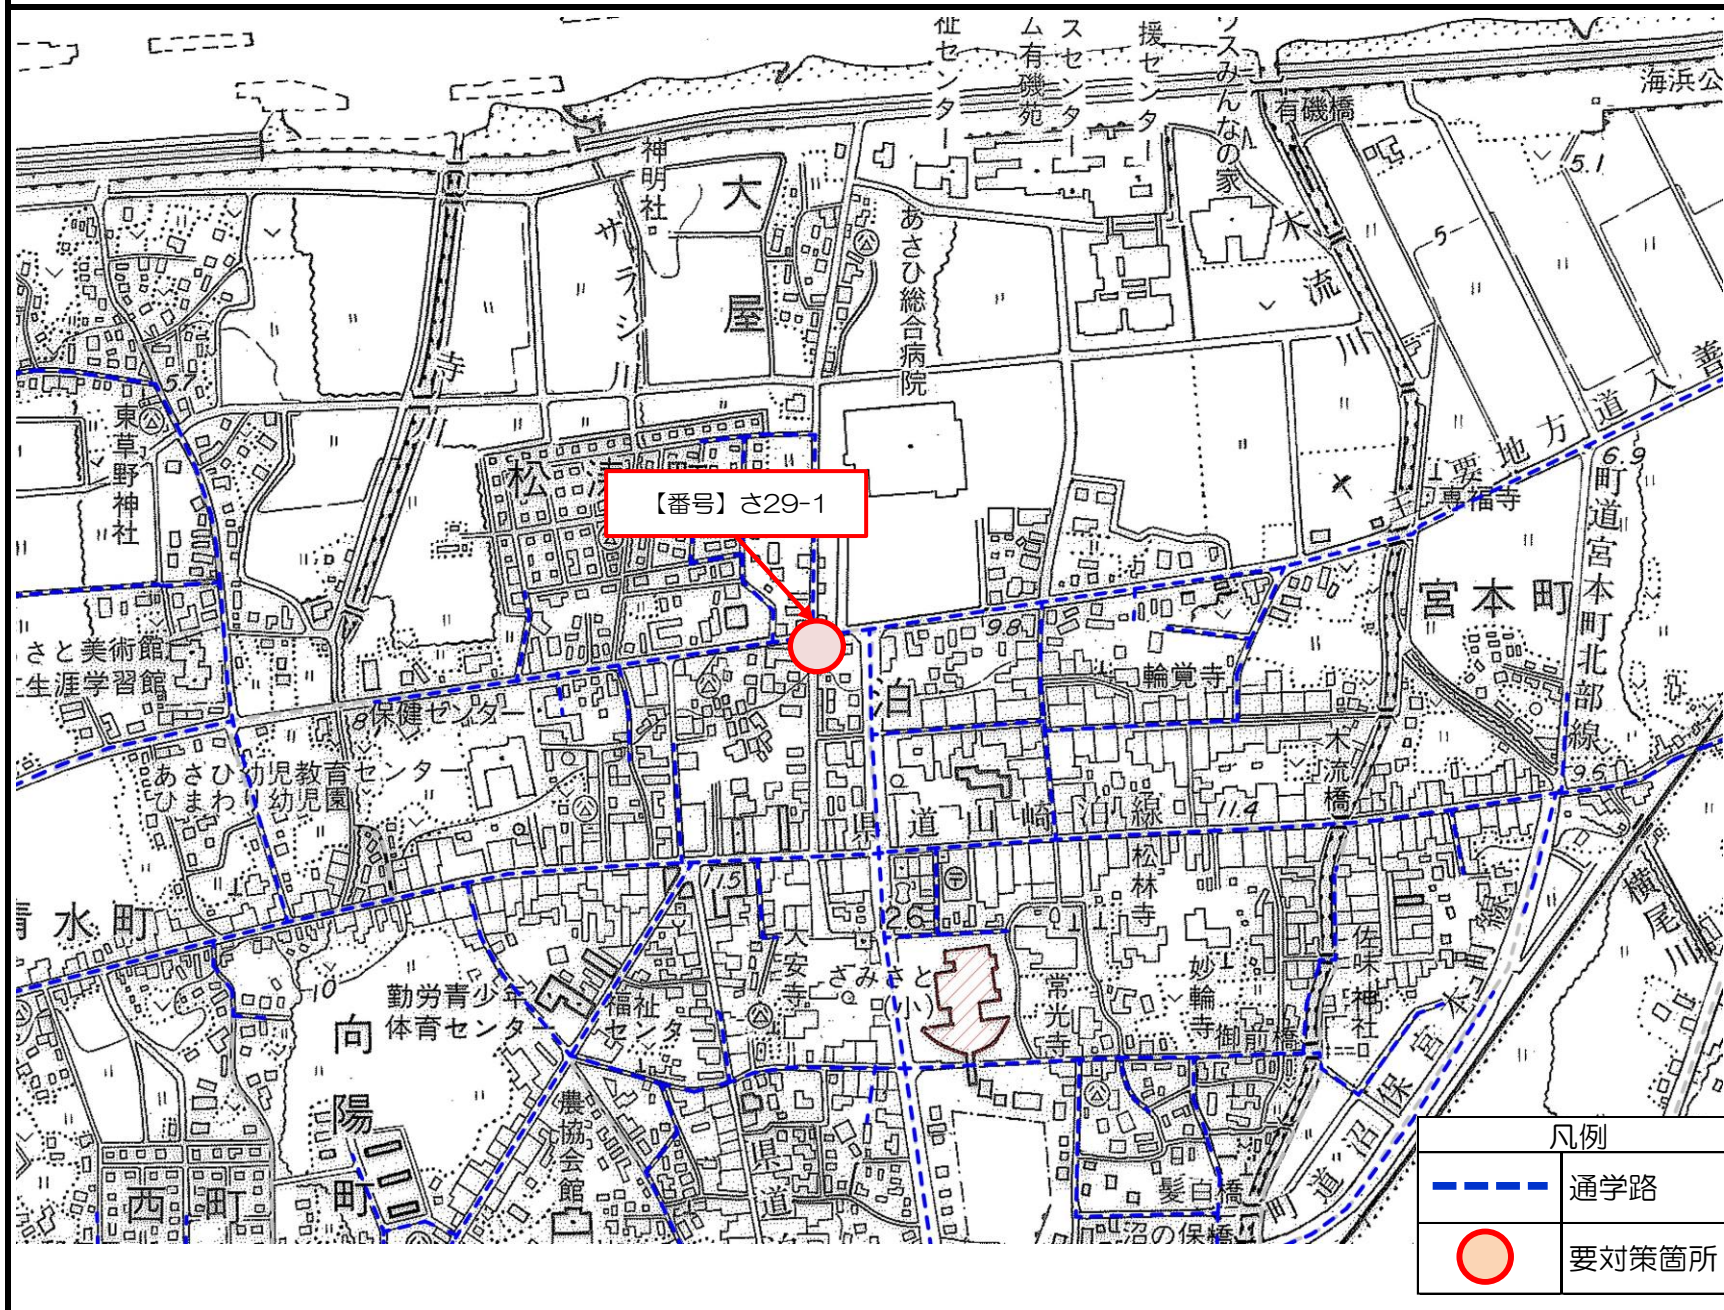

【番号】さ29-2

凡例

	通学路
	要対策箇所

凡例

通学路



要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】さ29-1 【箇所】泊地内 【路線】町道泊桜町線 【対策】実施済 【対策機関】朝日町



【点検結果】

- ・交通量が多いため危険である。

【対策内容と実施状況】

- 対策内容
路面表示（イメージハンプ）の設置
- 実施状況
実施済

【番号】さ29-2 【箇所】桜町地内 【路線】町道桜町町南保3号線 【対策】実施済 【対策機関】朝日町




【点検結果】

- ・路肩（交差点付近）に水路があり、転落防止対策が無く危険である。


【対策内容と実施状況】

- 対策内容
転落防止柵の設置
- 実施状況
実施済

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

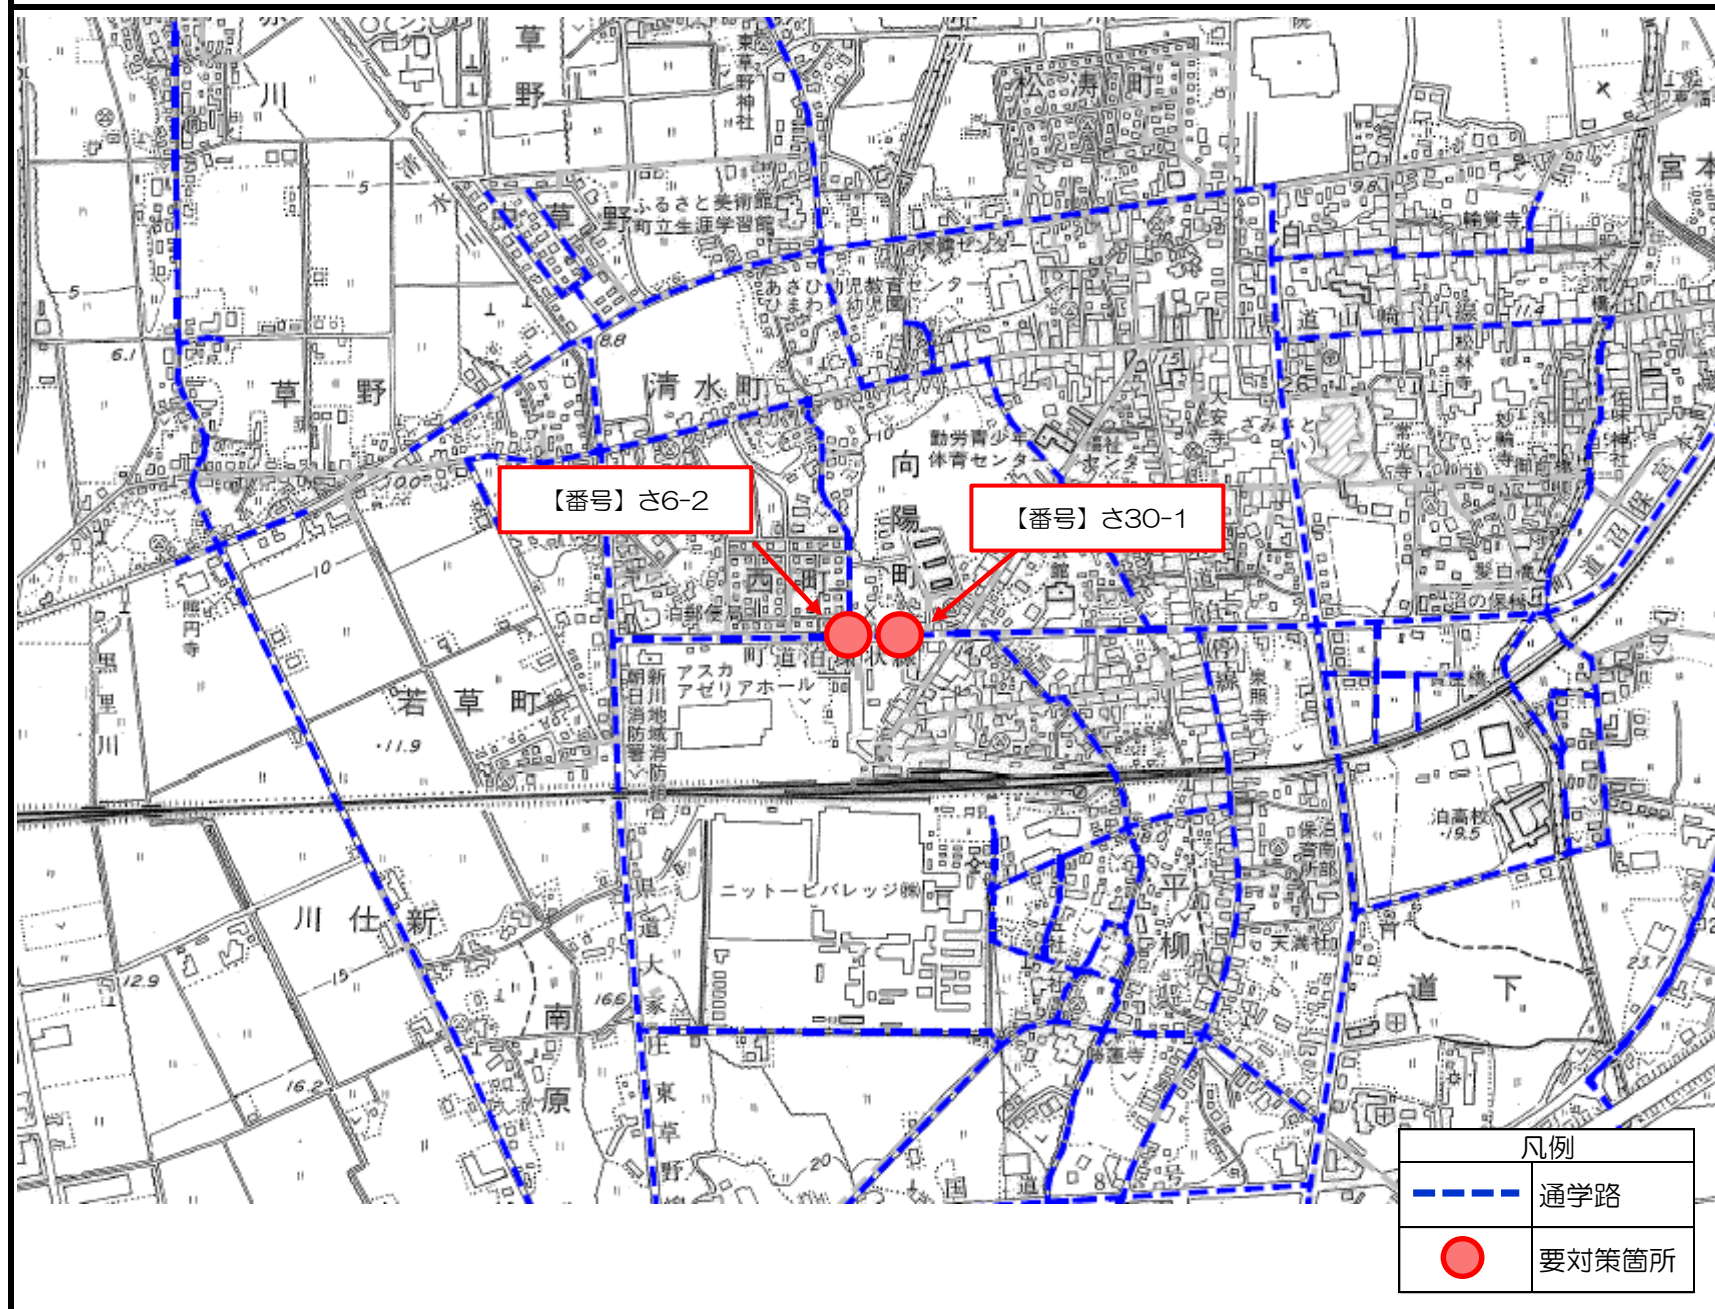

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

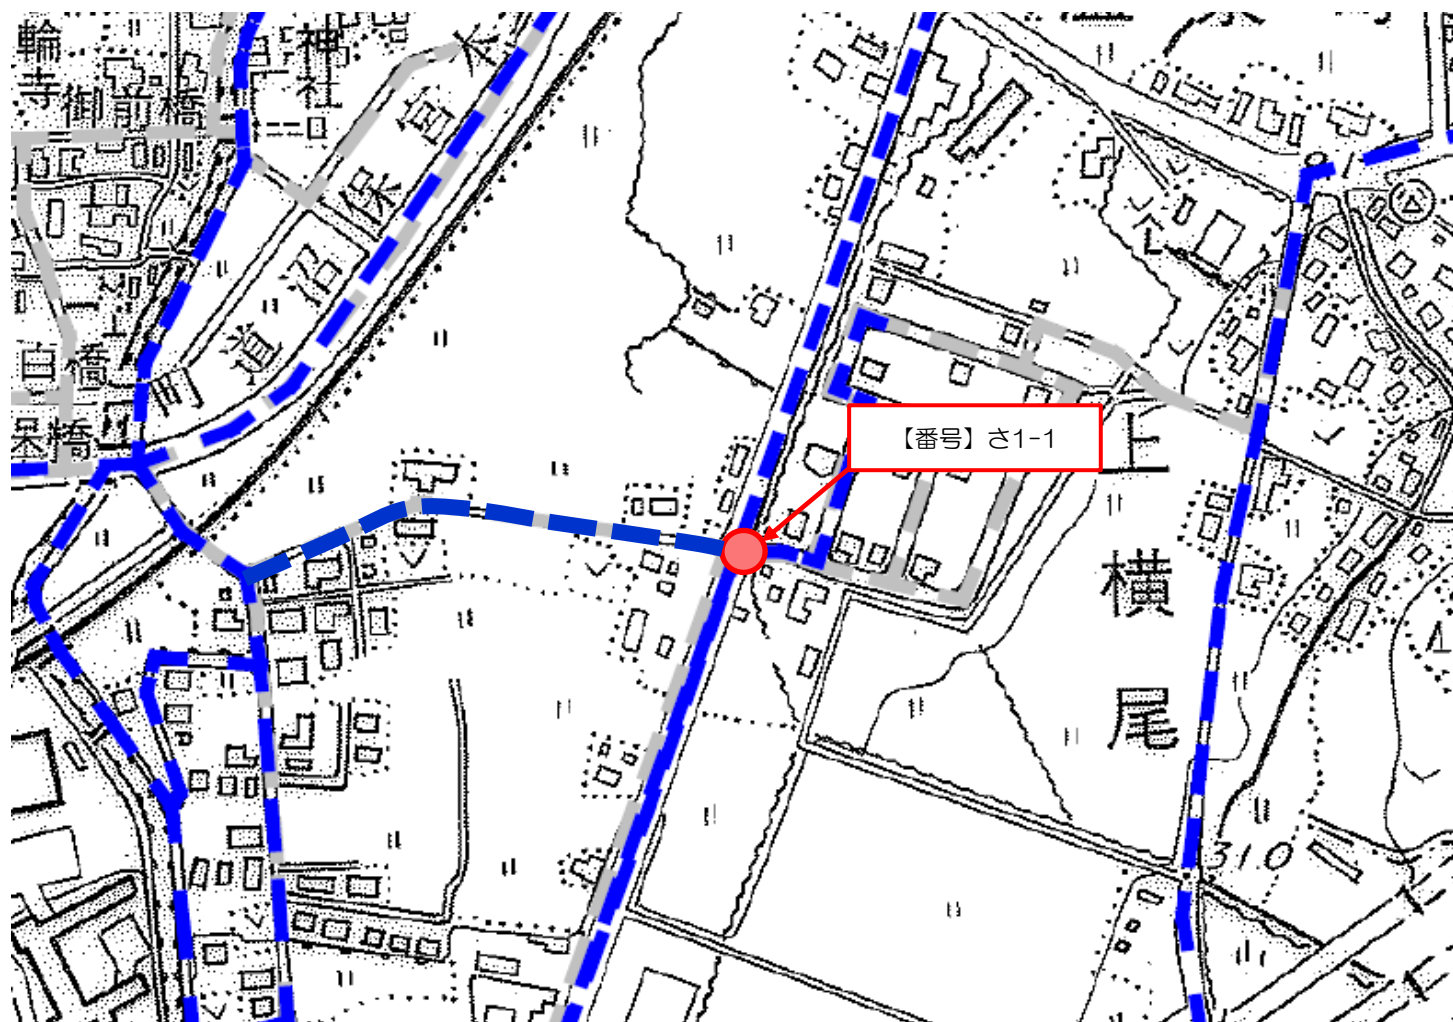

凡例	
	通学路
	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】さ30-1 【箇所】平柳地内 【路線】町道泊環状線 【対策】実施済 【対策機関】入善警察署



【点検結果】

- ・ブロック塀があり危険

【対策内容と実施状況】

○対策内容

ブロック塀の補強又は撤去

○実施状況

実施済（ブロック塀の撤去及び安全な囲いの新設）

【番号】さ1-1 【箇所】横尾地内 【路線】国道8号、町道沼保横尾線 【対策】実施済 【対策機関】国



【点検結果】

- ・信号交差点での安全確保が必要（信号待ち時など）

【対策内容と実施状況】

○対策内容

防護柵等の設置

○実施状況

実施済

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ6-2 【箇所】 朝日町交番交差点 【路線】 町道泊環状線、停車場東草野線 【対策】 検討中 【対策機関】 朝日町



【点検結果】

- ・交通量が多く、車の速度が速いため危険

【対策内容と実施状況】


○対策内容

ドット線を路面に追加する

○実施状況


検討中

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

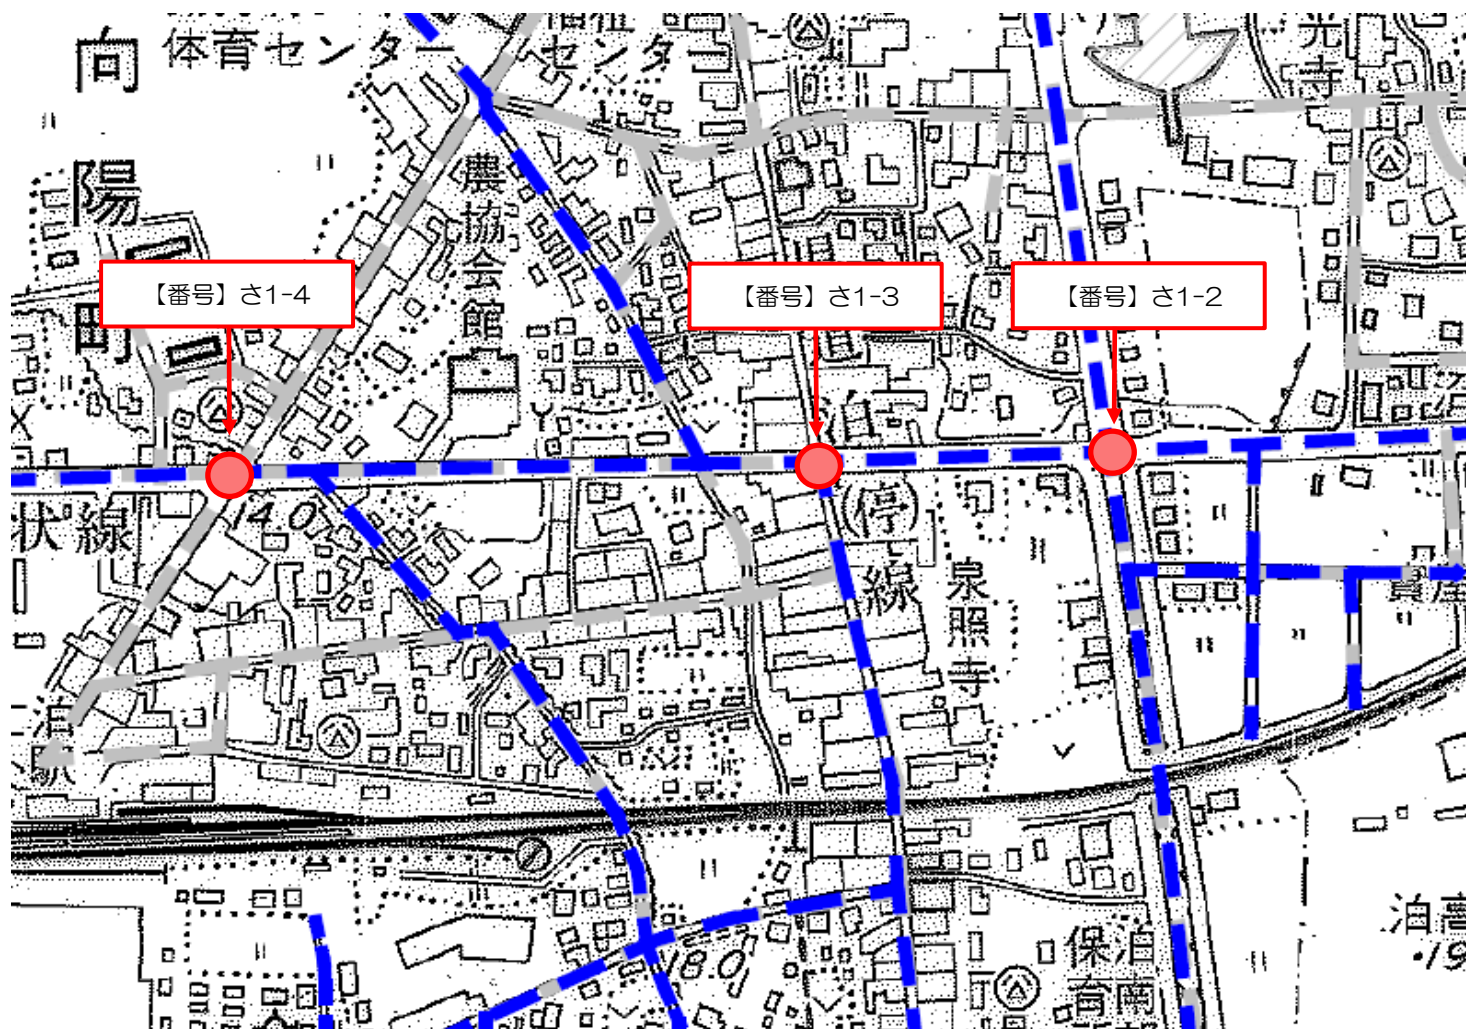

凡例	
	通学路
	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

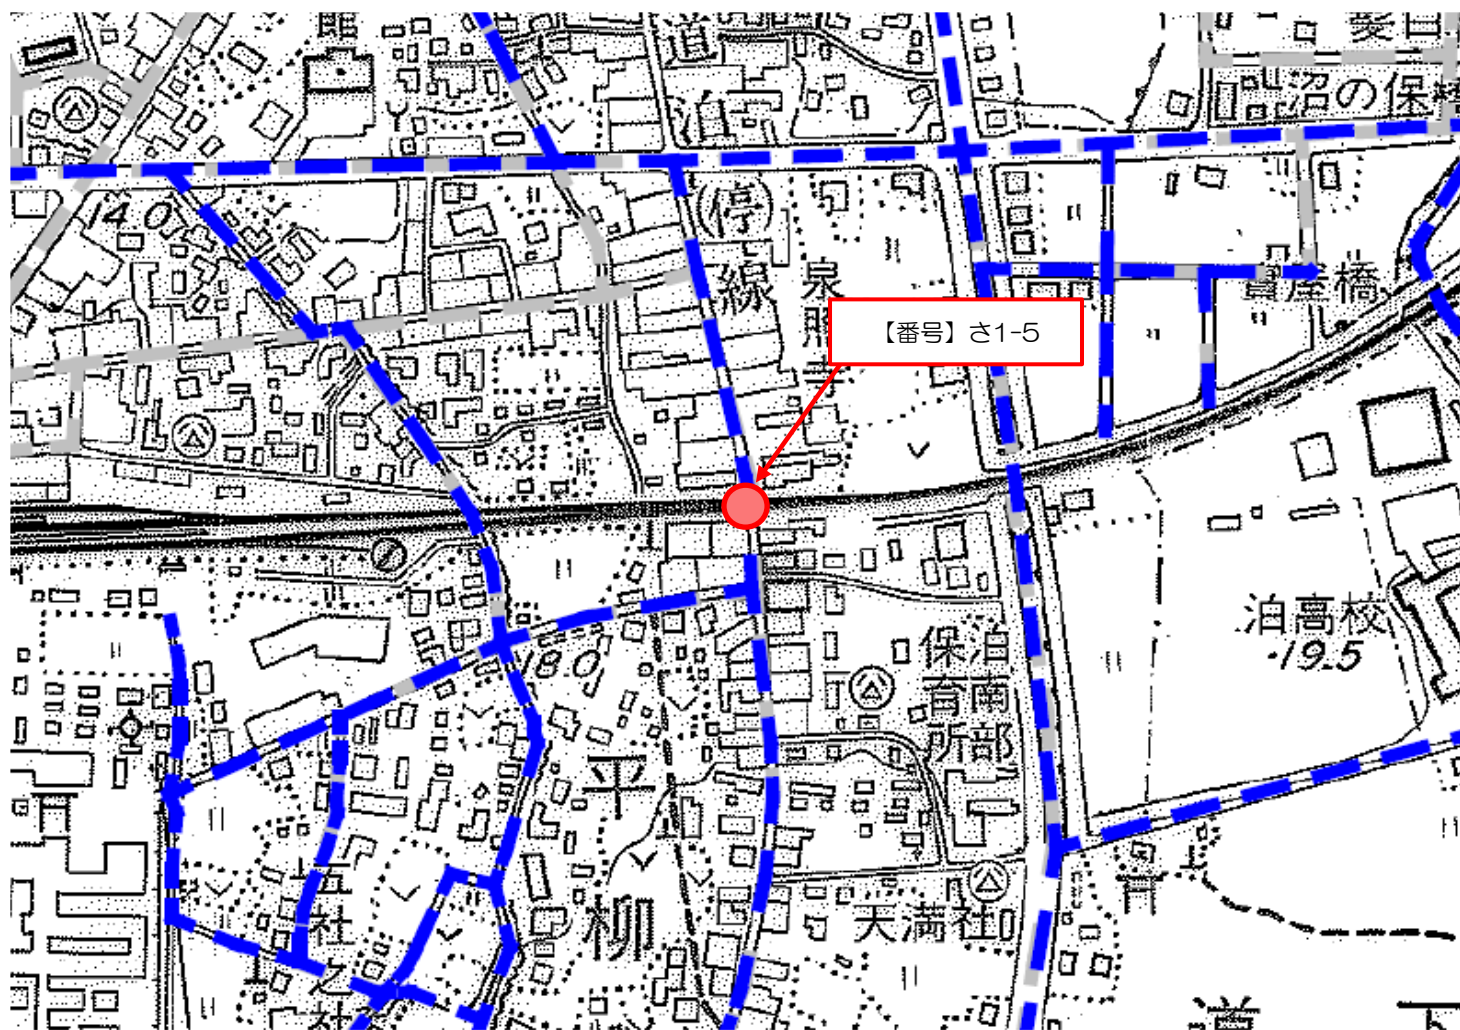

凡例	
	通学路
	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】さ1-2 【箇所】荒川地内 【路線】町道泊桜町線、同 沼保宮本町線 【対策】実施済 【対策機関】朝日町



【点検結果】

- ・信号交差点での安全確保が必要（信号待ち時など）

【対策内容と実施状況】

○対策内容

防護柵等の設置

○実施状況

実施済（横断歩道のカラー表示を含む）

【番号】さ1-3 【箇所】荒川地内 【路線】県道泊停車場線、町道泊環状線 【対策】実施済 【対策機関】朝日町



【点検結果】

- ・信号交差点での安全確保が必要（信号待ち時など）

【対策内容と実施状況】

○対策内容

防護柵等の設置

○実施状況

実施済

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ1-4 【箇所】 泊地内 【路線】 県道泊停車場線、町道泊環状線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町



【点検結果】

- ・信号交差点での安全確保が必要（信号待ち時など）

【対策内容と実施状況】

○対策内容

防護柵等の設置

○実施状況

実施済

【番号】 さ1-5 【箇所】 道下地内 【路線】 県道泊停車場線 【対策】 実施済 【対策機関】 富山県



【点検結果】

- ・踏み切りを横断する際に車と接近するため危険

【対策内容と実施状況】

○対策内容

路面着色をするなど注意喚起を図る

○実施状況

実施済（路面表示）


朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区



凡例	
	通学路
	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

泊駅南土地区画整理事業
設計図（現況重図）

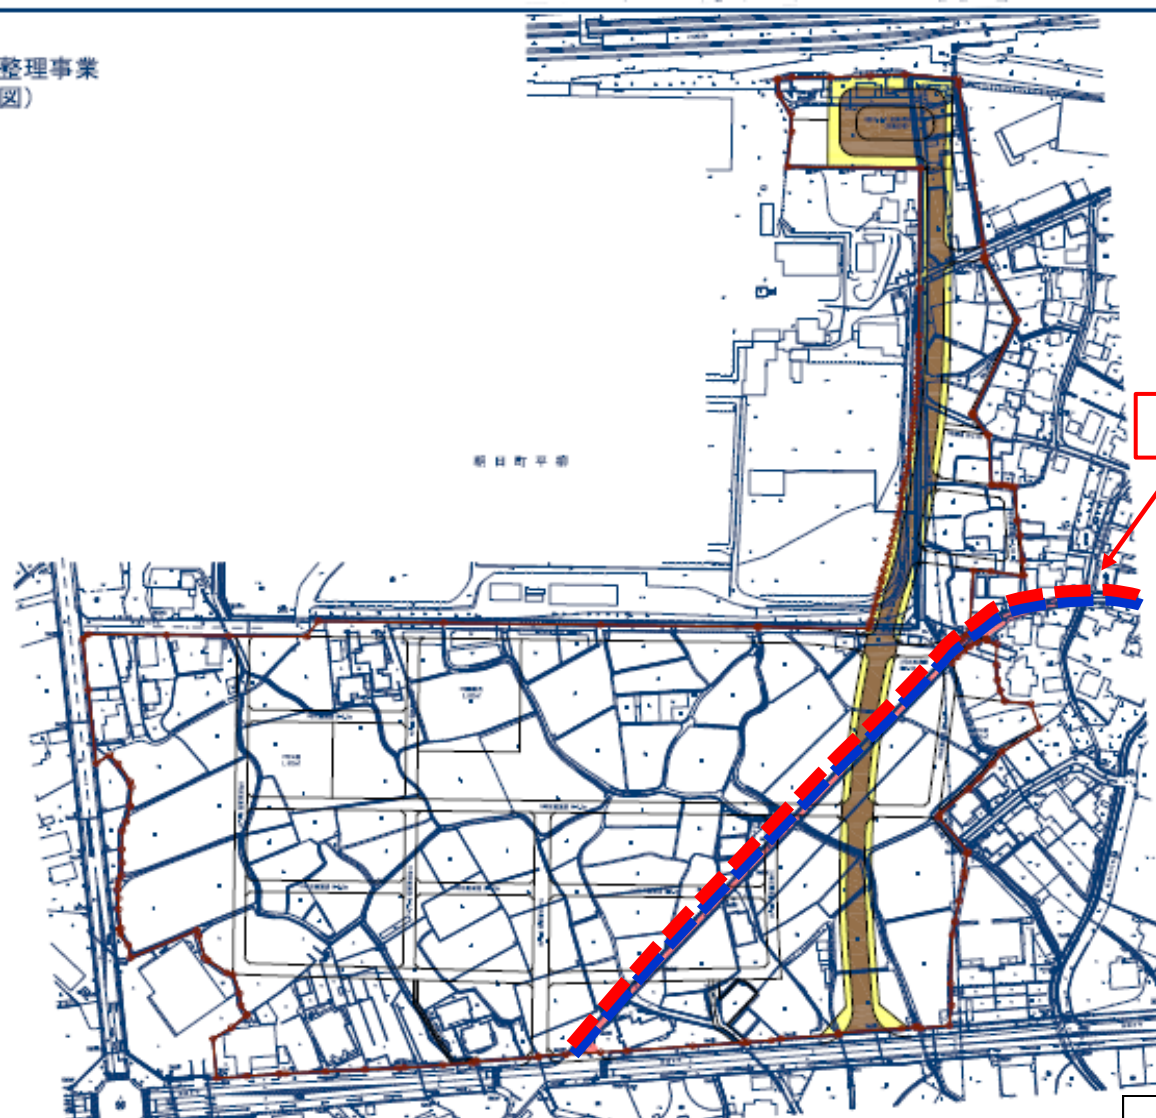

【番号】さ1-7

凡例

— — — — —	通学路
- - - - -	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】さ1-6 【箇所】平柳地内 【路線】国道8号、県道泊停車場線 【対策】実施済 【対策機関】国



【点検結果】

- ・信号交差点の安全確保が必要（信号待ち時など）

【対策内容と実施状況】

○対策内容

防護柵等の設置

○実施状況

実施済

【番号】さ1-7 【箇所】平柳地内 【路線】町道平柳月山線（国道8号停車場線） 【対策】実施中 【対策機関】朝日町



【点検結果】

- ・歩道が無く危険

【対策内容と実施状況】


○対策内容

歩道がある道路の整備

○実施状況

実施中

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

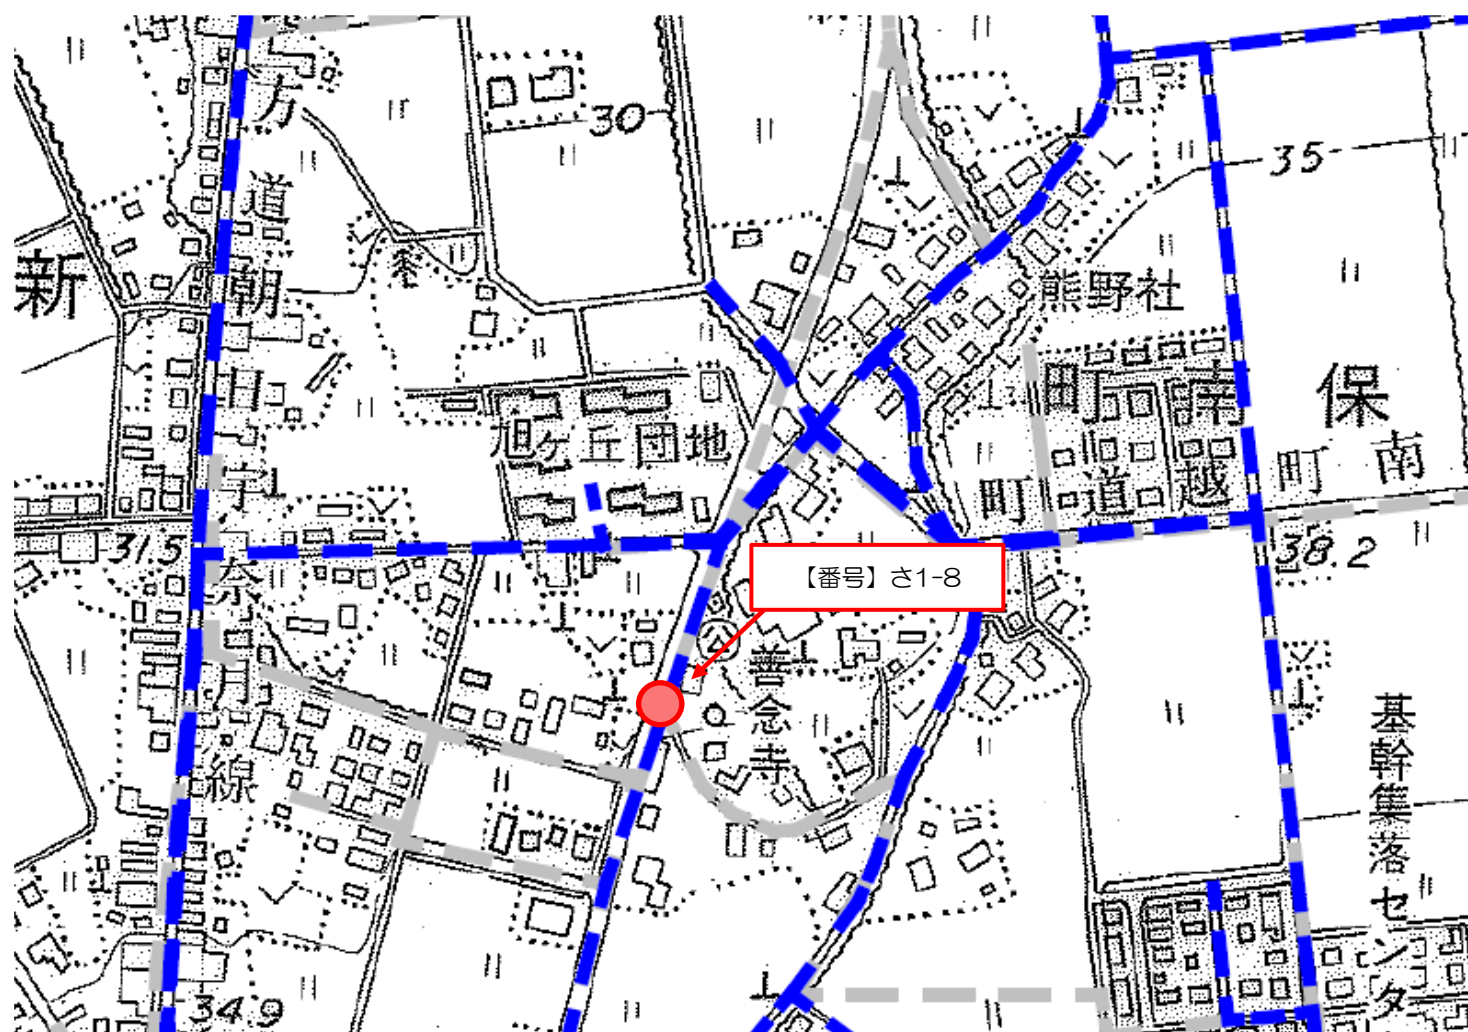


凡例	
	通学路
	要対策箇所

Map of the area around Maibara Station, showing school routes and designated countermeasures. The map includes labels for various locations such as Maibara Station (Maibara Sta.), Maibara City Hall (Maibara City Hall), Maibara High School (Maibara High School), and Maibara Junior High School (Maibara Junior High School). Red circles indicate designated countermeasures, and blue dashed lines indicate school routes. A legend in the bottom right corner explains the symbols: a blue dashed line for 'School Route' (通学路) and a red circle for 'Designated Countermeasure Area' (要対策箇所).

凡例	
	通学路
	要対策箇所


朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

入
善
町

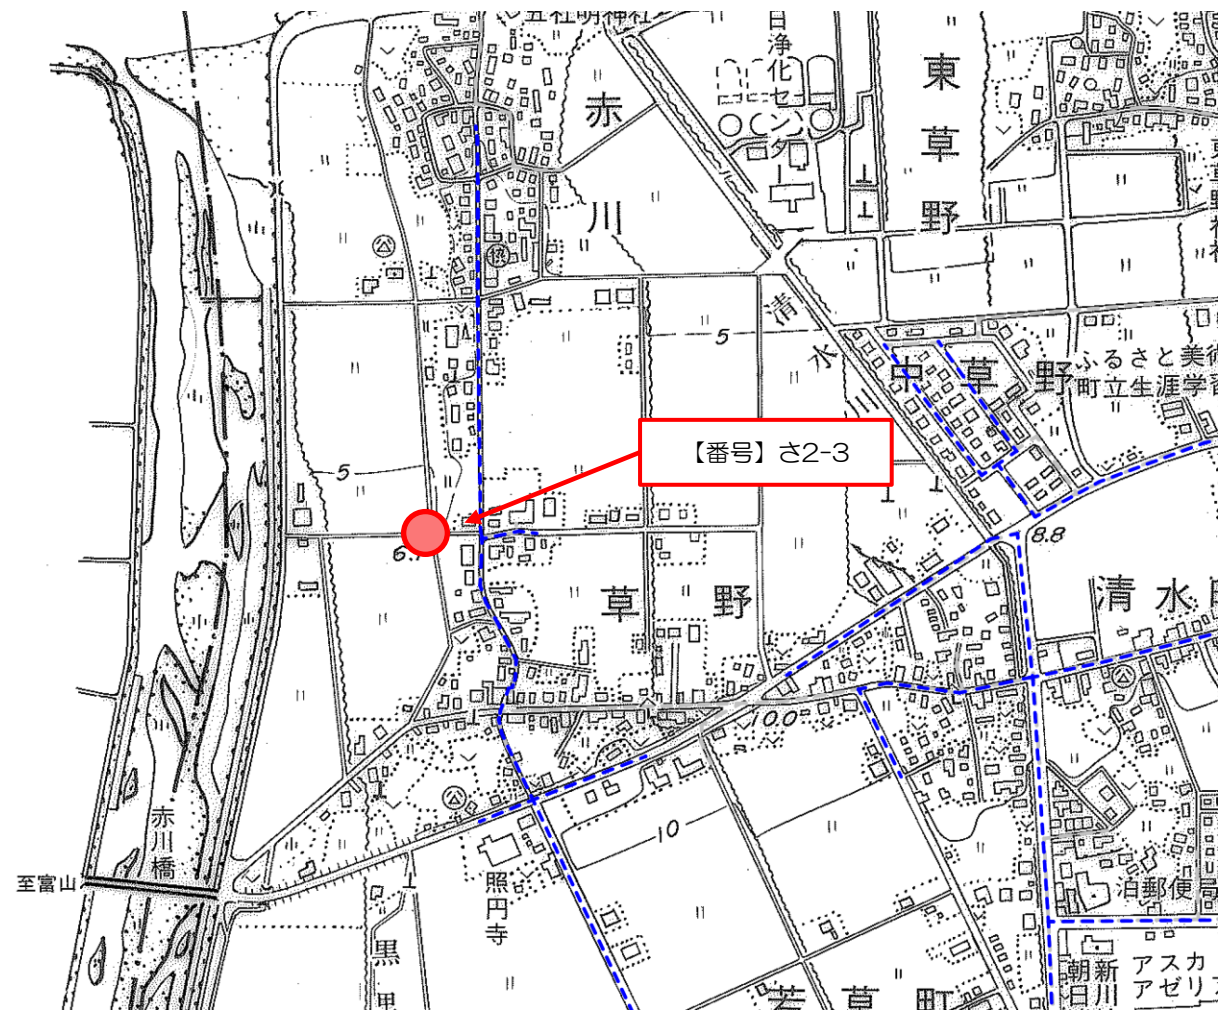

凡例	
---	通学路
●	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

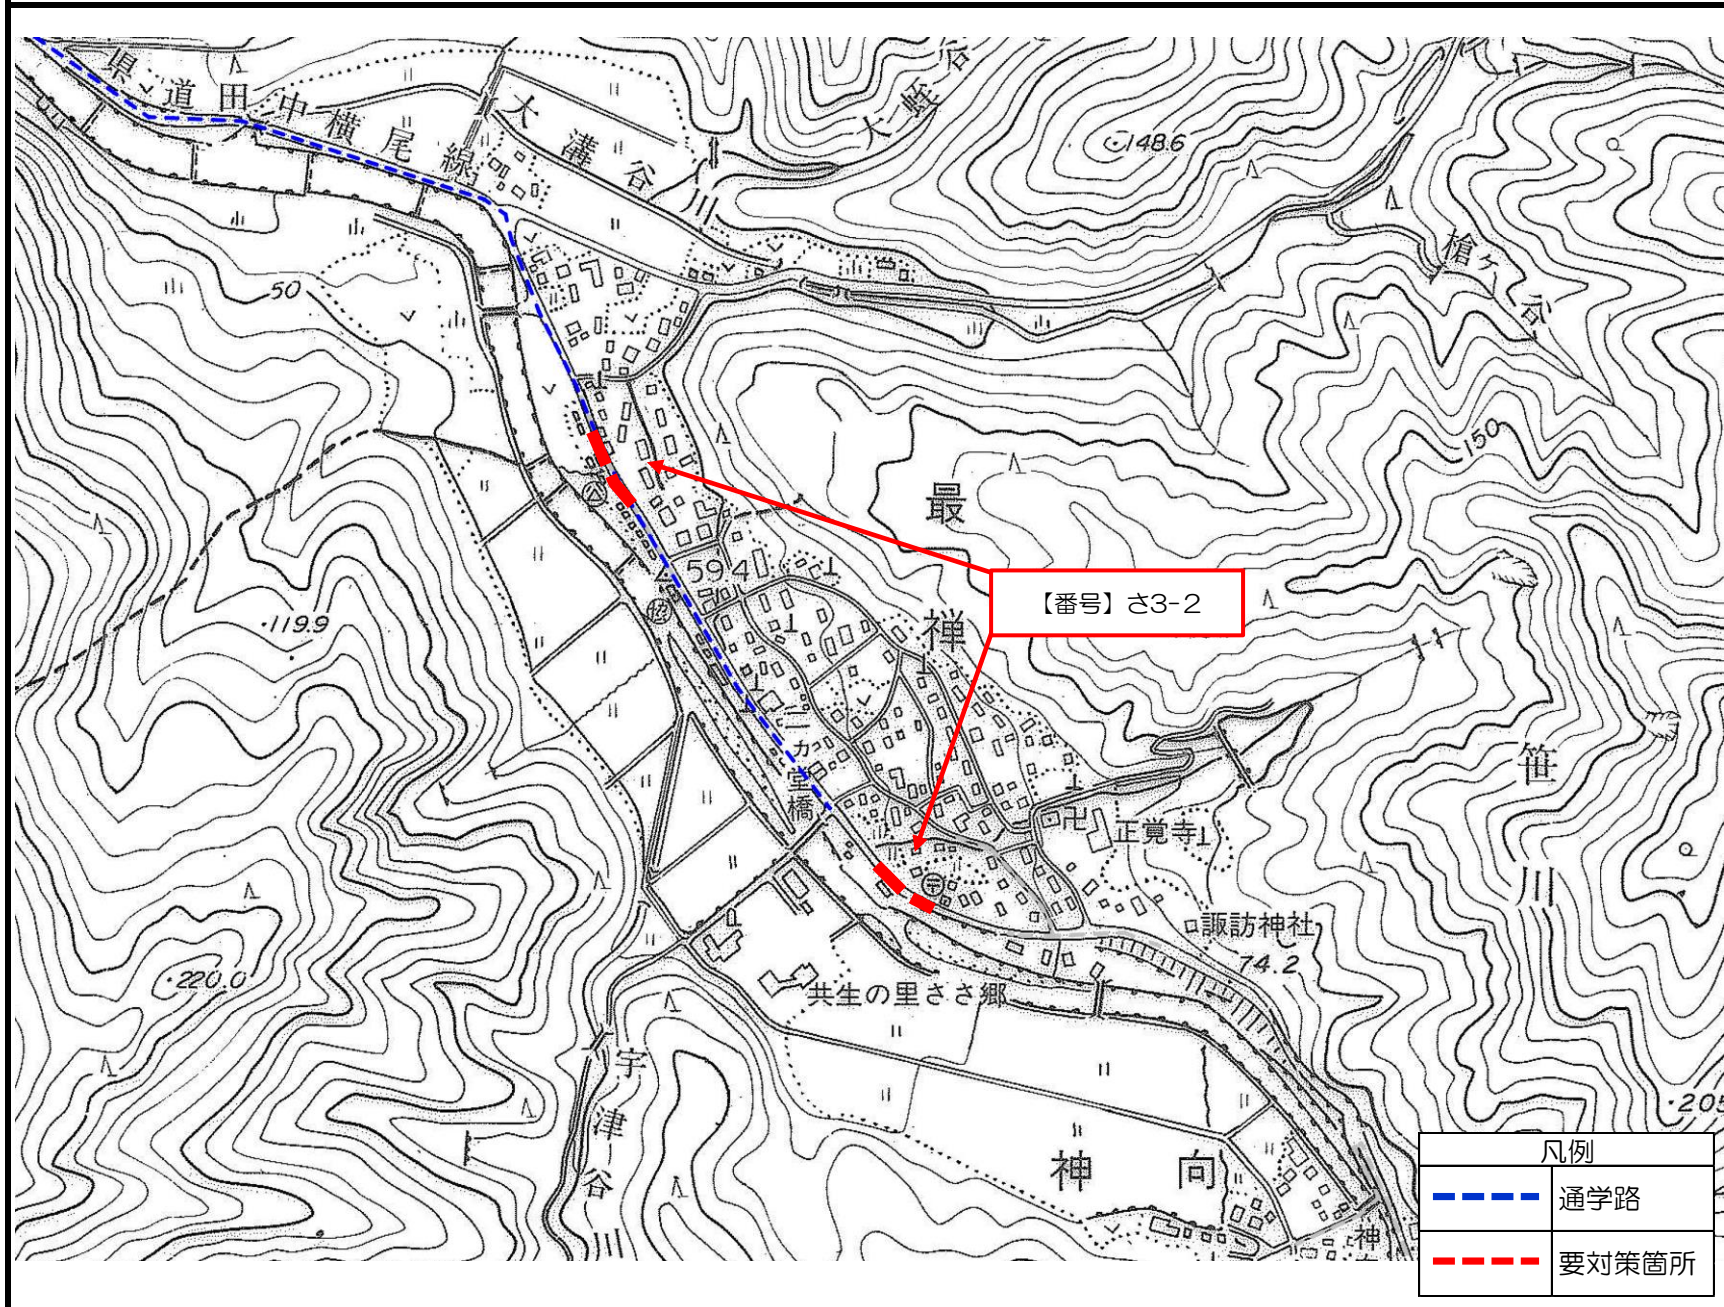

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】さ1-8 【箇所】桜町地内【路線】町道泊桜町線、同 町南保環状2号線【対策】実施済 【対策機関】朝日町



【点検結果】

- ・横断歩道が無く危険

【対策内容と実施状況】

- 対策内容
近くの横断歩道を渡るようシール表示で注意喚起
- 実施状況
実施済

【番号】さ2-1 【箇所】荒川地内 【路線】県道泊停車場線、町道上町橋向町線 【対策】実施済【対策機関】朝日町



【点検結果】

- ・見通しの悪い路地での飛び出しが懸念

【対策内容と実施状況】

- 対策内容
路面への「止まれ」マーク等の設置
- 実施状況
実施済

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】さ2-2 【箇所】荒川地内 【路線】県道泊停車場線、町道上町橋向町線 【対策】実施済 【対策機関】朝日町



【点検結果】

- ・見通しの悪い路地での飛び出し懸念

【対策内容と実施状況】

- 対策内容
路面への「止まれ」マーク等の設置

- 実施状況
実施済

【番号】さ2-3 【箇所】草野地内 【路線】町道西部保育所線、同 草野赤川線 【対策】検討中 【対策機関】入善警察署



【点検結果】

- ・一旦停止がなく危険

【対策内容と実施状況】

- 対策内容
一旦停止標識、表示の設置

- 実施状況
検討中

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ3-1 【箇所】 上町地内 【路線】 町道泊草野線、上町橋向町線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町



【点検結果】

- ・児童の飛び出しの危険

【対策内容と実施状況】

○対策内容

路面表示(止まれマーク等) 及びドット線の追加

○実施状況

実施済

【番号】 さ3-2 【箇所】 笹川地内(甲子、中央町内) 【路線】 県道田中横尾線 【対策】 実施済 【対策機関】 富山県



【点検結果】

- ・見通しの悪いカーブ付近での車との接触の危険
(同一路線上2箇所)

【対策内容と実施状況】

○対策内容

路面への減速表示の追加(2箇所とも) *写真は中央町内

○実施状況

実施済

【番号】さ4-1

【番号】さ5-1
さ6-1

凡例	
	通学路
	要対策箇所

凡例	
— — — —	通学路
●	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】さ4-1 【箇所】泊中町交差点 【路線】県道山崎泊線、町道泊桜町線 【対策】実施済み【対策機関】入善警察



【点検結果】

- ・南北方向に歩行者信号がなく、児童の横断が危険

【対策内容と実施状況】

○対策内容

歩行者信号の設置

○実施状況

実施（設置済み）

【番号】さ5-1 【箇所】さみさと小【路線】町道泊桜町線、同 中町荒川線【対策】実施済【対策機関】入善警察、朝日町



【点検結果】

- ・公衆トイレが死角となり、歩道上の児童と車との接触が懸念

【対策内容と実施状況】

○対策内容

中町荒川線の一旦停止の標識、表示の補修
歩道上に注意喚起表示
児童の指導

○実施状況

令和5年度実施済み

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ6-1 【箇所】 さみさと小 【路線】 町道泊桜町線 【対策】 検討中 【対策機関】 朝日町




【点検結果】

- ・図書館から学校への移動で横断歩道を渡る際、街路樹が視界を遮るため危険

【対策内容と実施状況】


- 対策内容
街路樹の手入れ及び横断時の待機位置を示す路面標示の追加
- 実施状況
検討中

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

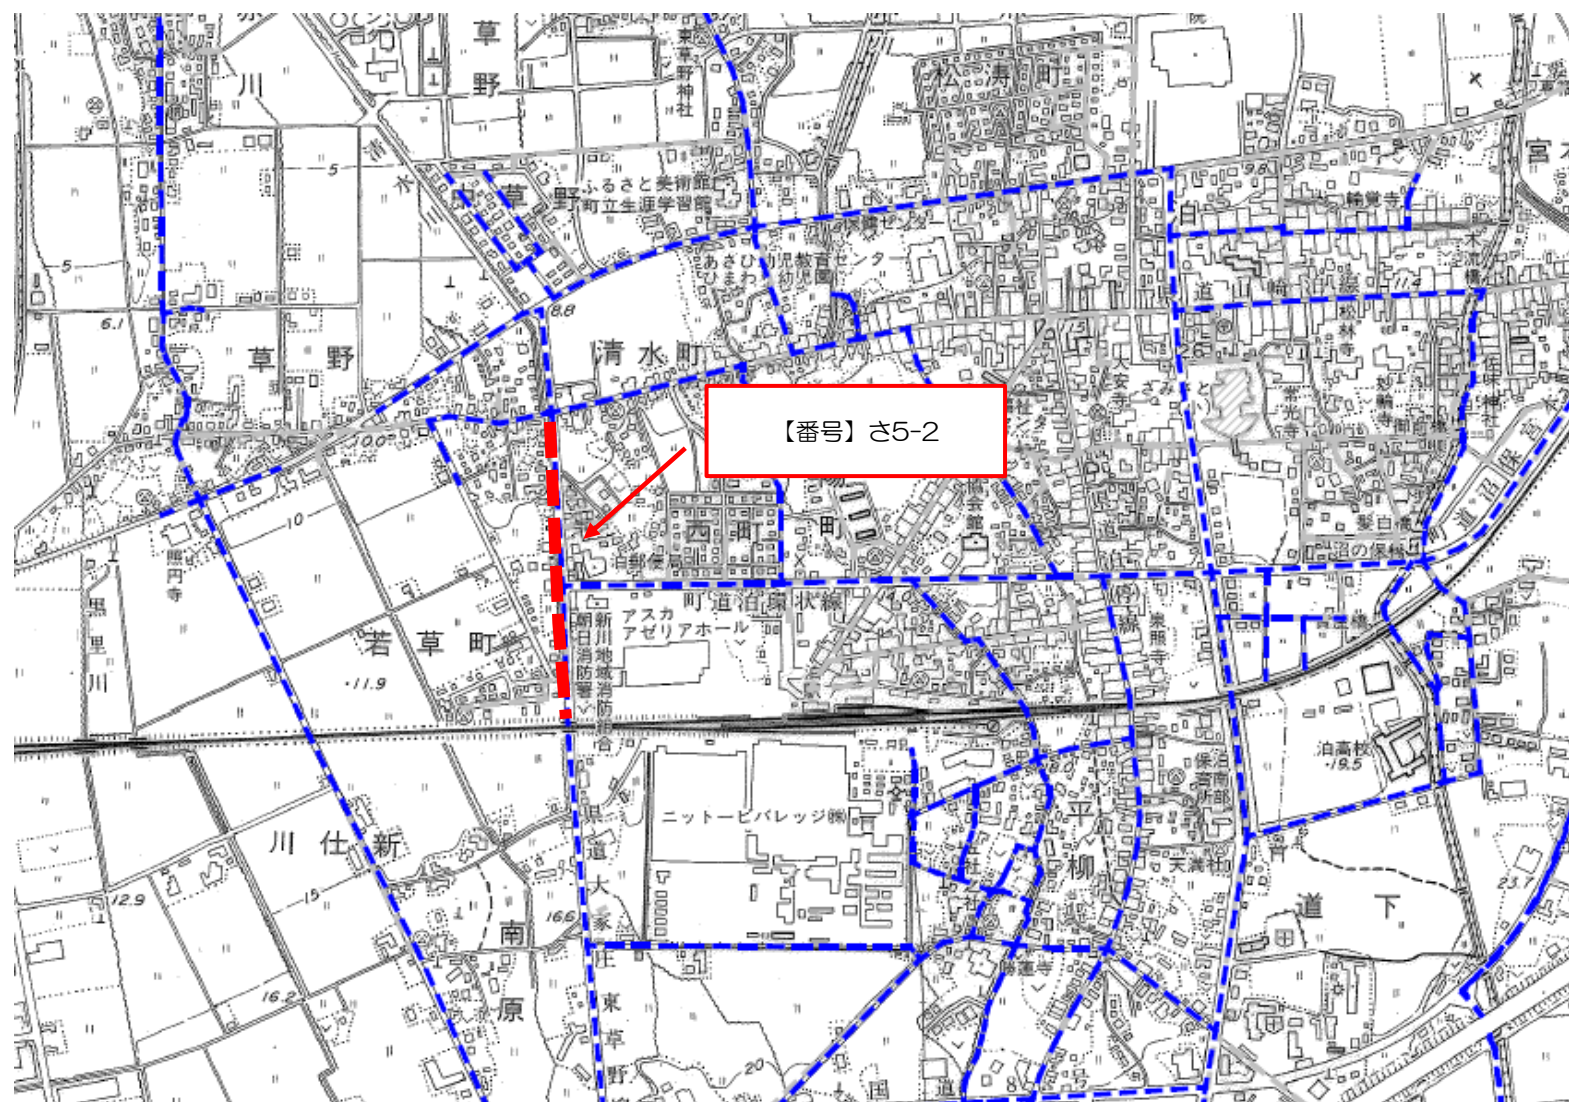

凡例	
---	通学路
---	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

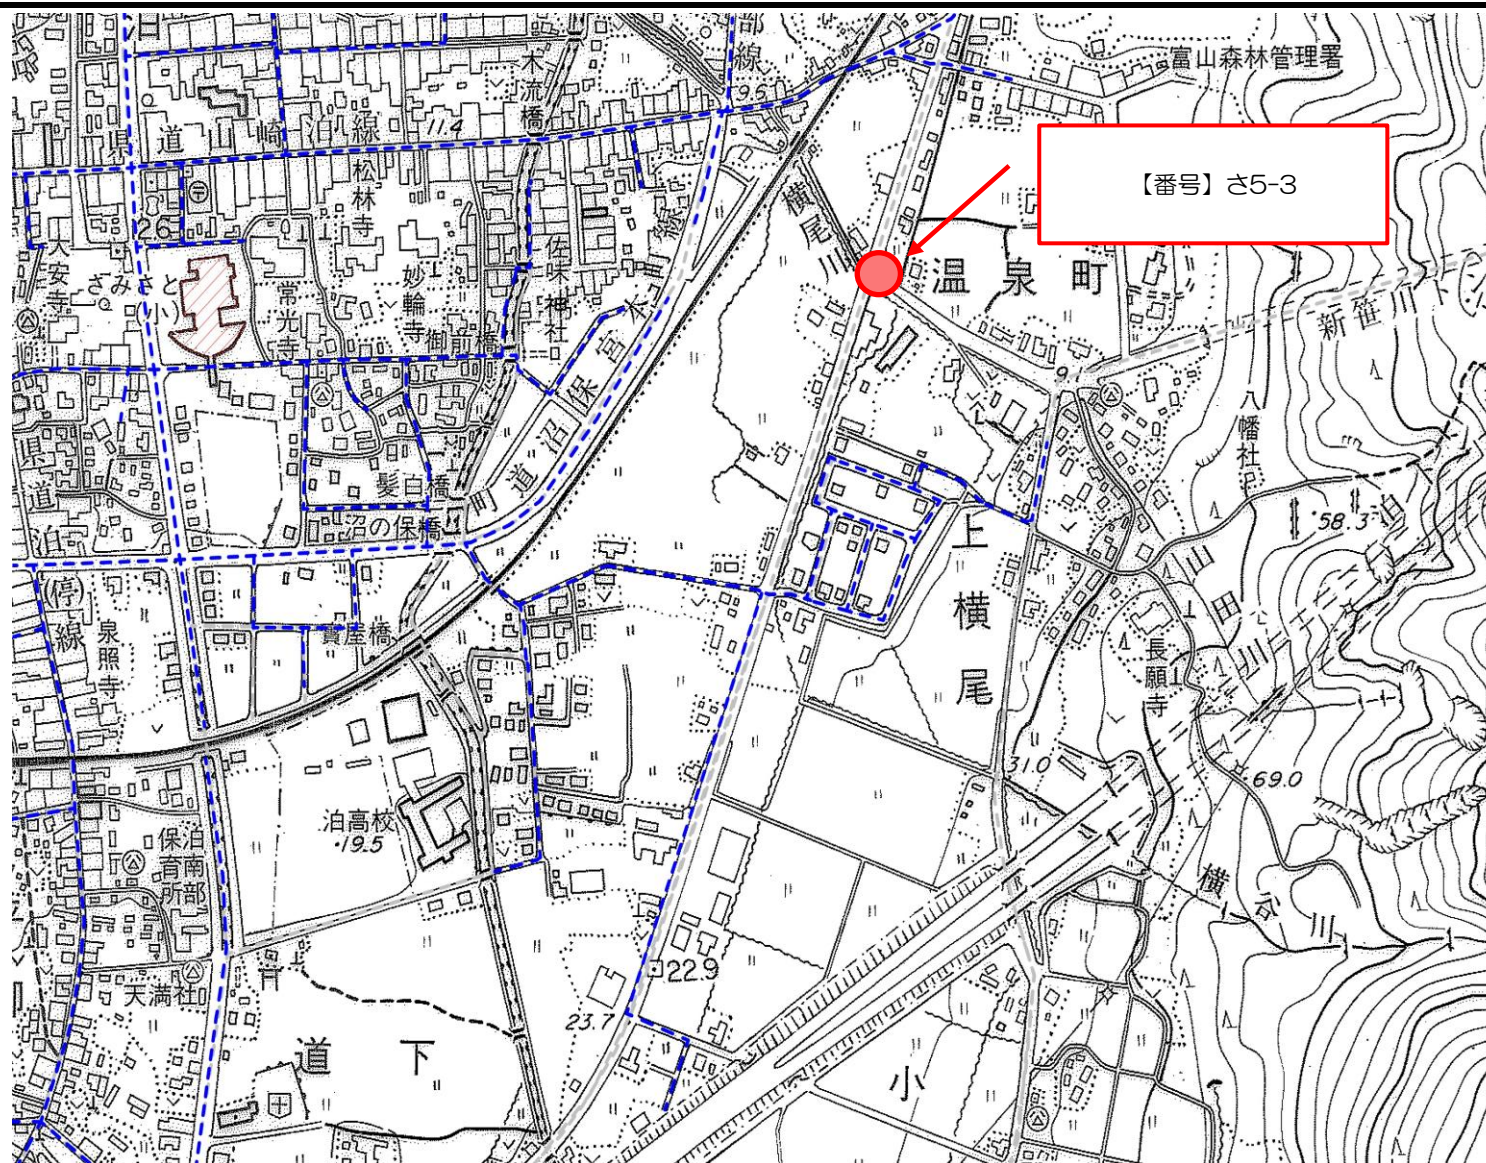

凡例	
	通学路
	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】さ5-2 【箇所】東草野地内【路線】県道大家庄東草野線 【対策】検討中 【対策機関】富山県



【点検結果】

- ・交通量が多く、路肩の歩行が危険

【対策内容と実施状況】

○対策内容

歩行スペースの確保など安全な移動への改善

○実施状況

検討中

【番号】さ5-3 【箇所】国道8号横尾西交差点 【路線】国道8号、県道田中横尾線 【対策】検討中 【対策機関】国



【点検結果】

- ・国道を東進する大型車両と、県道を同交差点で右折して国道に入り、東進するスクールバスとの衝突の危険性
(国道の大型車両の停止が不十分で、停止線を越える)

【対策内容と実施状況】


○対策内容

交差点の視認性の向上

○実施状況

検討中（手前のゼブラ表示の補修は実施済み）

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

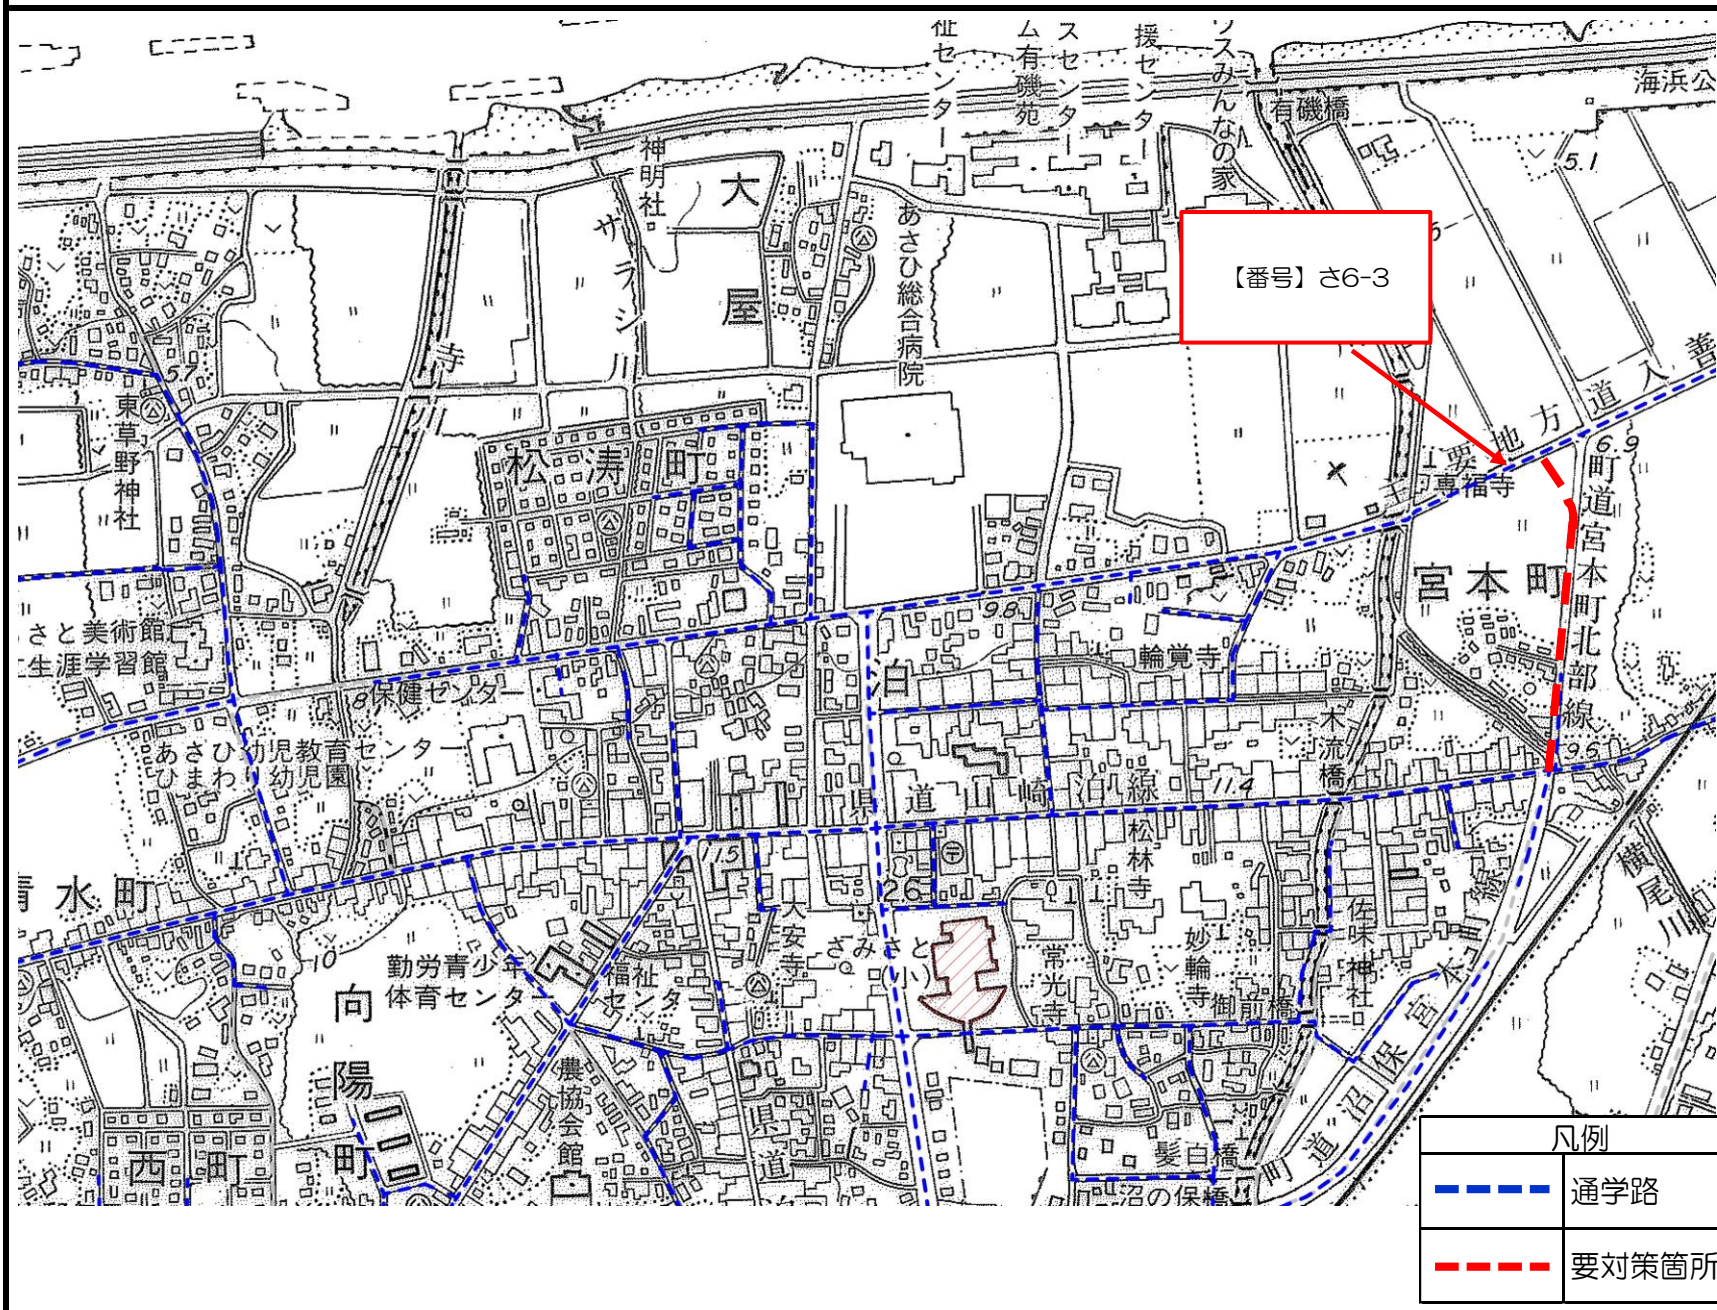

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】さ6-3 【箇所】宮本町交差点【路線】県道山崎泊線、町道宮本町北部線【対策】検討中 【対策機関】富山県、朝日町



【点検結果】

- ・歩道整備が必要

【対策内容と実施状況】

○対策内容

- 県道一白線の補修等
- 町道一歩道整備

○実施状況

- 検討中
