





# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

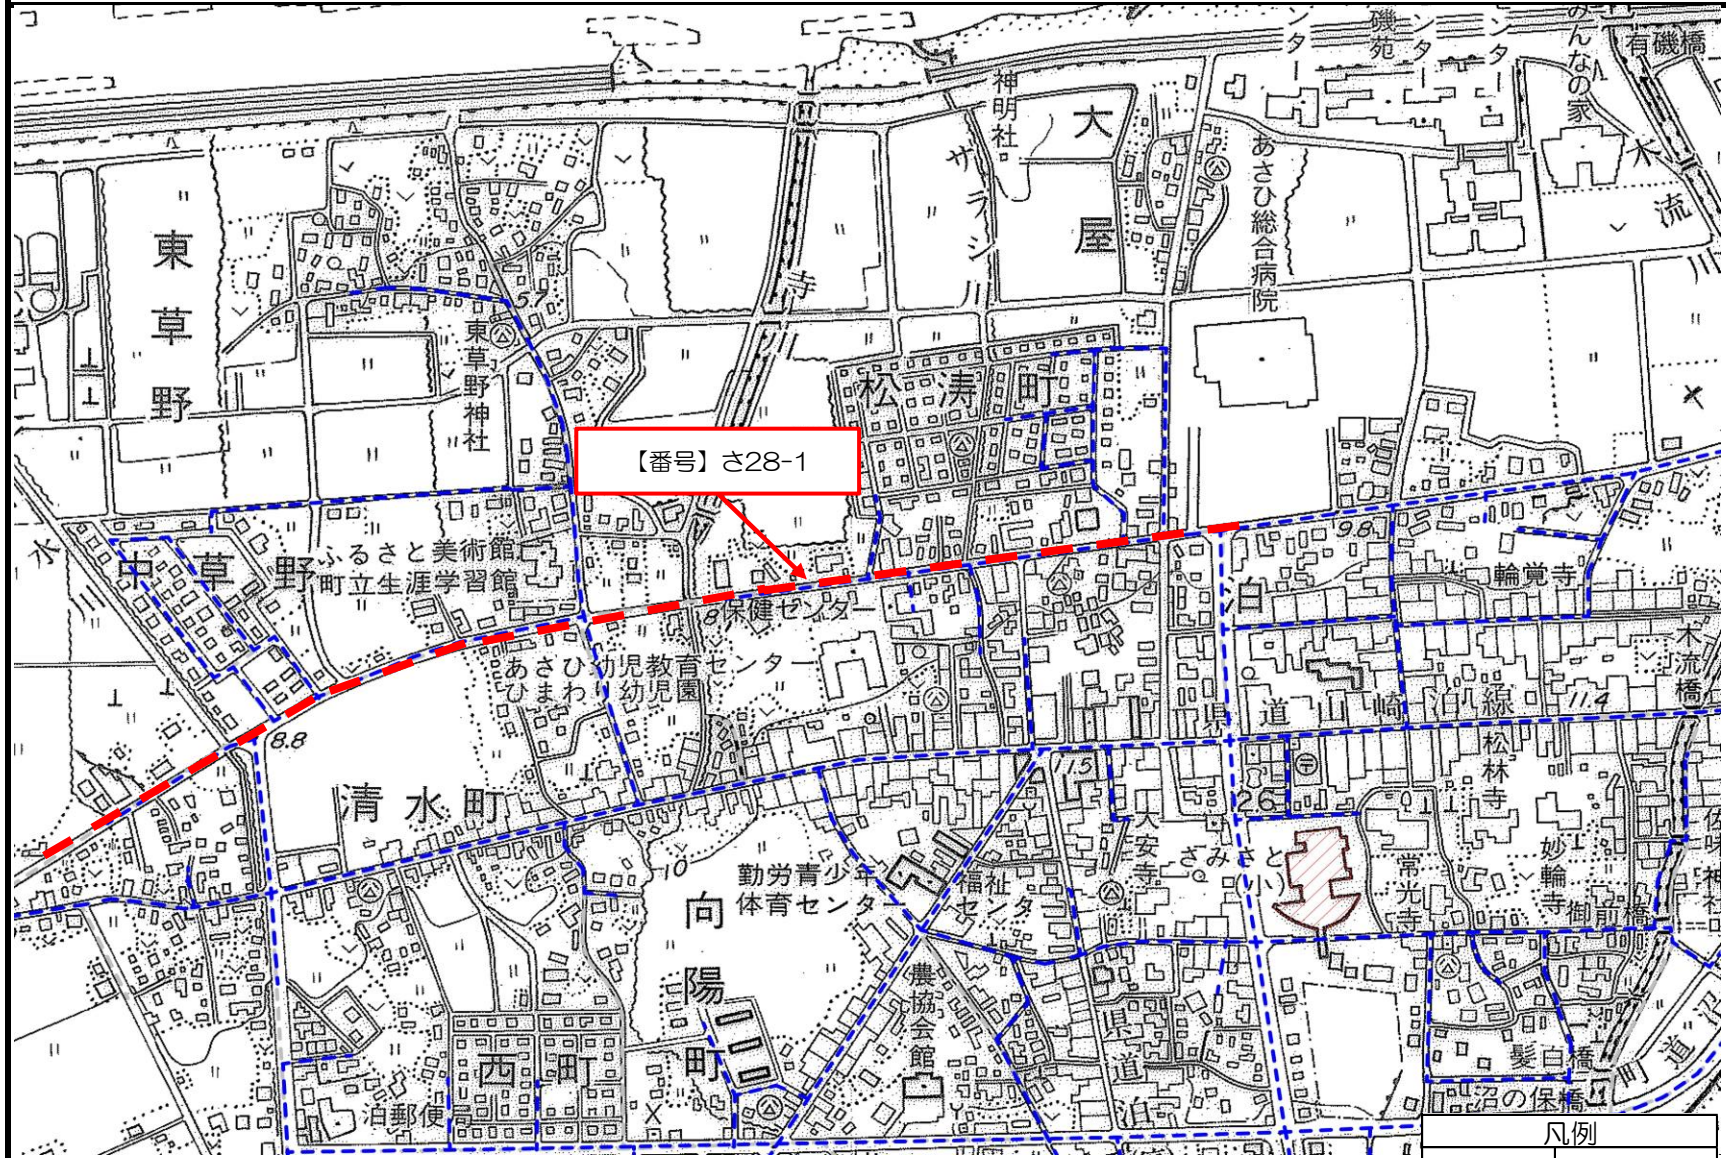

凡例	
	通学路
	要対策箇所

# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

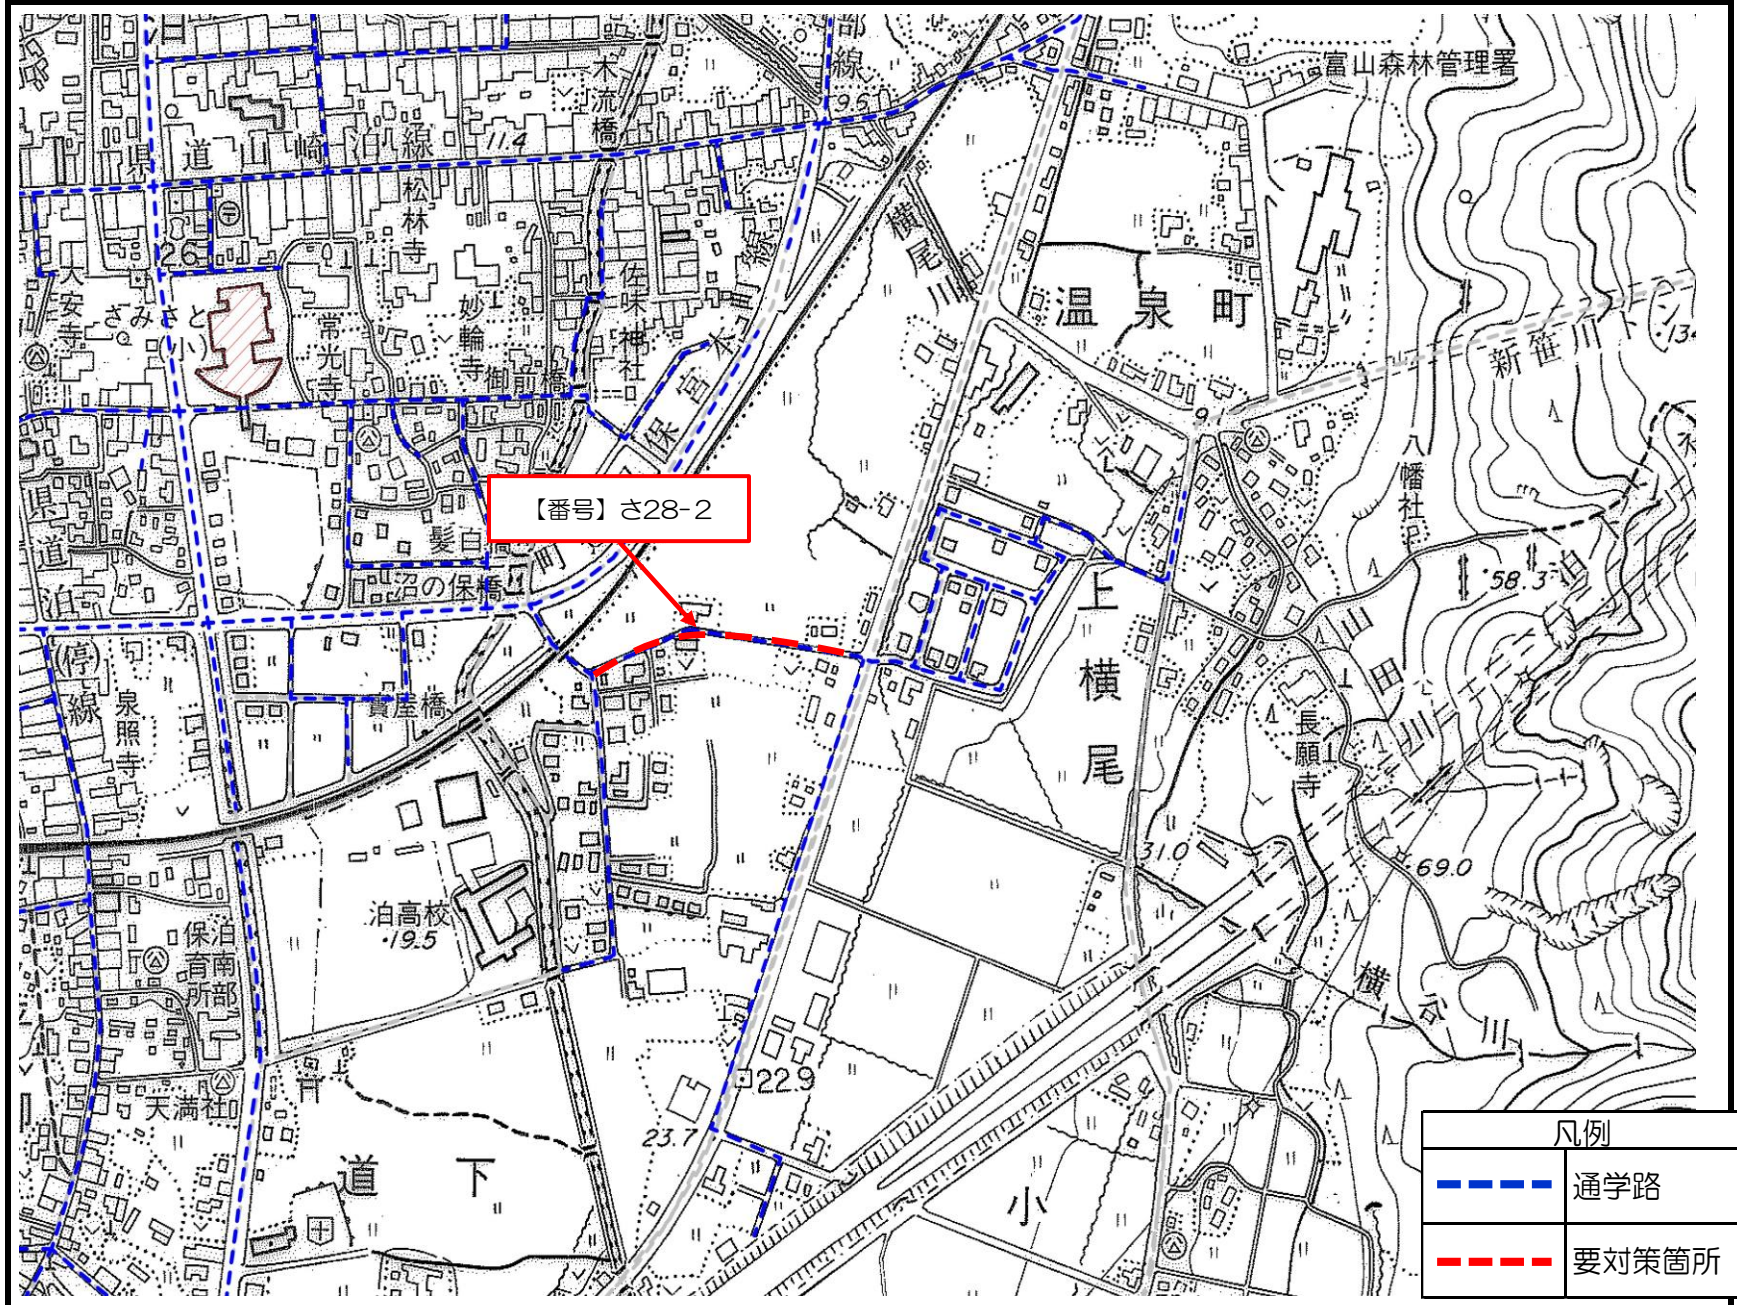

# 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ28-1 【箇所】 泊地内 【路線】 県道入善朝日線 【対策】 実施中 【対策機関】 富山県



## 【点検結果】

- ・歩道が無く、交通量が多いため危険である。

## 【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
道路の拡幅改良・歩道の整備
- 実施状況  
R10年度に完成  
(その他注意喚起の路面表示を追加)

【番号】 さ28-2 【箇所】 横尾地内 【路線】 町道沼保横尾線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町




## 【点検結果】

- ・道路幅員が狭く、歩道が無いいため危険である。


## 【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
道路の拡幅（路肩拡幅）
- 実施状況  
実施済

# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

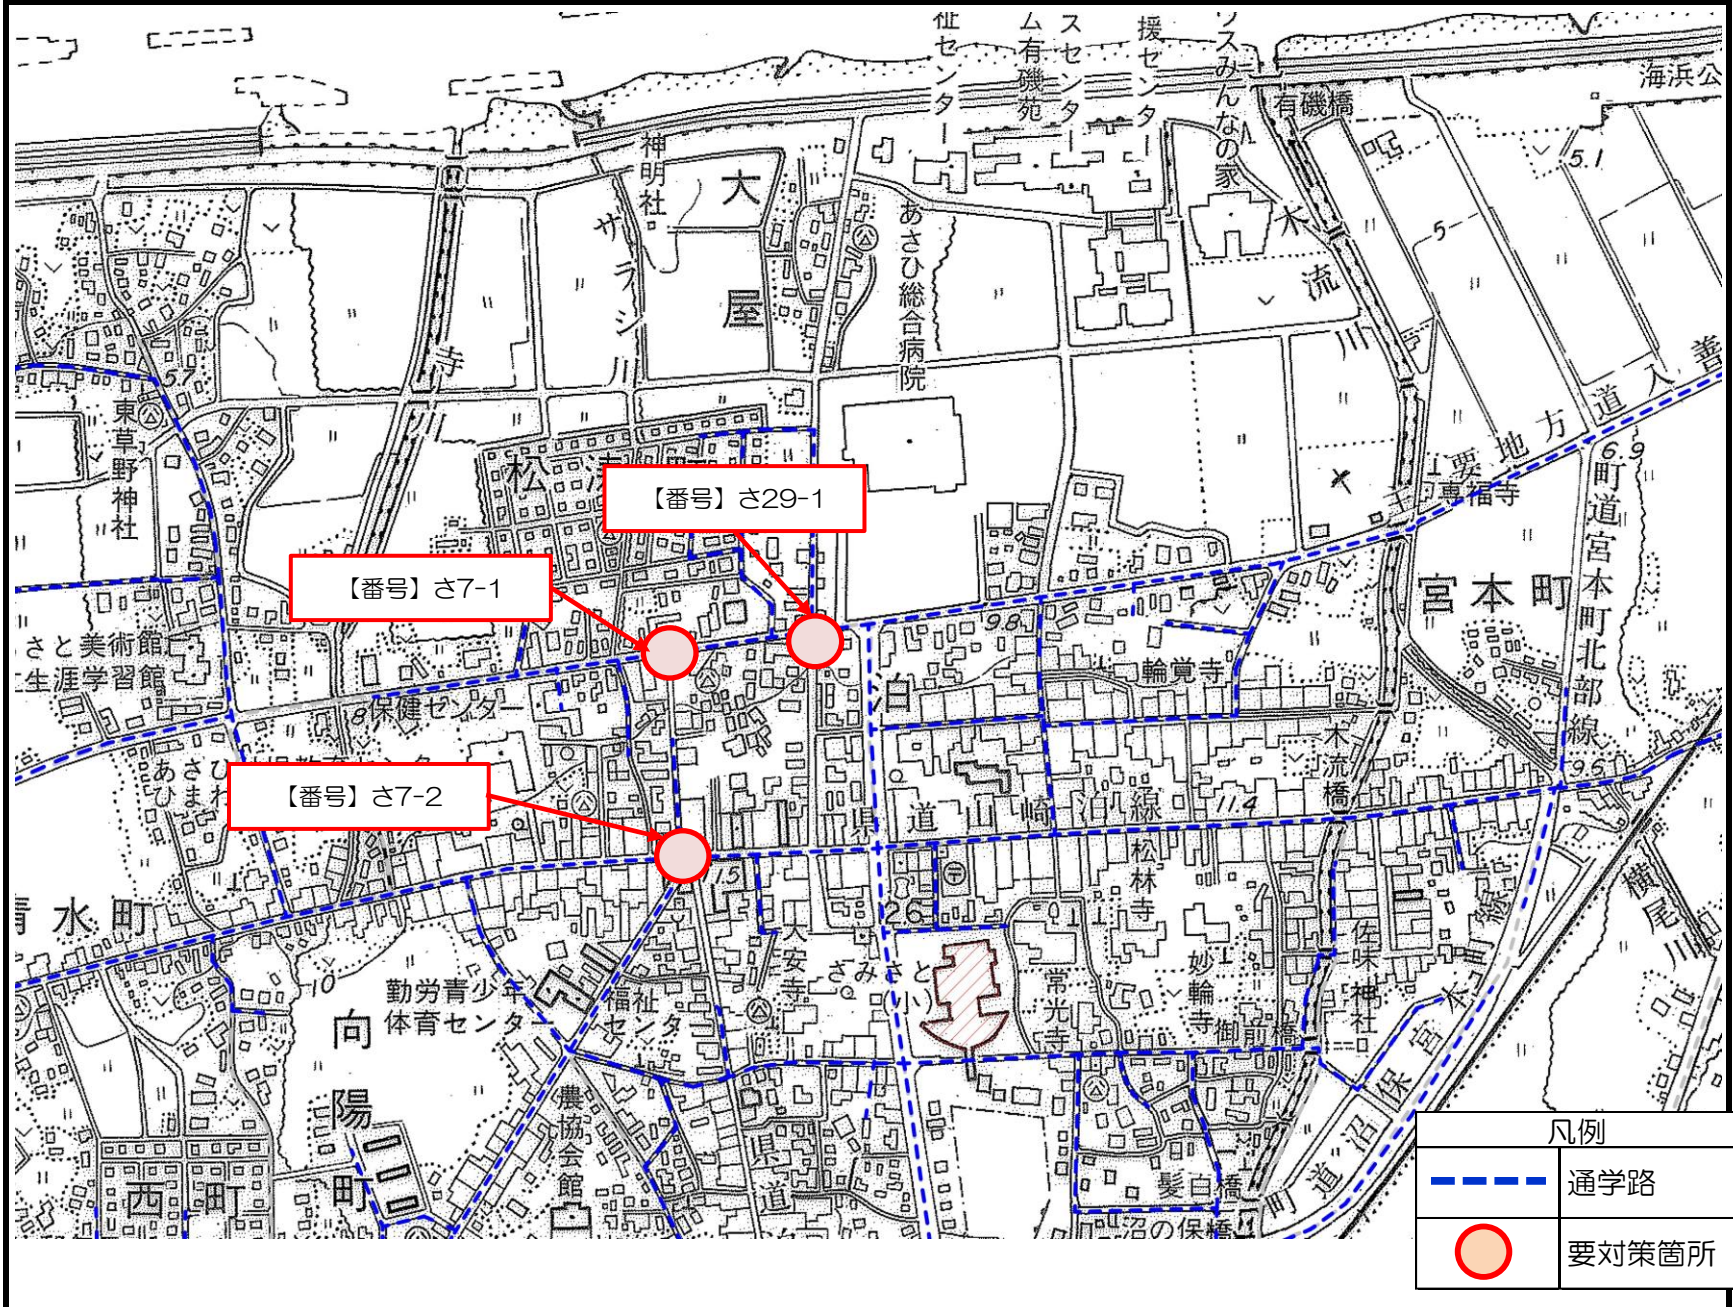

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

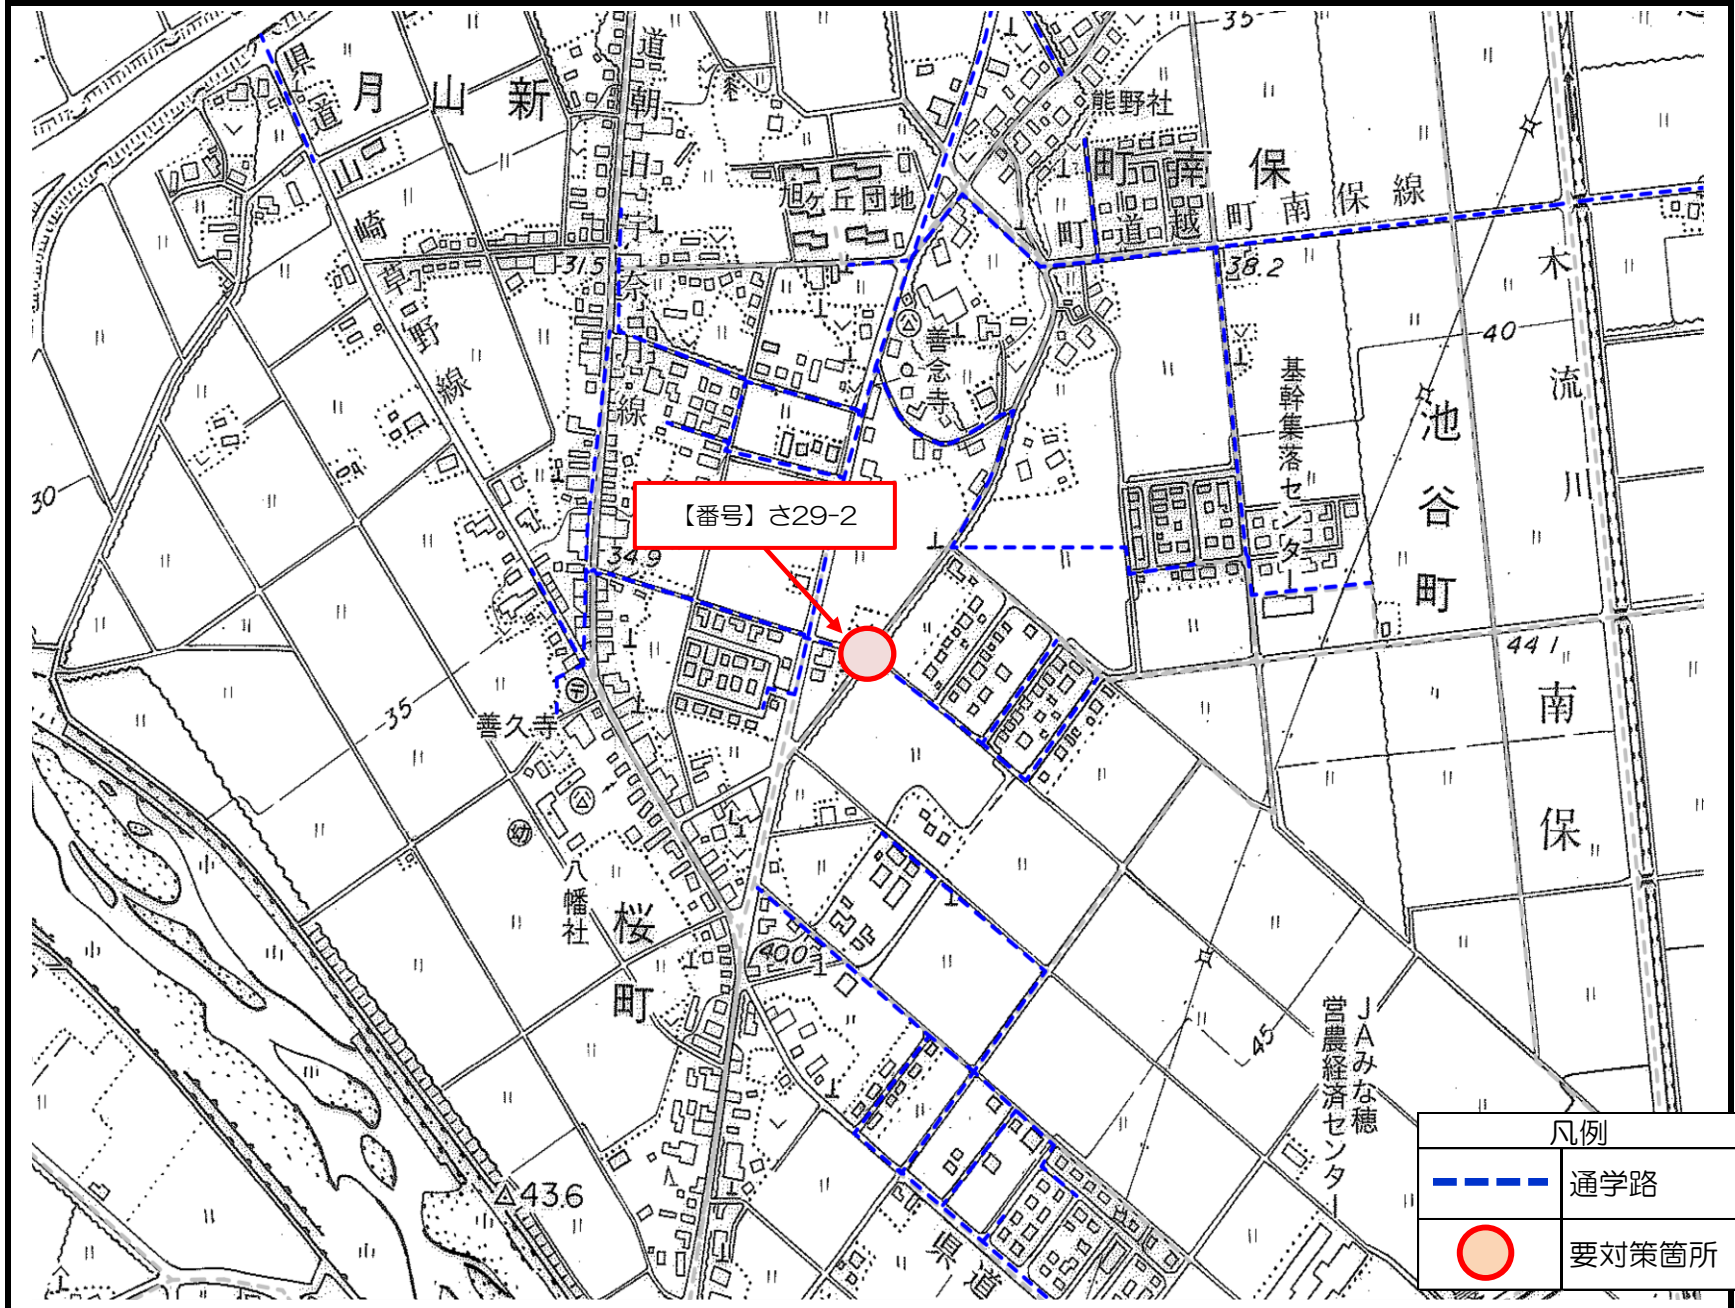

## 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ29-1 【箇所】 泊地内 【路線】 町道泊桜町線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町



【点検結果】  
 ・交通量が多いため危険である。

【対策内容と実施状況】  
 ○対策内容  
 路面表示（イメージハンプ）の設置  
  
 ○実施状況  
 実施済

【番号】 さ29-2 【箇所】 桜町地内 【路線】 町道桜町町南保3号線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町



【点検結果】  
 ・路肩（交差点付近）に水路があり、転落防止対策が無く危険である。

【対策内容と実施状況】  
 ○対策内容  
 転落防止柵の設置  
  
 ○実施状況  
 実施済

## 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ7-1 【箇所】 旧深松組北陸支店 【路線】 県道入善朝日線/山崎泊線 【対策】 検討中 【対策機関】 入善警察署



### 【点検結果】

- ・県道入善・朝日線に通学及び児童館利用の児童が多数あり  
手前から奥方向の横断が危険

### 【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
横断歩道の設置
- 実施状況  
検討中

【番号】 さ7-2 【箇所】 五叉路交差点 【路線】 県道山崎泊線/町道泊草野線 【対策】 検討中 【対策機関】 入善警察署




### 【点検結果】

- ・児童の通学路であり、車両に徐行を促すなど対応が必要


### 【対策内容と実施状況】


- 対策内容  
横断歩道等の補修及びダイヤマークの設置
- 実施状況  
検討中

# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

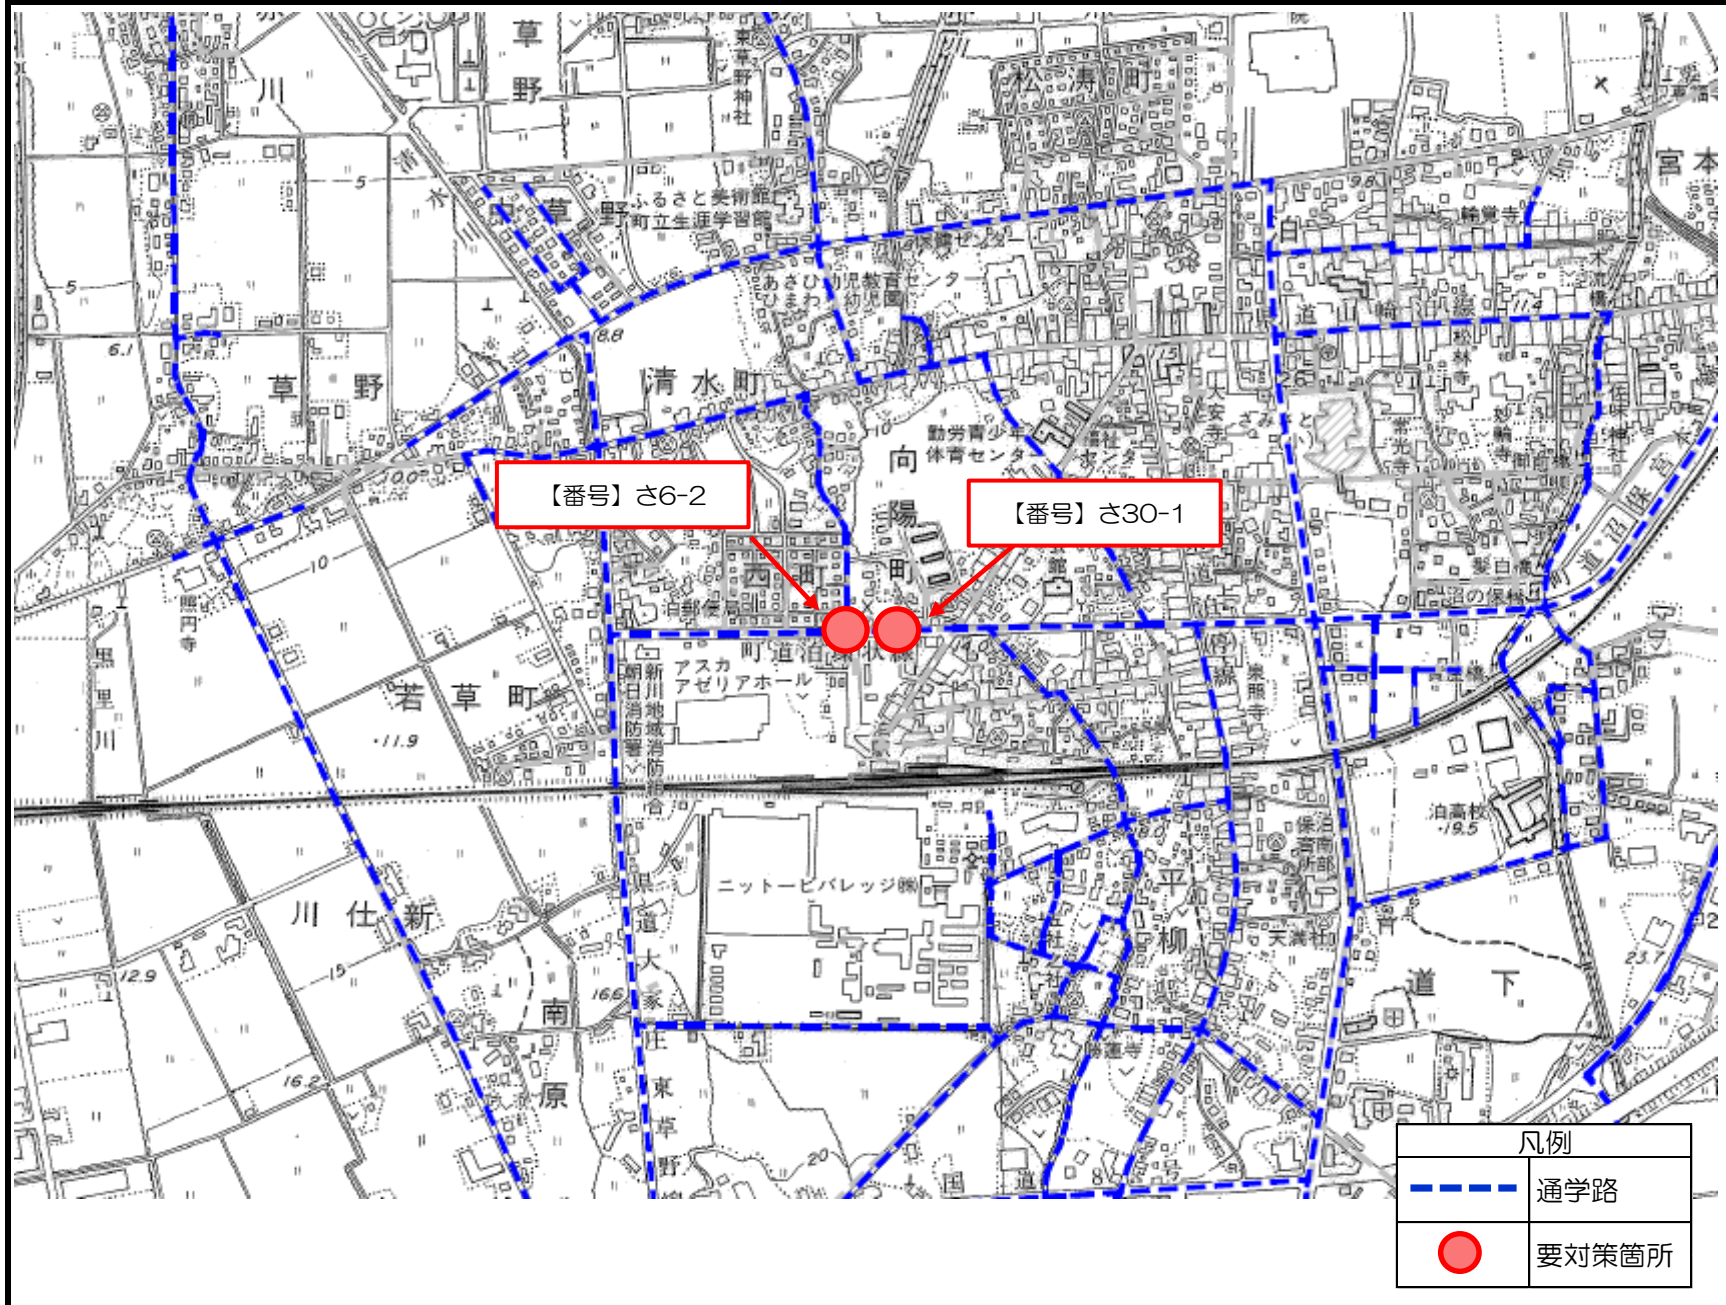

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

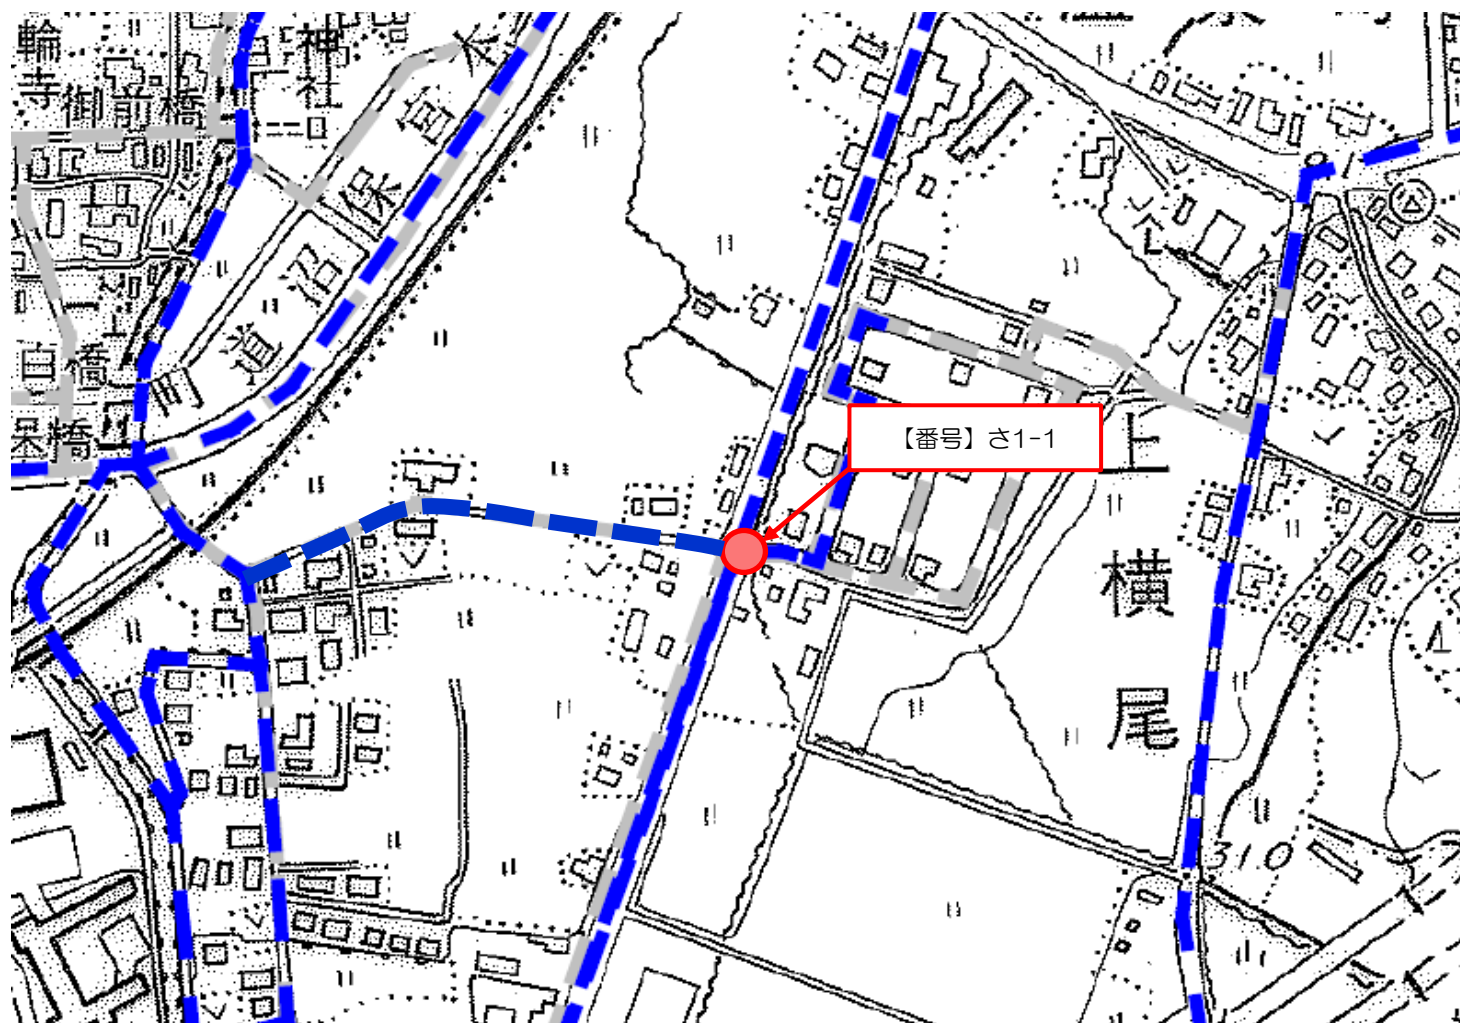

凡例	
	通学路
	要対策箇所

# 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ30-1 【箇所】 平柳地内 【路線】 町道泊環状線 【対策】 実施済 【対策機関】 入善警察署



【点検結果】  
・ブロック塀があり危険

【対策内容と実施状況】  
○対策内容  
ブロック塀の補強又は撤去  
  
○実施状況  
実施済（ブロック塀の撤去及び安全な囲いの新設）

【番号】 さ1-1 【箇所】 横尾地内 【路線】 国道8号、町道沼保横尾線 【対策】 実施済 【対策機関】 国



【点検結果】  
・信号交差点での安全確保が必要（信号待ち時など）

【対策内容と実施状況】  
○対策内容  
防護柵等の設置  
  
○実施状況  
実施済

# 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ6-2 【箇所】 朝日町交番交差点 【路線】 町道泊環状線、停車場東草野線 【対策】 実施済み 【対策機関】 朝日町




## 【点検結果】

- 交通量が多く、車の速度が速いため危険

## 【対策内容と実施状況】


- 対策内容  
ドット線を路面に追加する
- 実施状況  
実施済み

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

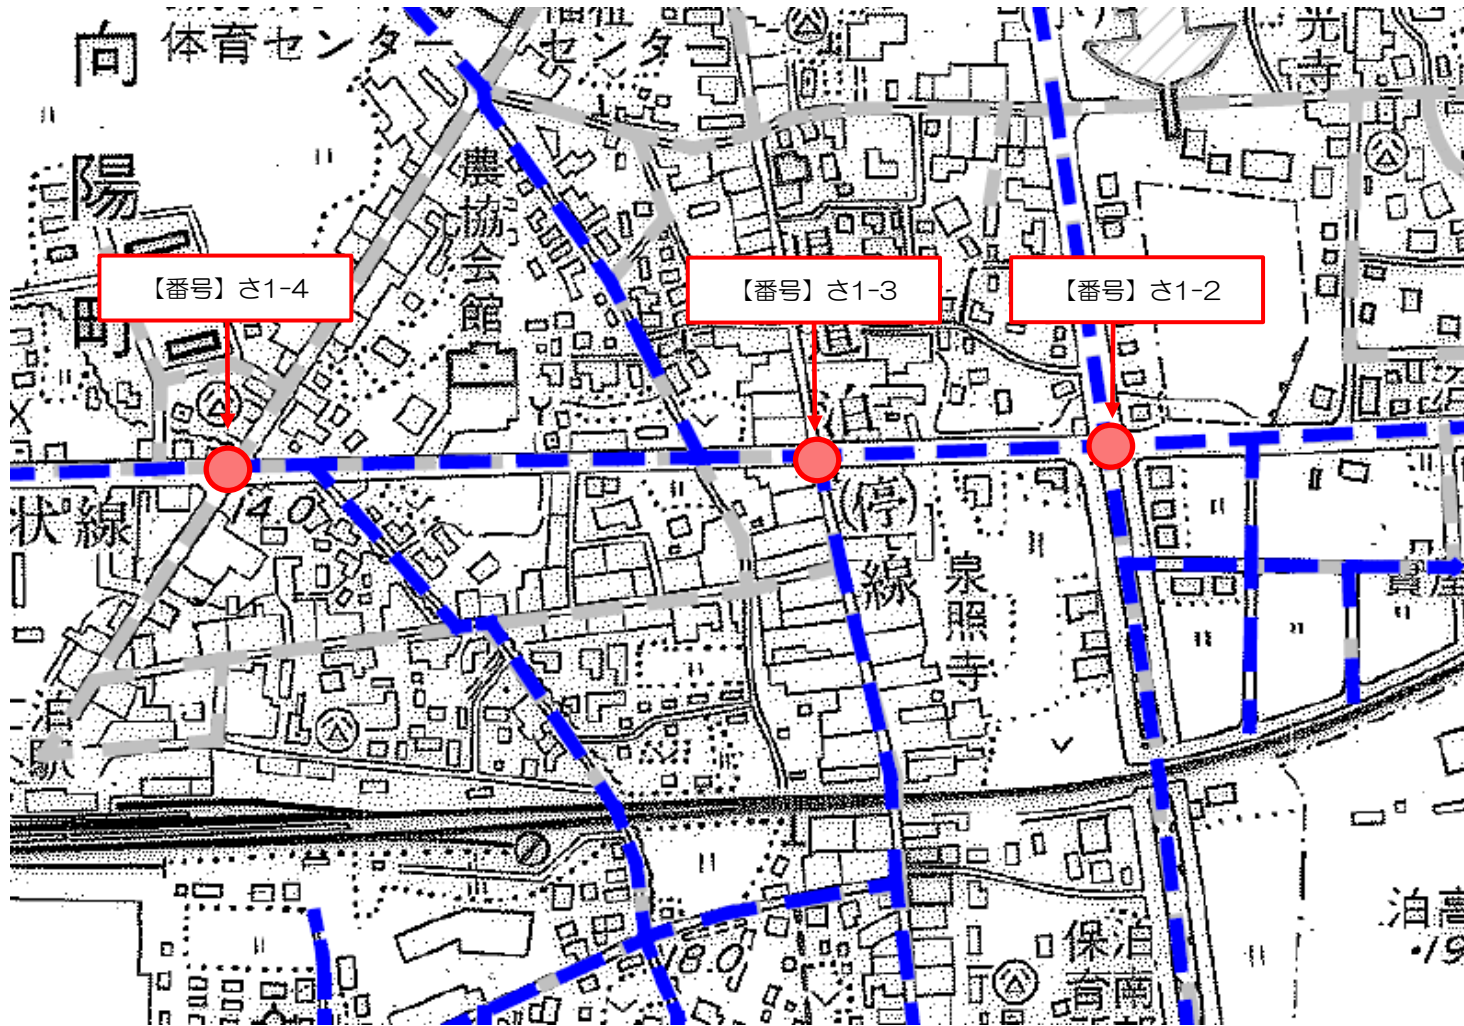

凡例	
	通学路
	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

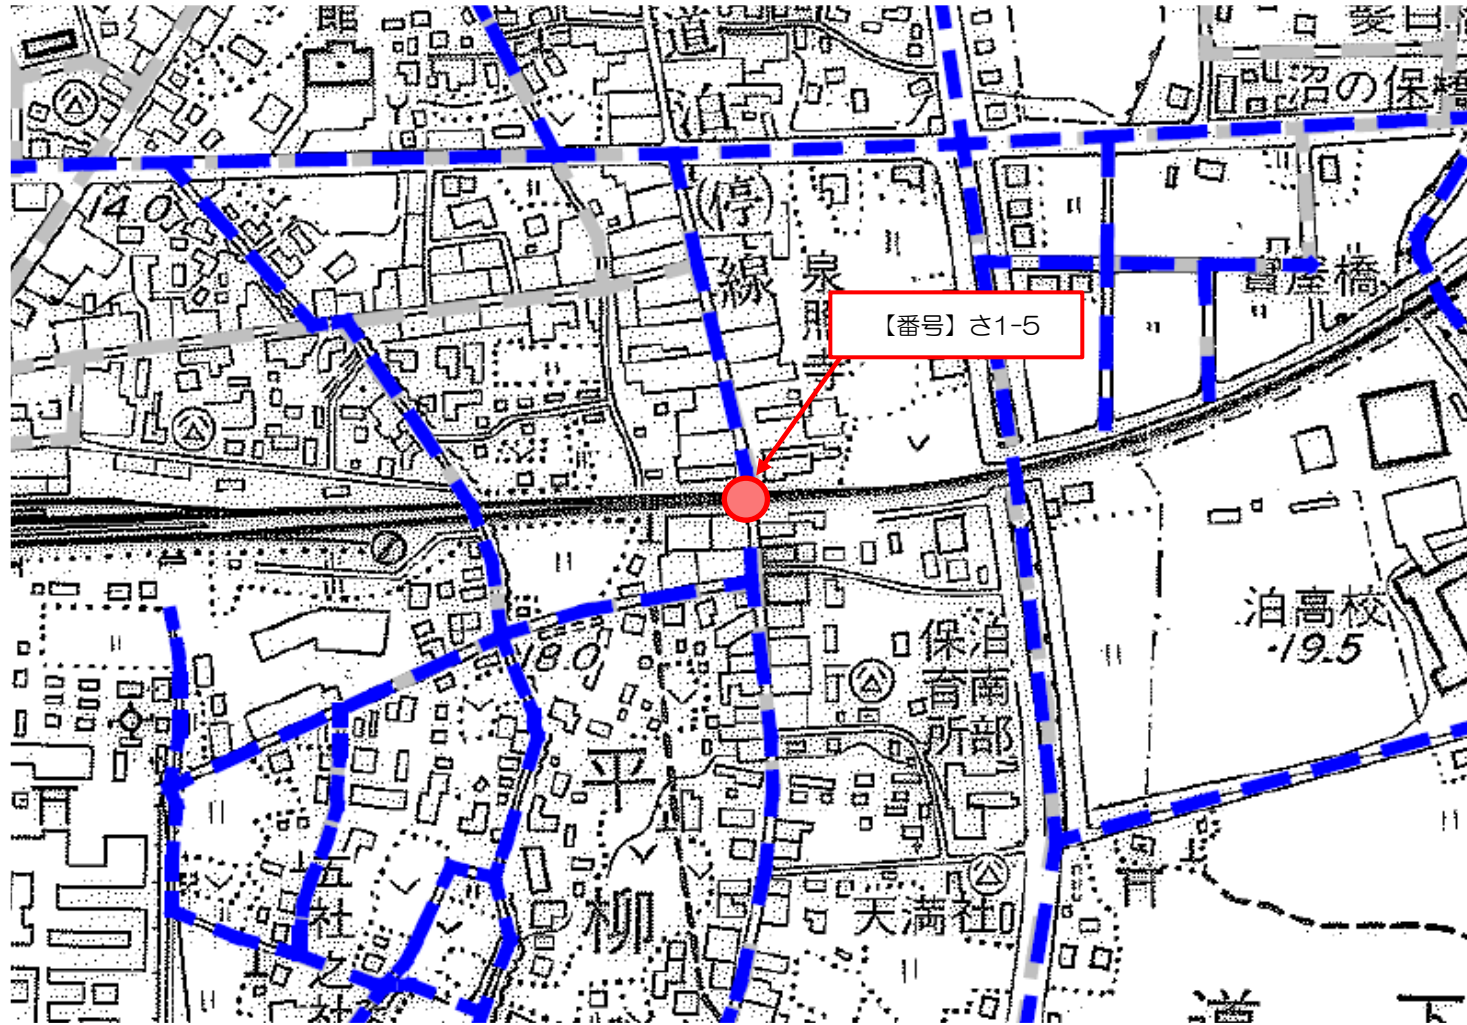

凡例	
	通学路
	要対策箇所

## 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ1-2 【箇所】 荒川地内 【路線】 町道泊桜町線、同 沼保宮本町線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町



**【点検結果】**

- ・ 信号交差点での安全確保が必要（信号待ち時など）

**【対策内容と実施状況】**

- 対策内容  
防護柵等の設置
- 実施状況  
実施済(横断歩道のカラー表示を含む)

【番号】 さ1-3 【箇所】 荒川地内 【路線】 県道泊停車場線、町道泊環状線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町



**【点検結果】**

- ・ 信号交差点での安全確保が必要（信号待ち時など）

**【対策内容と実施状況】**

- 対策内容  
防護柵等の設置
- 実施状況  
実施済

## 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ1-4 【箇所】 泊地内 【路線】 県道泊停車場線、町道泊環状線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町



**【点検結果】**

- ・信号交差点での安全確保が必要（信号待ち時など）

**【対策内容と実施状況】**

○対策内容

防護柵等の設置

○実施状況

実施済

【番号】 さ1-5 【箇所】 道下地内 【路線】 県道泊停車場線 【対策】 実施済 【対策機関】 富山県



**【点検結果】**

- ・踏み切りを横断する際に車と接近するため危険

**【対策内容と実施状況】**


○対策内容

路面着色をするなど注意喚起を図る

○実施状況

実施済（路面表示）


朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

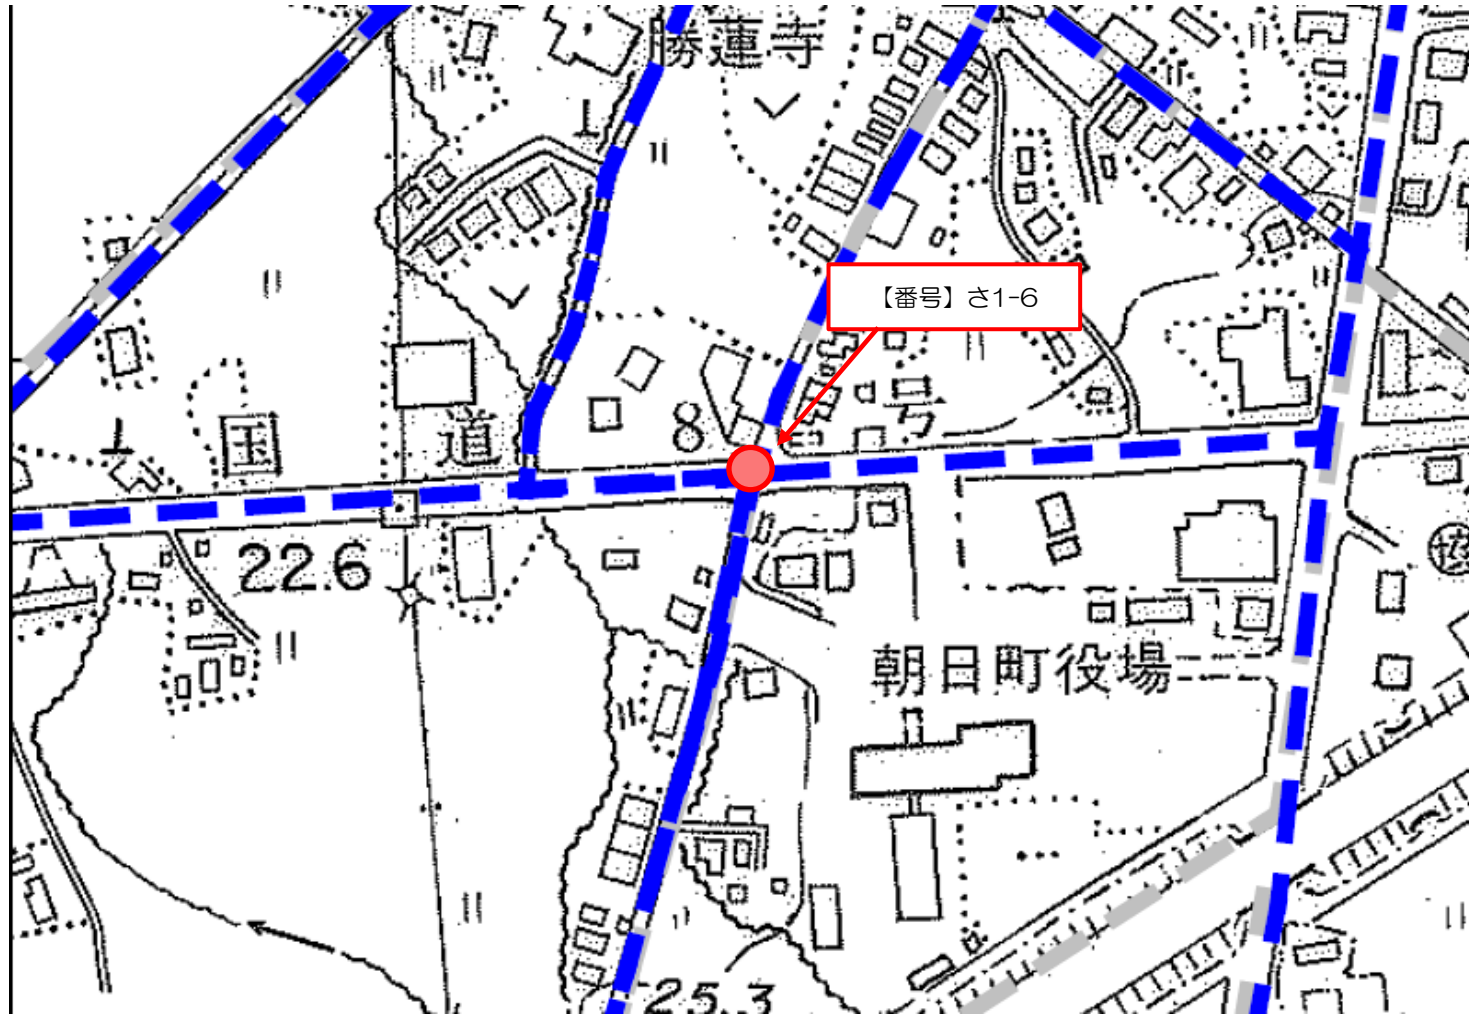


凡例	
	通学路
	要対策箇所

# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

泊駅南土地区画整理事業  
設計図（現況重図）

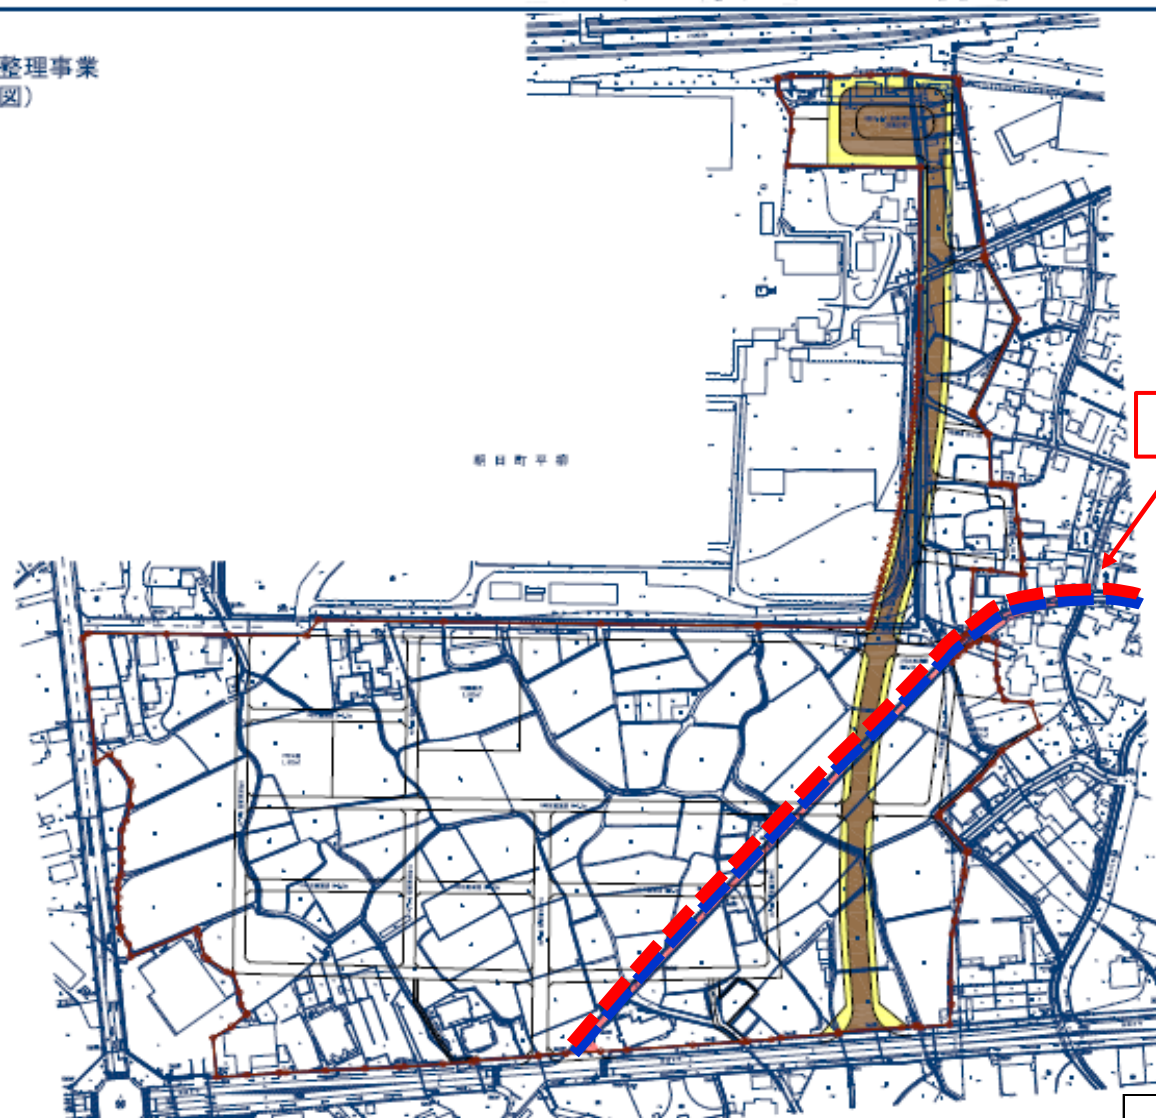

【番号】さ1-7

凡例	
	通学路
	要対策箇所

# 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ1-6 【箇所】 平柳地内 【路線】 国道8号、県道泊停車場線 【対策】 実施済 【対策機関】 国



【点検結果】

- 信号交差点の安全確保が必要（信号待ち時など）

【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
防護柵等の設置
- 実施状況  
実施済

【番号】 さ1-7 【箇所】 平柳地内 【路線】 町道平柳月山線（国道8号停車場線） 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町




【点検結果】

- 歩道が無く危険

【対策内容と実施状況】


- 対策内容  
歩道がある道路の整備
- 実施状況  
実施済R6

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

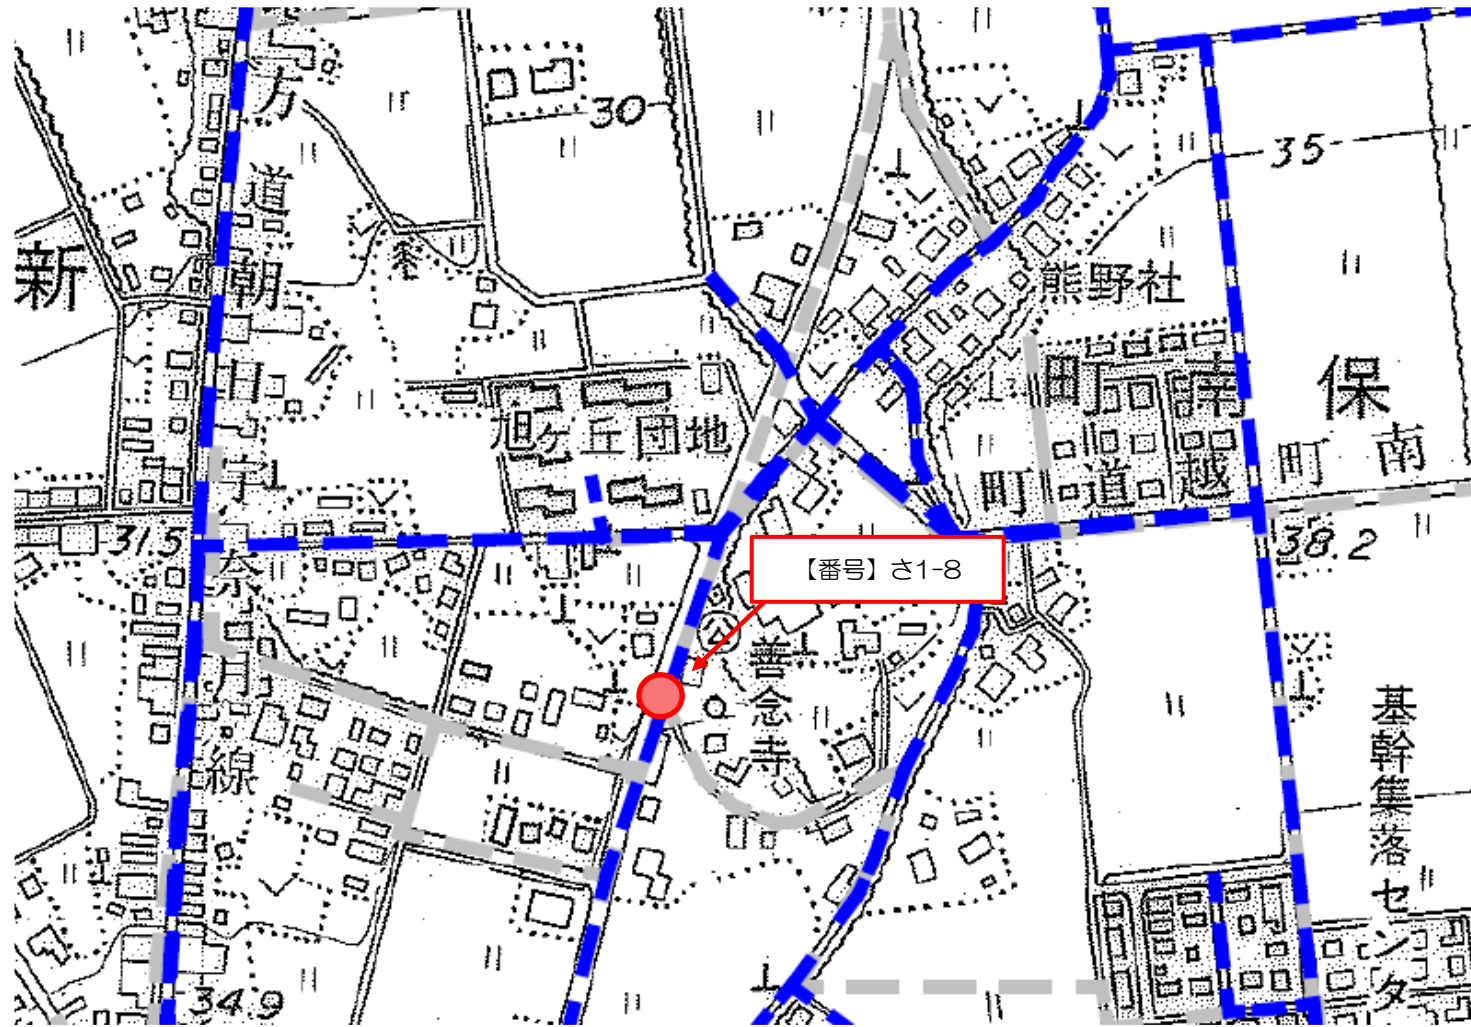

凡例	
	通学路
	要対策箇所


# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

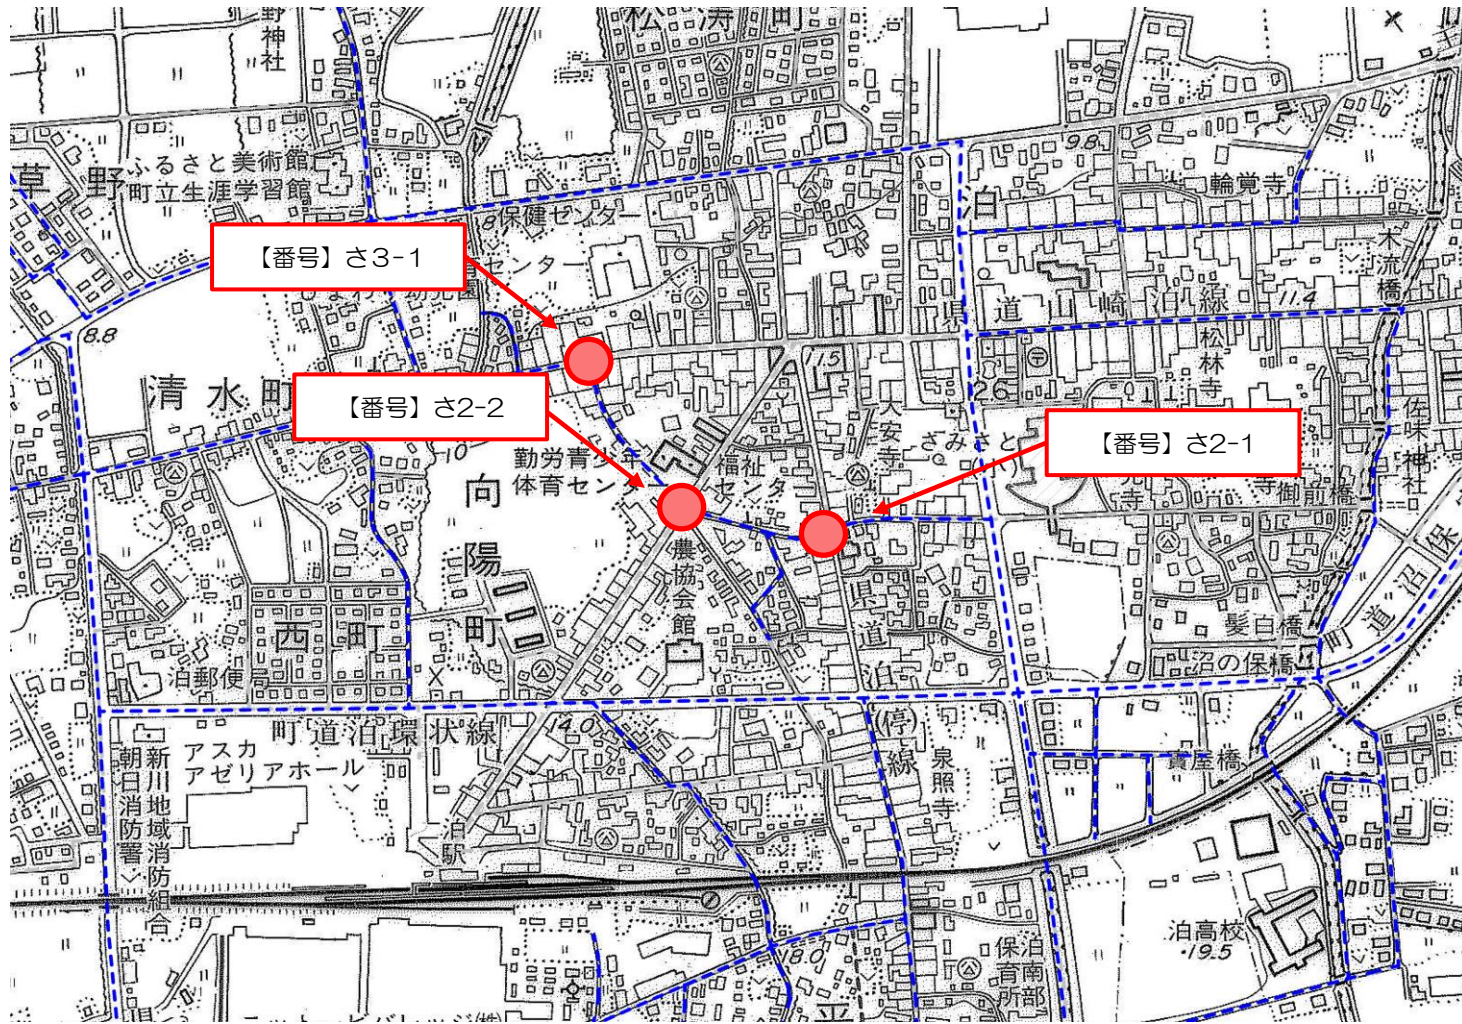

凡例	
	通学路
	要対策箇所


朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

入  
善  
町

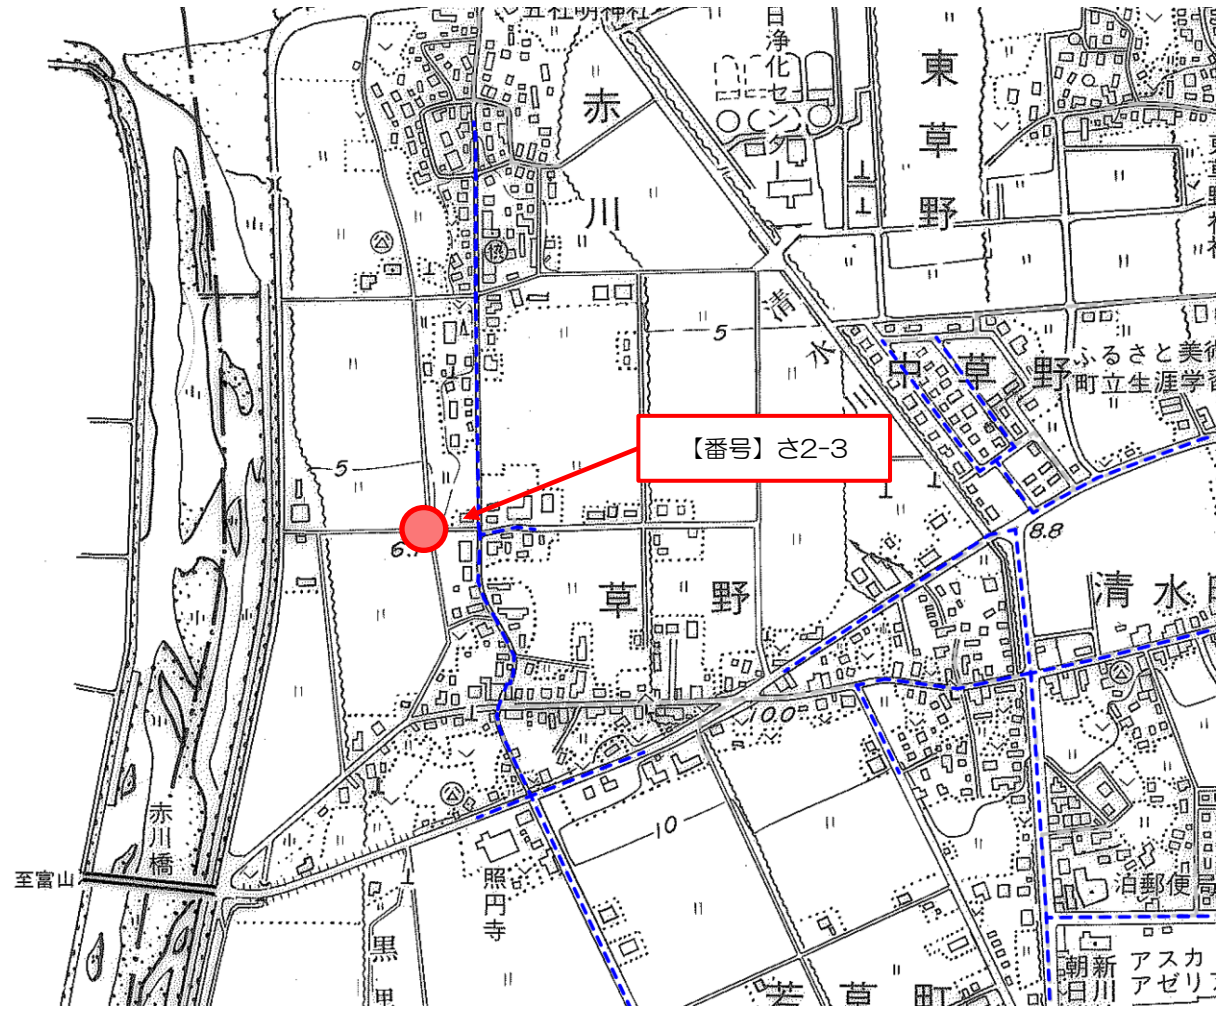

凡例	
	通学路
	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

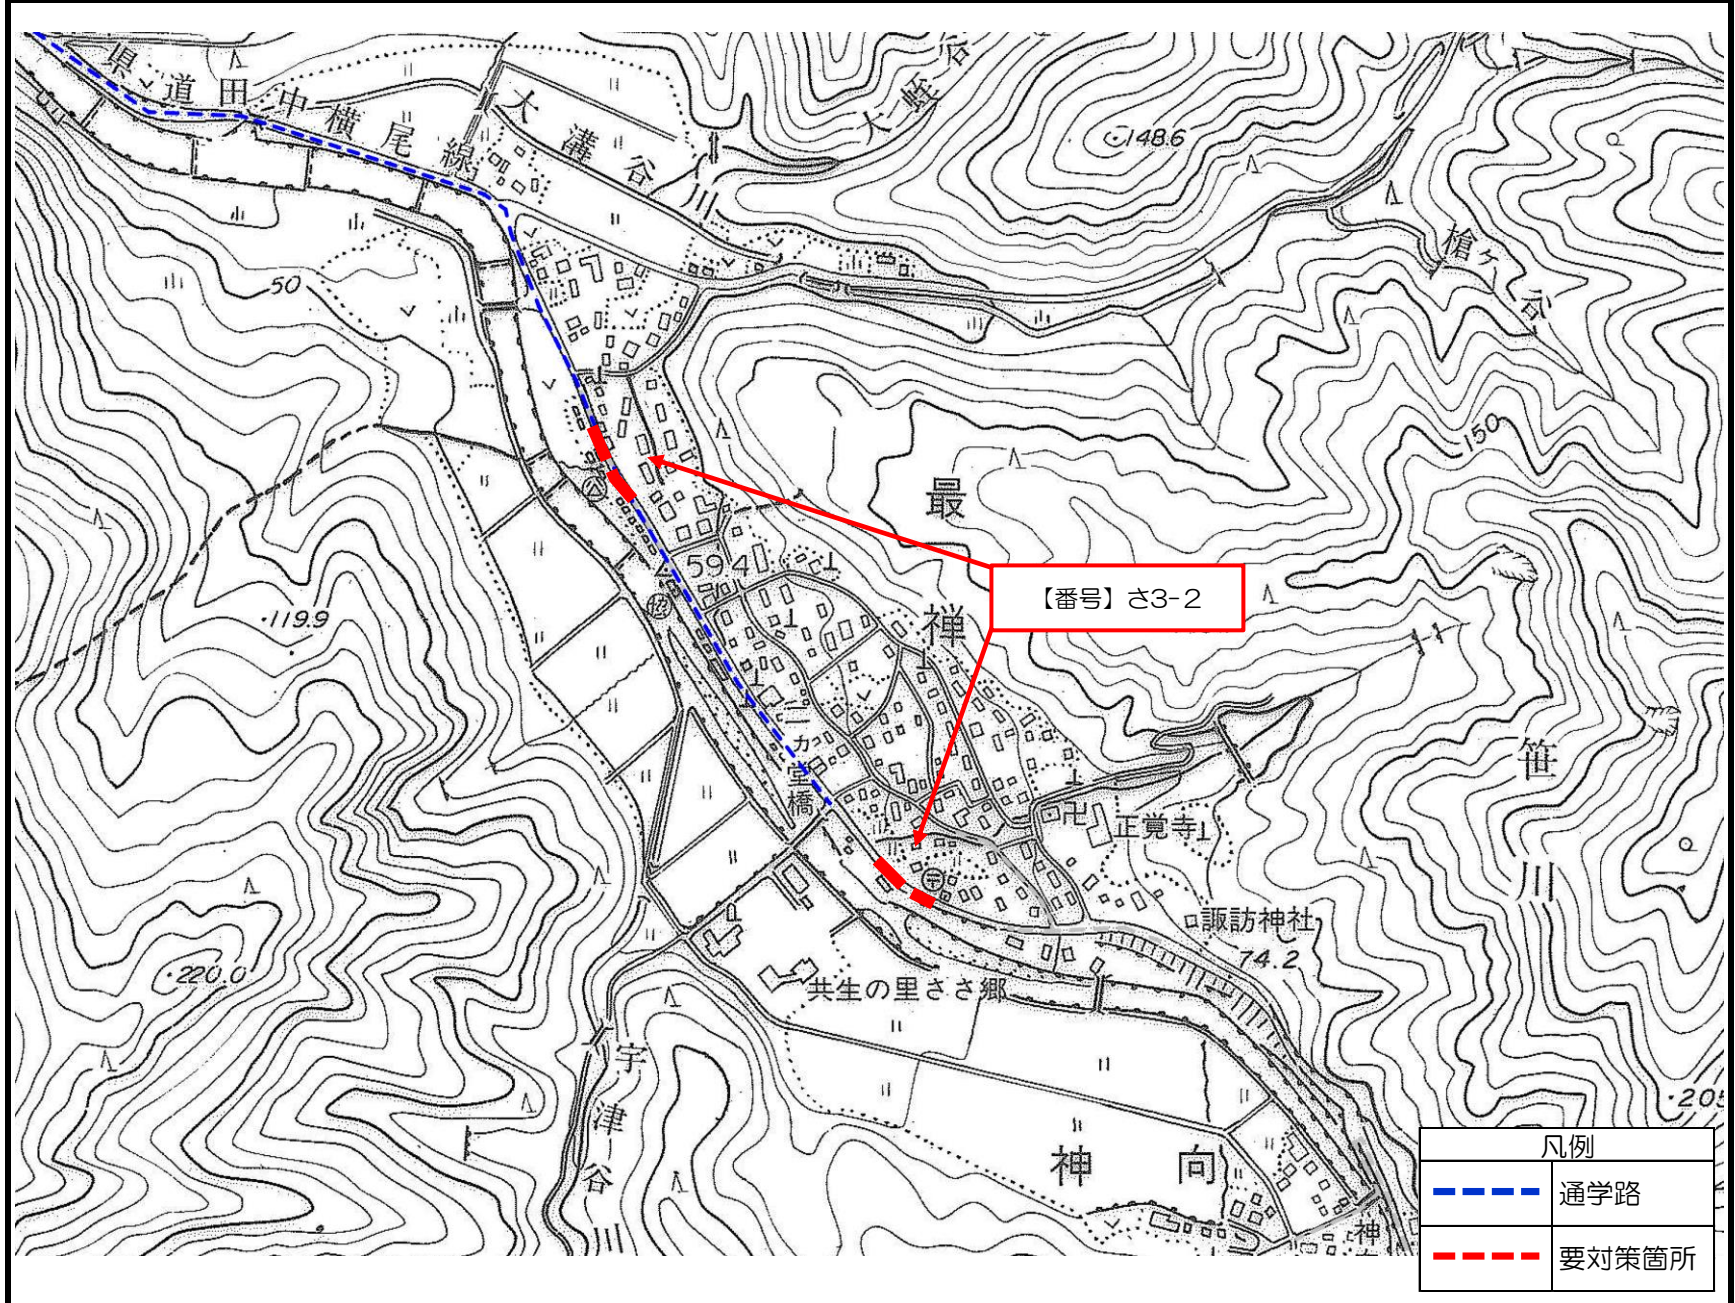

## 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ1-8 【箇所】 桜町地内 【路線】 町道泊桜町線、同 町南保環状2号線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町



【点検結果】

- ・横断歩道が無く危険

【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
近くの横断歩道を渡るようシール表示で注意喚起
- 実施状況  
実施済

【番号】 さ2-1 【箇所】 荒川地内 【路線】 県道泊停車場線、町道上町橋向町線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町



【点検結果】

- ・見通しの悪い路地での飛び出しが懸念

【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
路面への「止まれ」マーク等の設置
- 実施状況  
実施済

## 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ2-2 【箇所】 荒川地内 【路線】 県道泊停車場線、町道上町橋向町線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町



【点検結果】

- ・見通しの悪い路地での飛び出し懸念

【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
路面への「止まれ」マーク等の設置

- 実施状況  
実施済

【番号】 さ2-3 【箇所】 草野地内 【路線】 町道西部保育所線、同 草野赤川線 【対策】 検討中 【対策機関】 入善警察署



【点検結果】

- ・一旦停止がなく危険

【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
一旦停止標識、表示の設置

- 実施状況  
検討中

## 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ3-1 【箇所】 上町地内 【路線】 町道泊草野線、上町橋向町線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町



【点検結果】  
 ・児童の飛び出しの危険

【対策内容と実施状況】  
 ○対策内容  
 路面表示(止まれマーク等) 及びドット線の追加  
  
 ○実施状況  
 実施済


【番号】 さ3-2 【箇所】 笹川地内(甲子、中央町内) 【路線】 県道田中横尾線 【対策】 実施済 【対策機関】 富山県



【点検結果】  
 ・見通しの悪いカーブ付近での車との接触の危険  
 (同一路線上2箇所)

【対策内容と実施状況】  
 ○対策内容  
 路面への減速表示の追加(2箇所とも) \*写真は中央町内  
  
 ○実施状況  
 実施済

朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

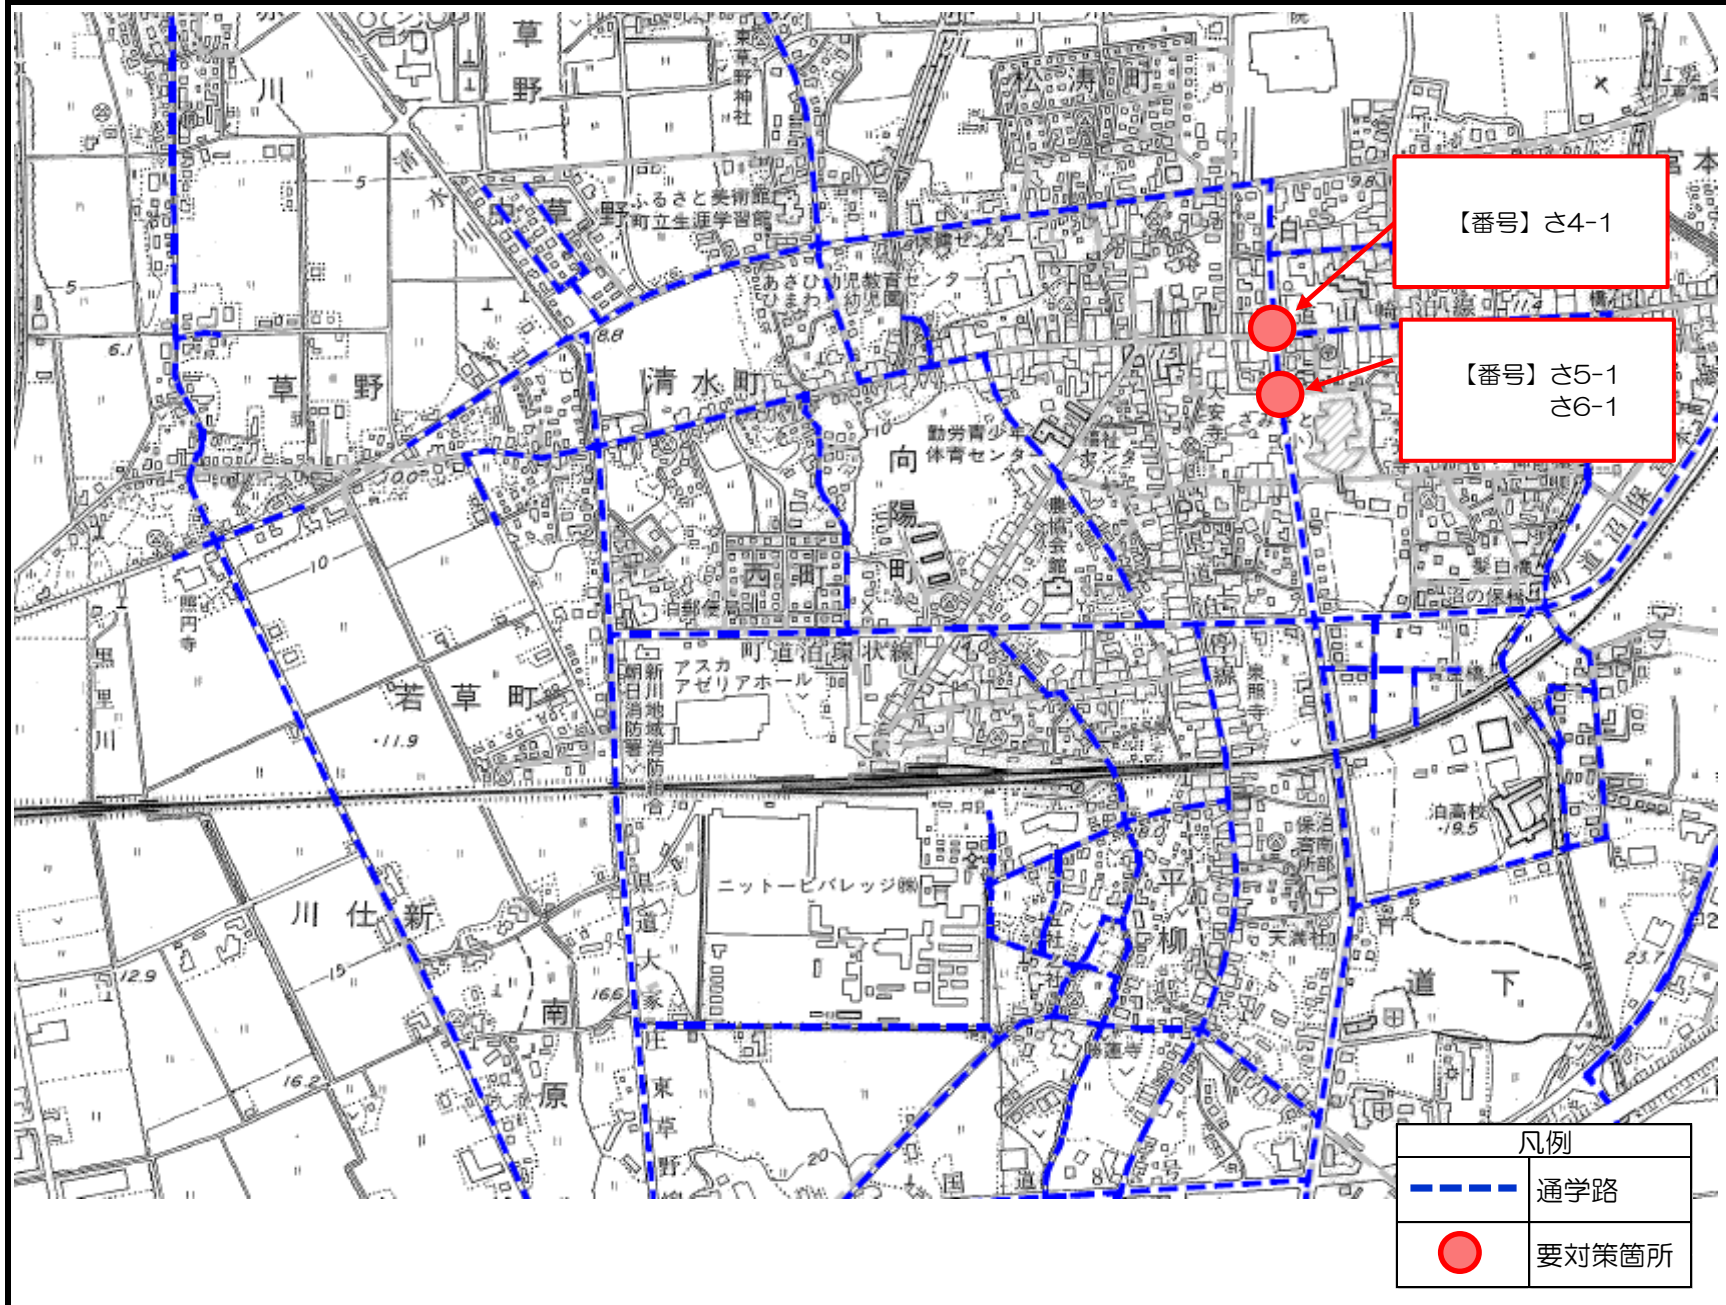

【番号】さ4-1

【番号】さ5-1  
さ6-1

# 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ4-1 【箇所】 泊中町交差点 【路線】 県道山崎泊線、町道泊桜町線 【対策】 実施済み 【対策機関】 入善警察



## 【点検結果】

- ・南北方向に歩行者信号がなく、児童の横断が危険

## 【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
歩行者信号の設置
- 実施状況  
実施（設置済み）

【番号】 さ5-1 【箇所】 さみさと小 【路線】 町道泊桜町線、同 中町荒川線 【対策】 実施済 【対策機関】 入善警察、朝日町



## 【点検結果】

- ・公衆トイレが死角となり、歩道上の児童と車との接触が懸念

## 【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
中町荒川線の一旦停止の標識、表示の補修  
歩道上に注意喚起表示  
児童の指導
- 実施状況  
令和5年度実施済み

# 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ6-1 【箇所】 さみさと小 【路線】 町道泊桜町線 【対策】 実施済み 【対策機関】 朝日町




## 【点検結果】

- 図書館から学校への移動で横断歩道を渡る際、街路樹が視界を遮るため危険

## 【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
街路樹の手入れ及び横断時の待機位置を示す路面標示の追加
- 実施状況  
実施済み


# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

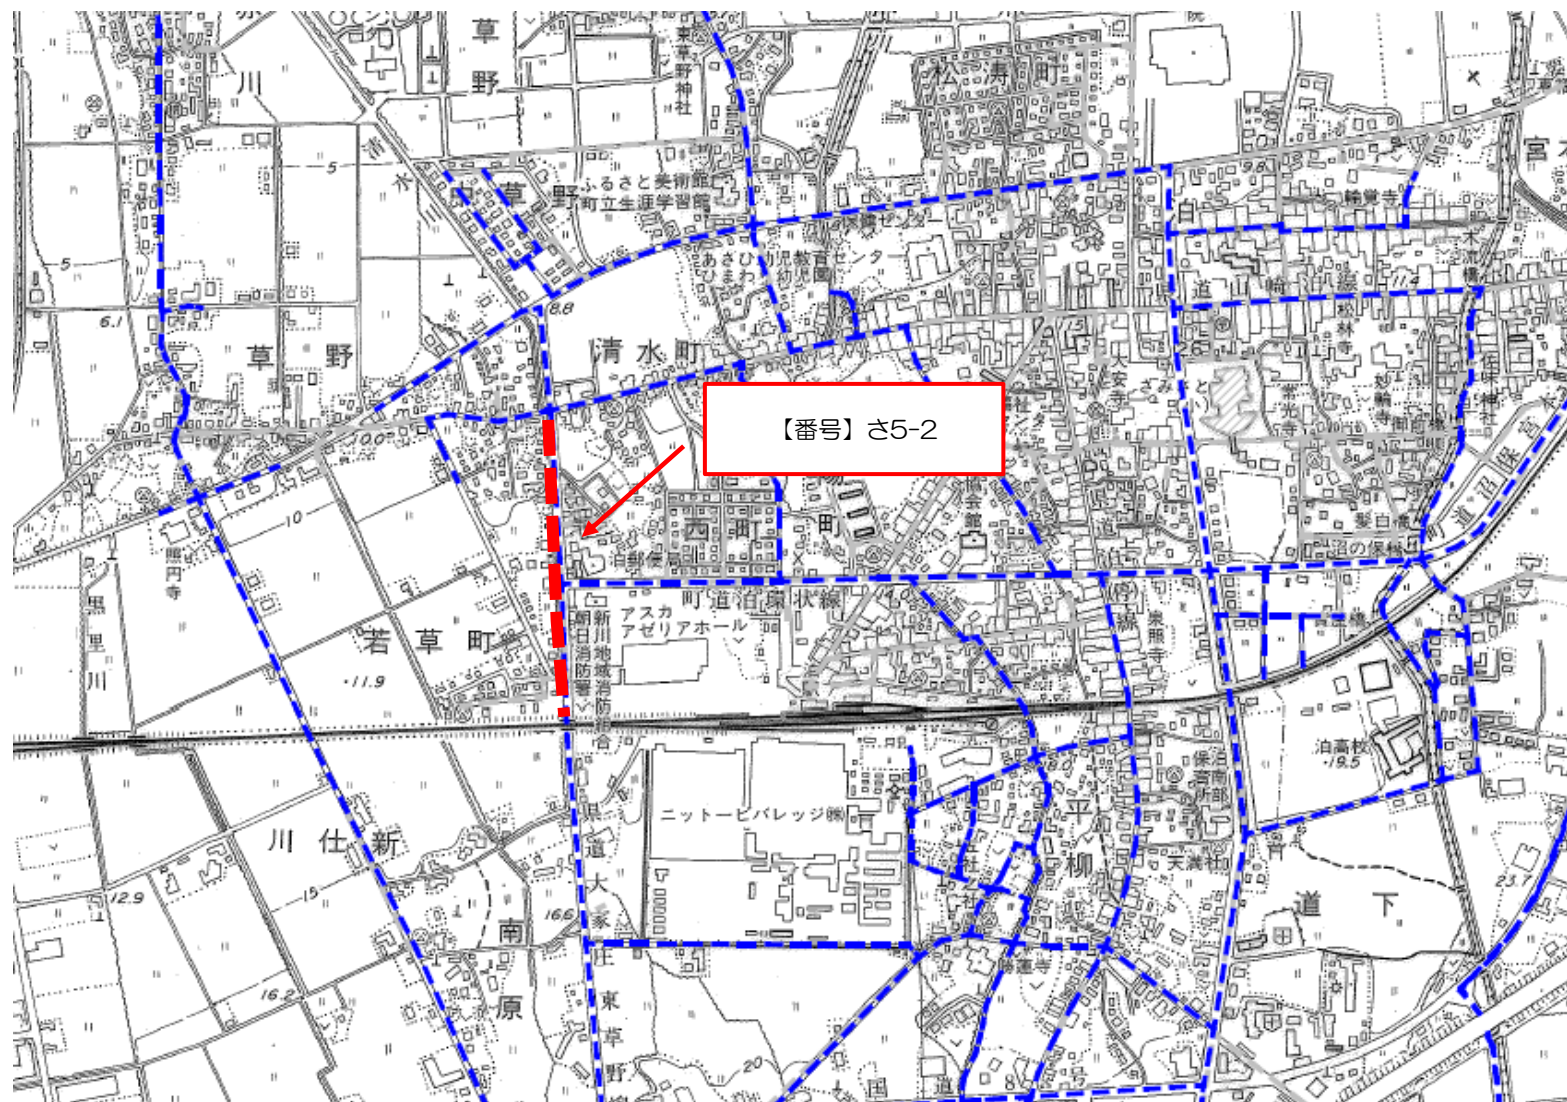


【番号】さ5-2

凡例	
	通学路
	要対策箇所

# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区

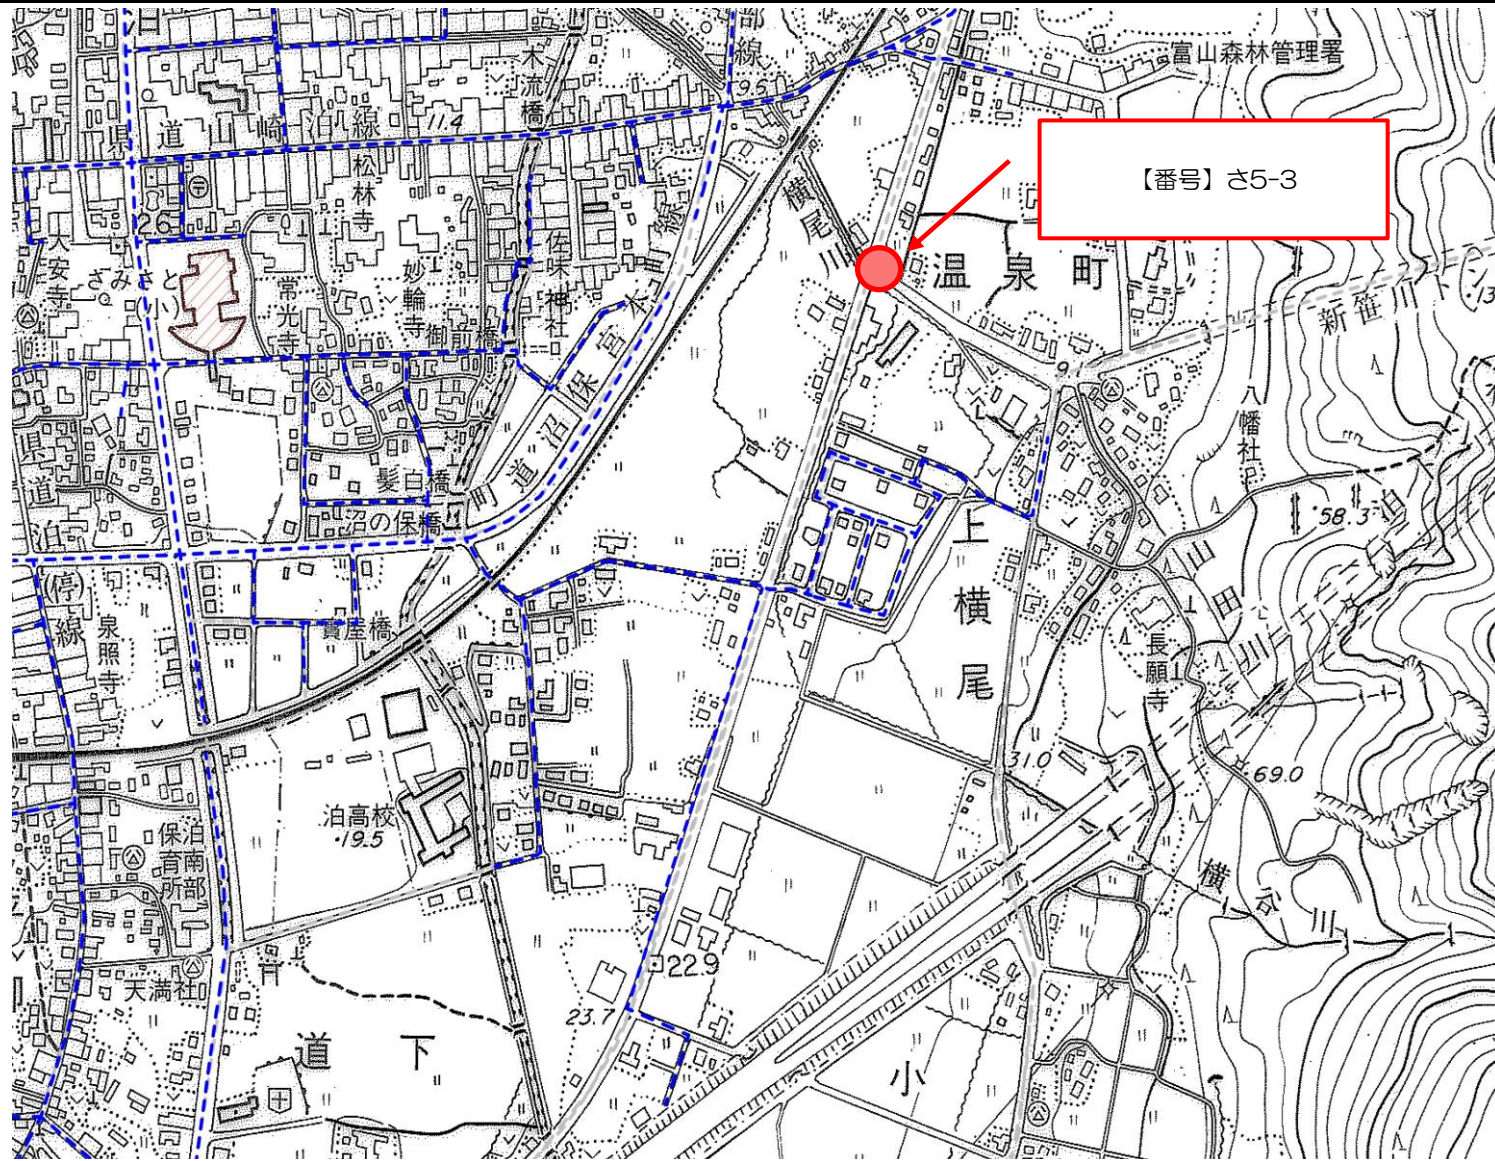

凡例	
	通学路
	要対策箇所

# 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】 さ5-2 【箇所】 東草野地内 【路線】 県道大家庄東草野線 【対策】 検討中 【対策機関】 富山県



## 【点検結果】

- 交通量が多く、路肩の歩行が危険

## 【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
歩行スペースの確保など安全な移動への改善
- 実施状況  
検討中

【番号】 さ5-3 【箇所】 国道8号横尾西交差点 【路線】 国道8号、 県道田中横尾線 【対策】 検討中 【対策機関】 国




## 【点検結果】



- 国道を東進する大型車両と、県道を同交差点で右折して国道に入り、東進するスクールバスとの衝突の危険性  
(国道の大型車両の停止が不十分で、停止線を越える)

## 【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
交差点の視認性の向上
- 実施状況  
検討中（手前のゼブラ表示の補修は実施済み）
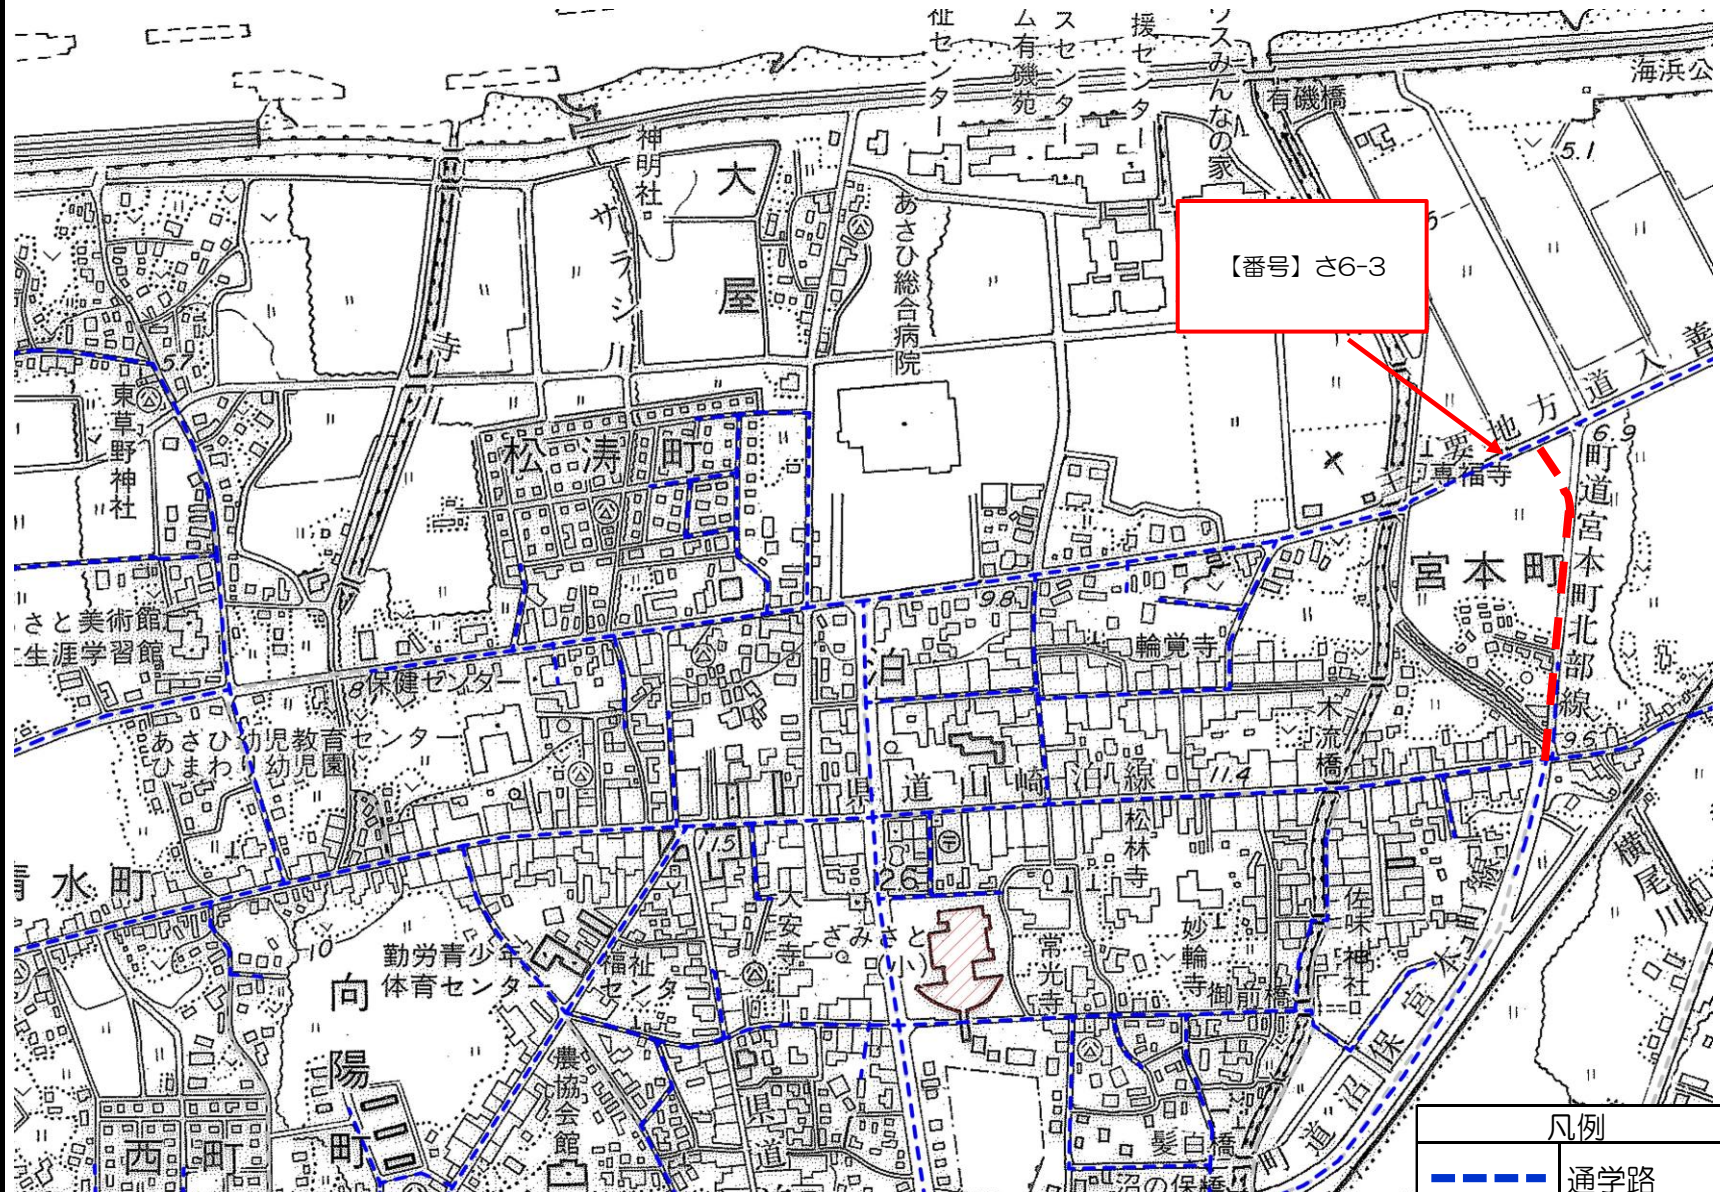
# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 さみさと小学校区



凡例	
	通学路
	要対策箇所

# 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 さみさと小学校区

【番号】さ6-3 【箇所】宮本町交差点【路線】県道山崎泊線、町道宮本町北部線【対策】実施中【対策機関】富山県、朝日町



## 【点検結果】

- 歩道整備が必要

## 【対策内容と実施状況】

### ○対策内容

- 県道—白線の補修等
- 町道—歩道整備

### ○実施状況

- 県道側の白線補修及び路面表示は追加済み
