



朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

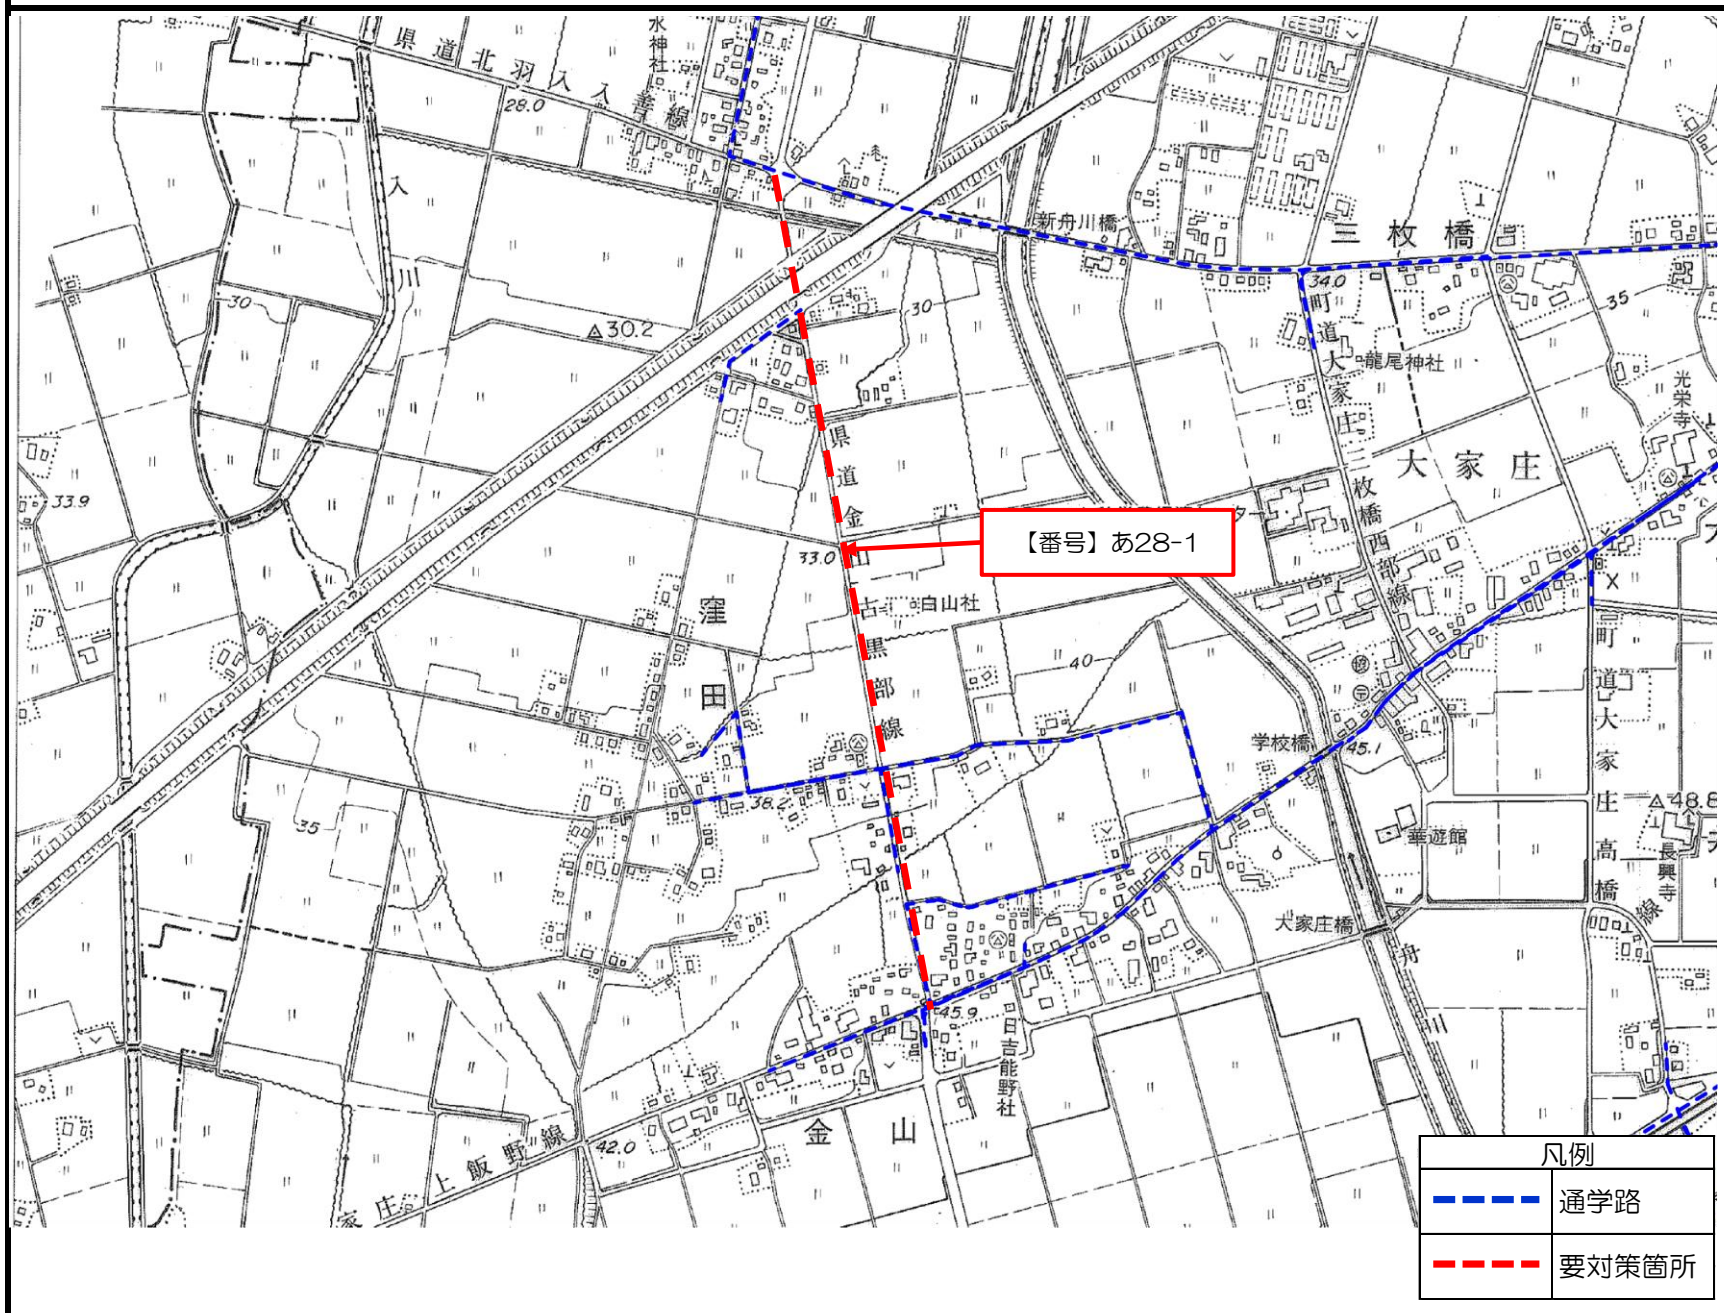

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

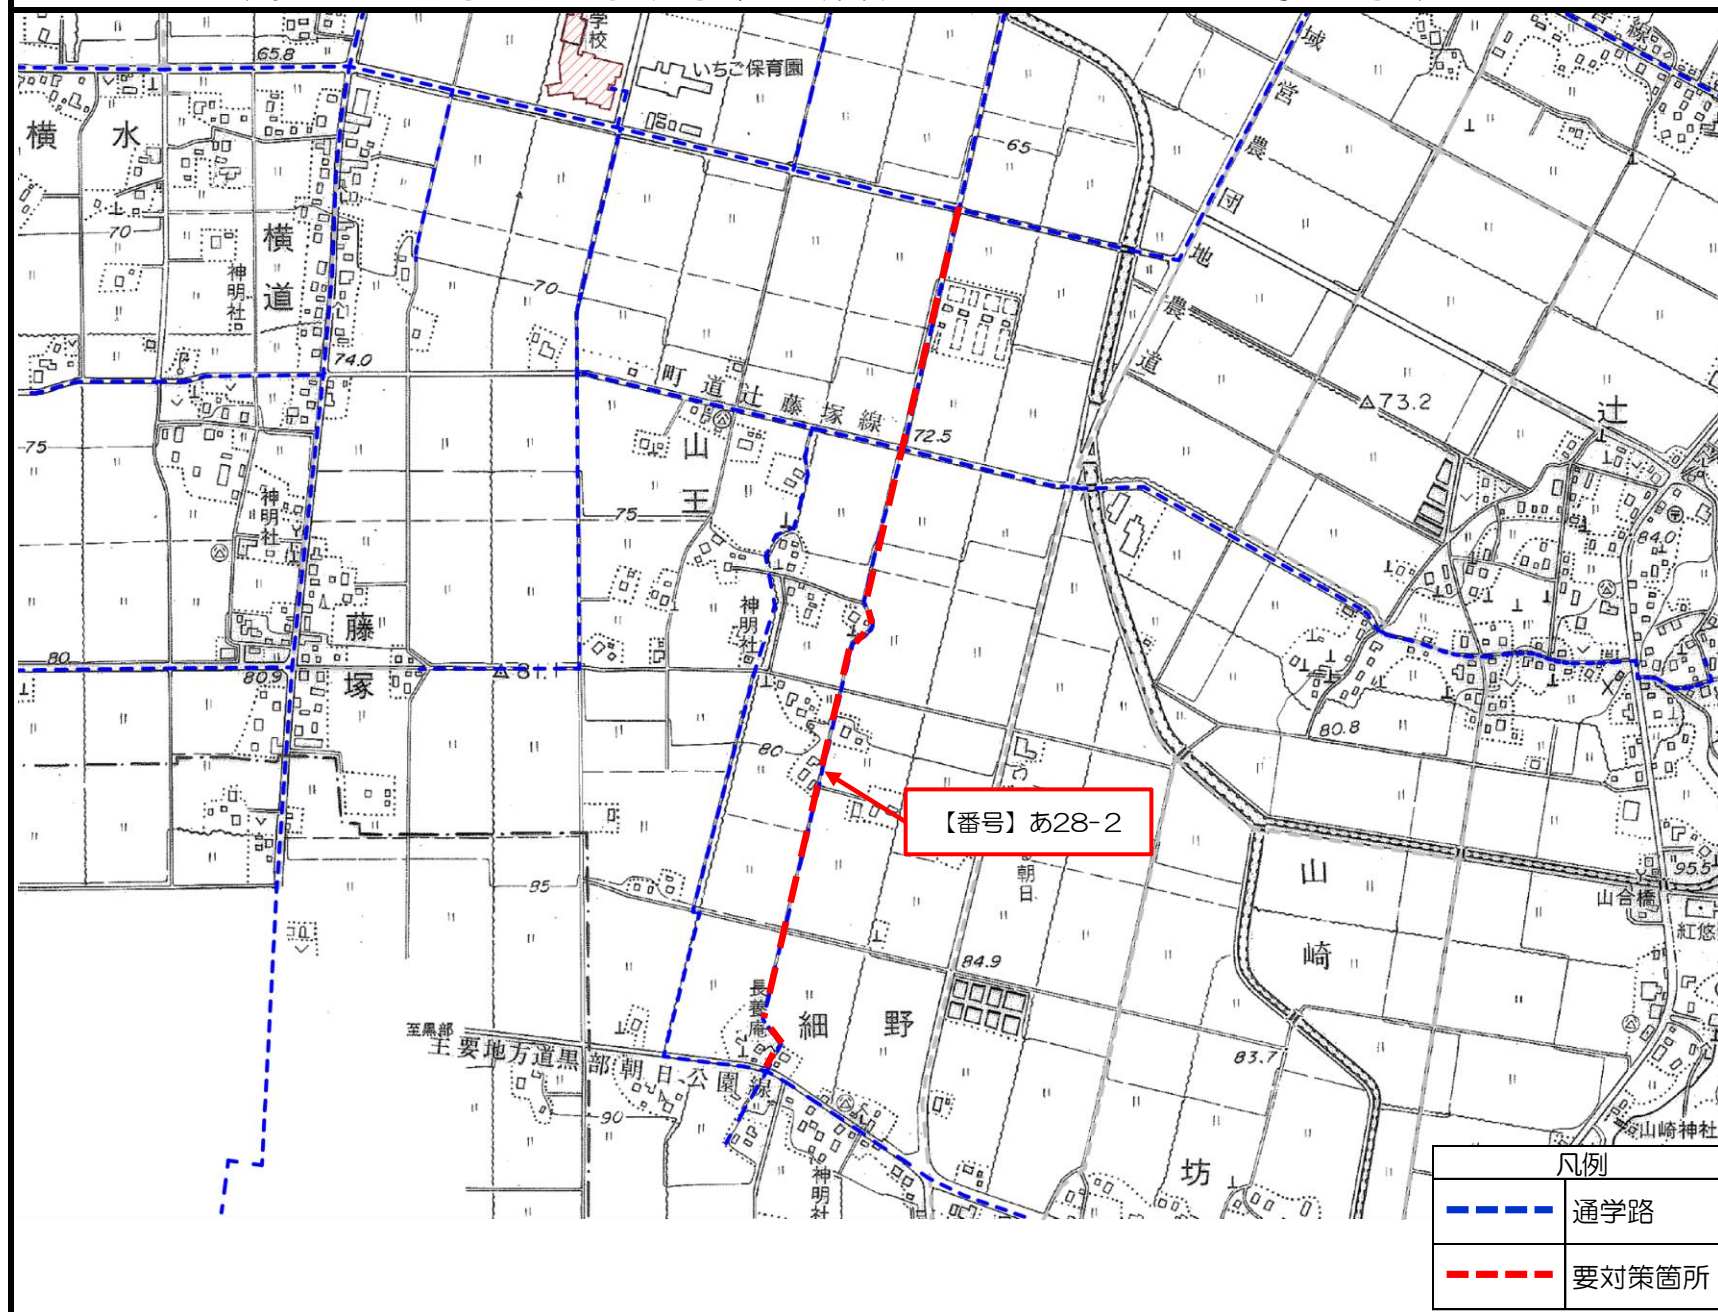

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 あさひ野小学校区

【番号】あ28-1 【箇所】金山～窪田地内 【路線】県道金山古黒部線 【対策】実施済 【対策機関】富山県



【点検結果】

- ・歩道が無く、交通量が多いため危険である。

【対策内容と実施状況】

- 対策内容
道路の拡幅改良・歩道の整備
- 実施状況
実施済

【番号】あ28-2 【箇所】殿町～細野地内 【路線】町道殿町細野線 【対策】実施済 【対策機関】朝日町




【点検結果】

- ・歩道が無く危険である。

【対策内容と実施状況】


- 対策内容
道路の拡幅改良
- 実施状況
実施済

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

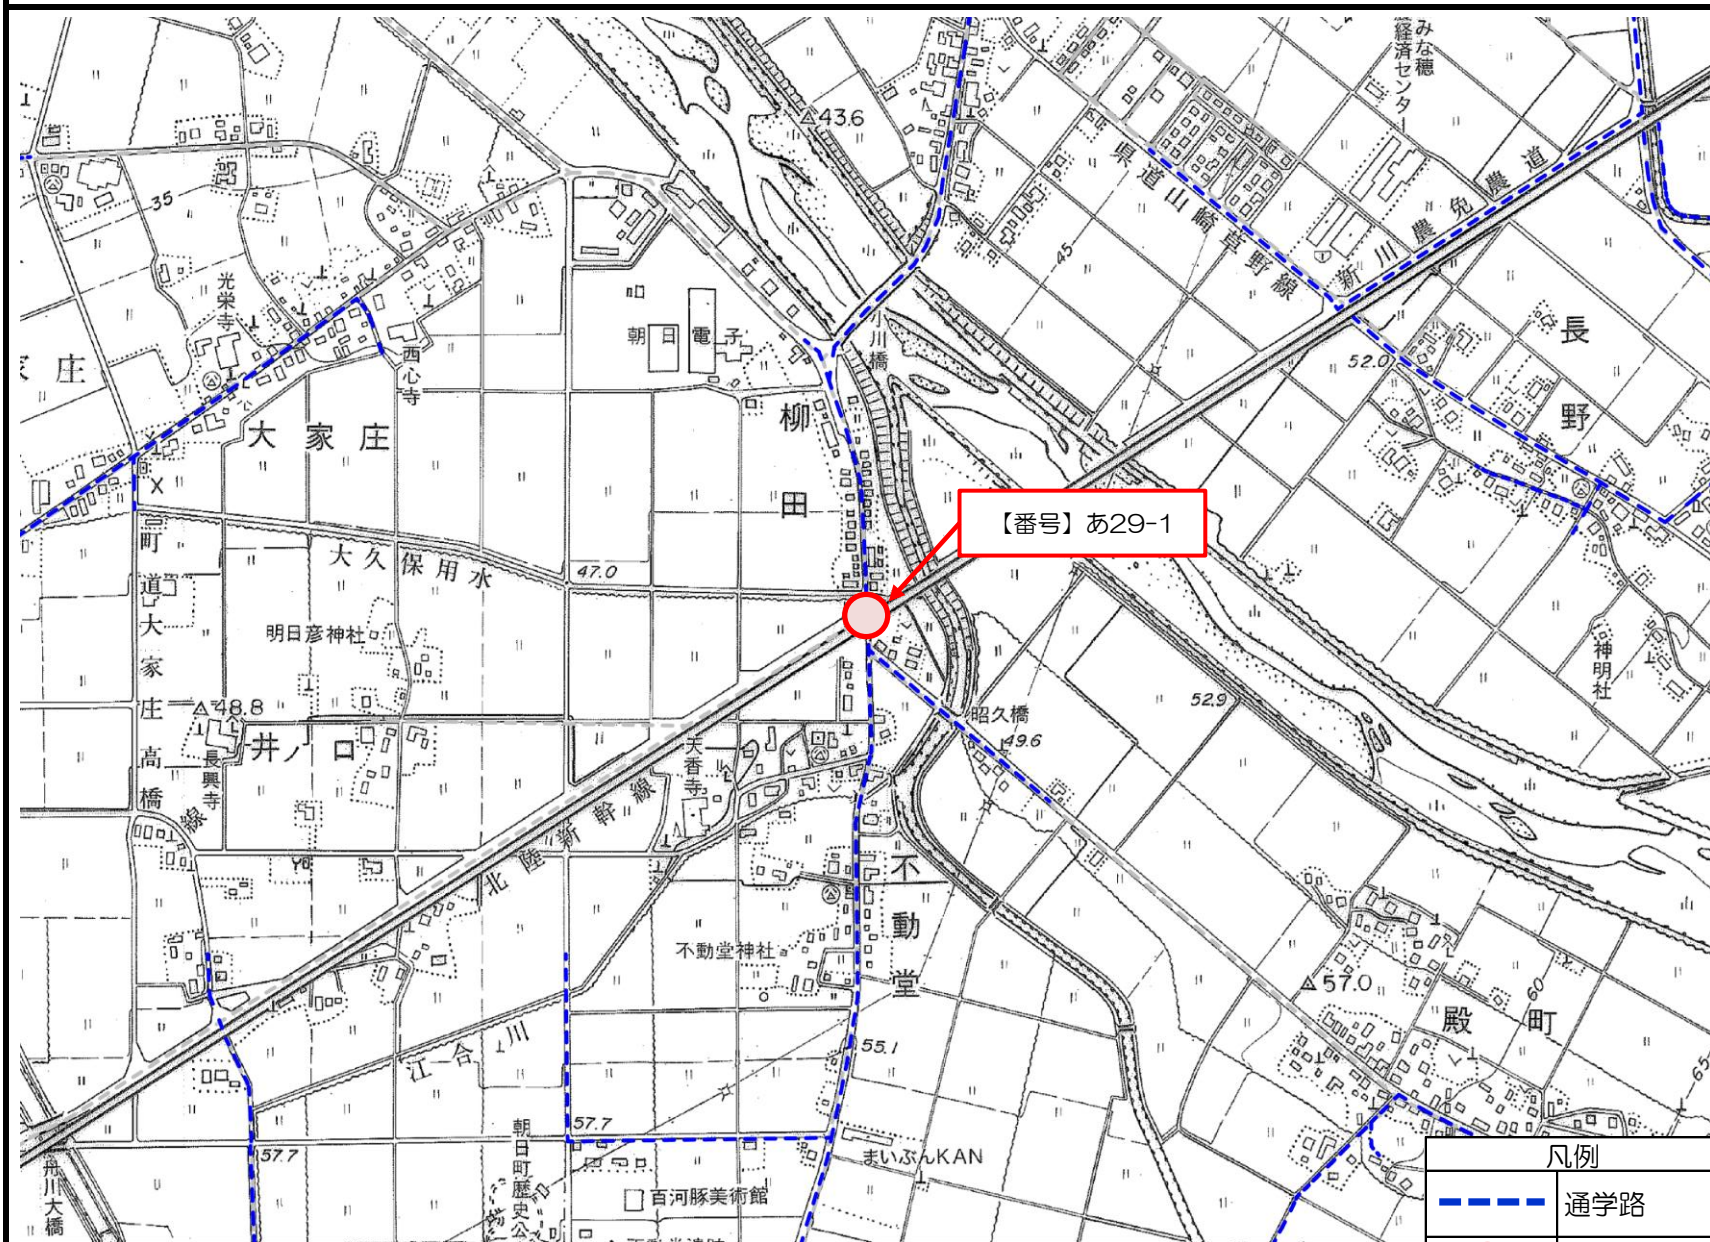

凡例	
	通学路
	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

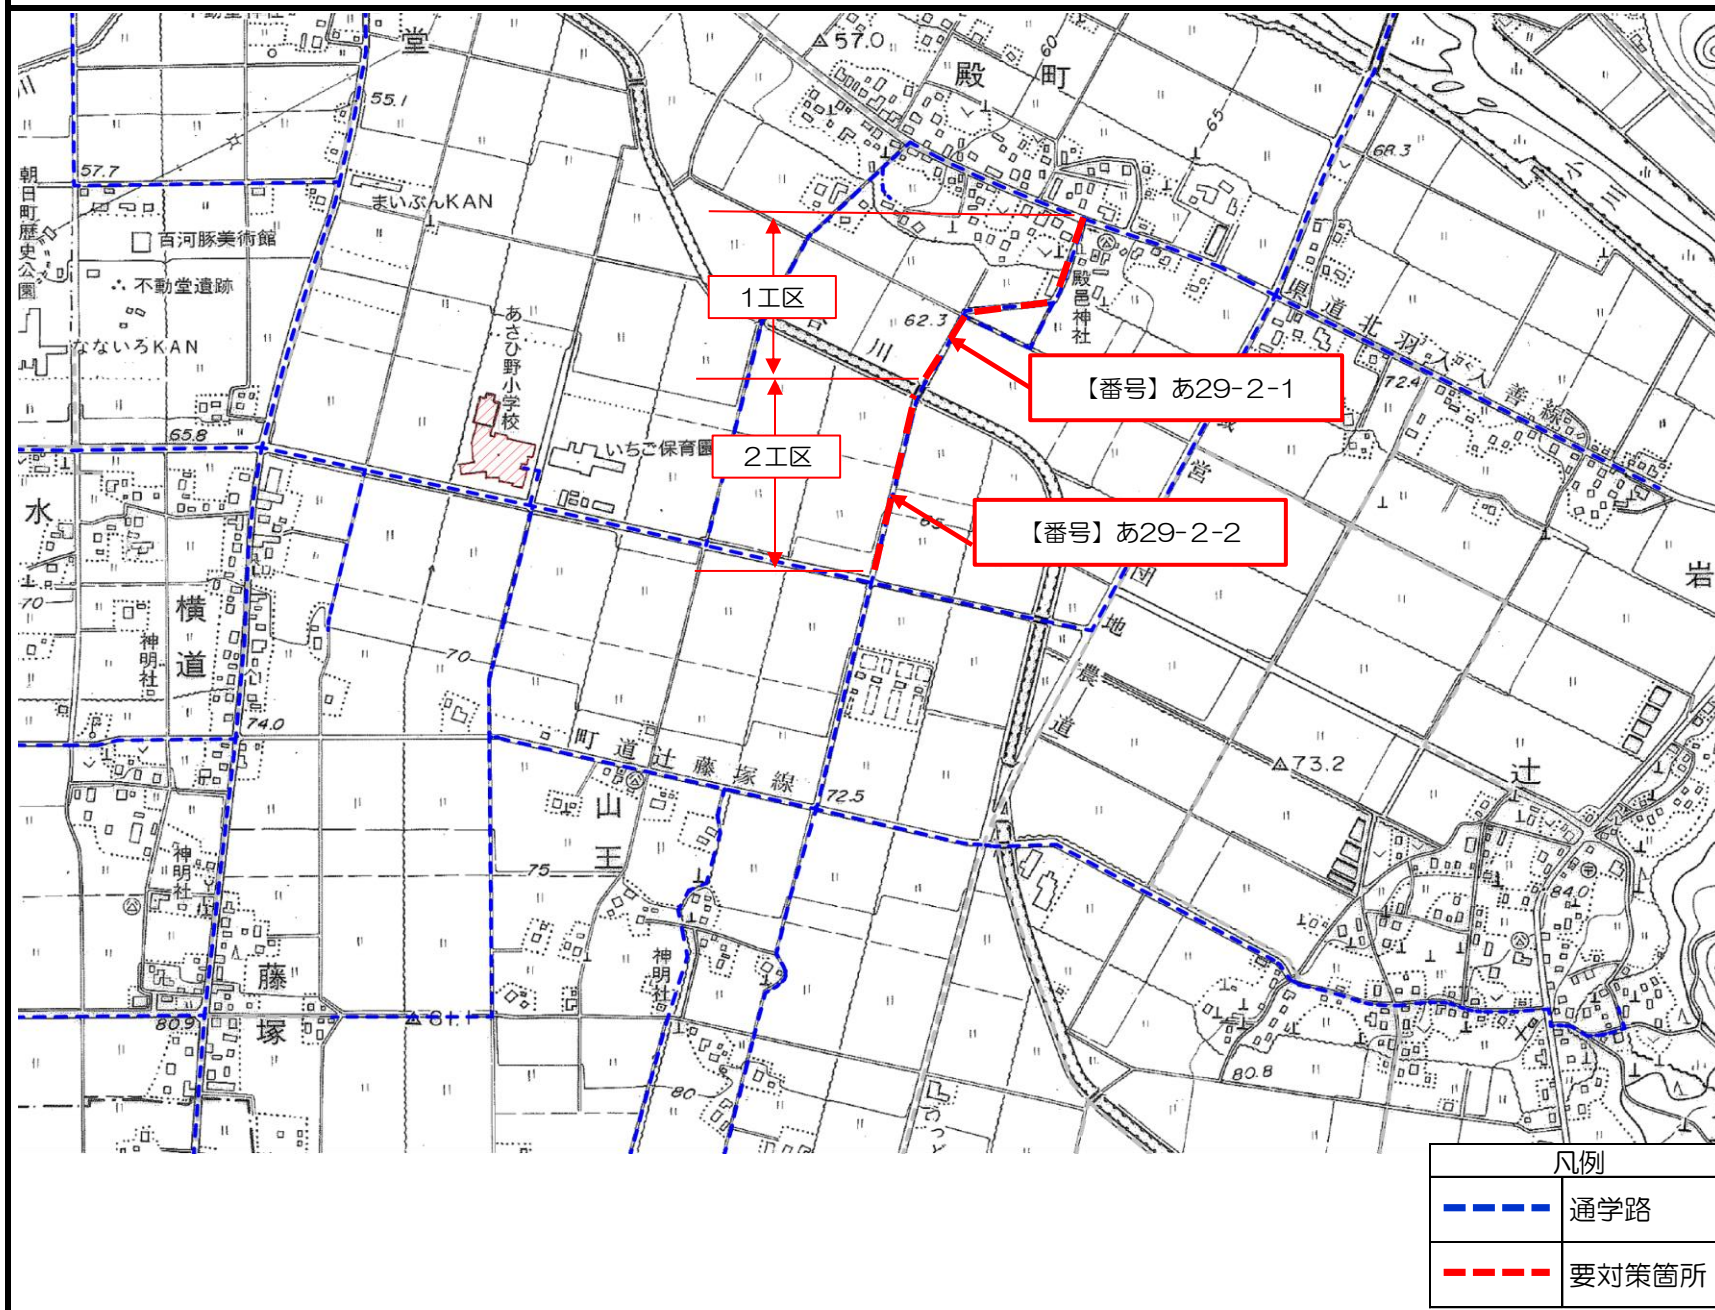

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 あさひ野小学校区

【番号】あ29-1 【箇所】柳田地内 【路線】県道朝日宇奈月線、町道大家庄南保線 【対策】実施済 【対策機関】入善警察署



【点検結果】

- ・横断歩道からの信号が確認しづらい。

【対策内容と実施状況】

- 対策内容
歩行者用信号機の設置
- 実施状況
実施済

【番号】あ29-2-1/あ29-2-2 【箇所】殿町地内 【路線】町道殿町細野線 【対策】実施中 【対策機関】朝日町




【点検結果】

- ・歩道が無く危険である。
- ・橋詰での転落の危険(R2点検時追加)。


【対策内容と実施状況】

- 対策内容
道路の拡幅改良及び安全対策
- 実施状況
実施中

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

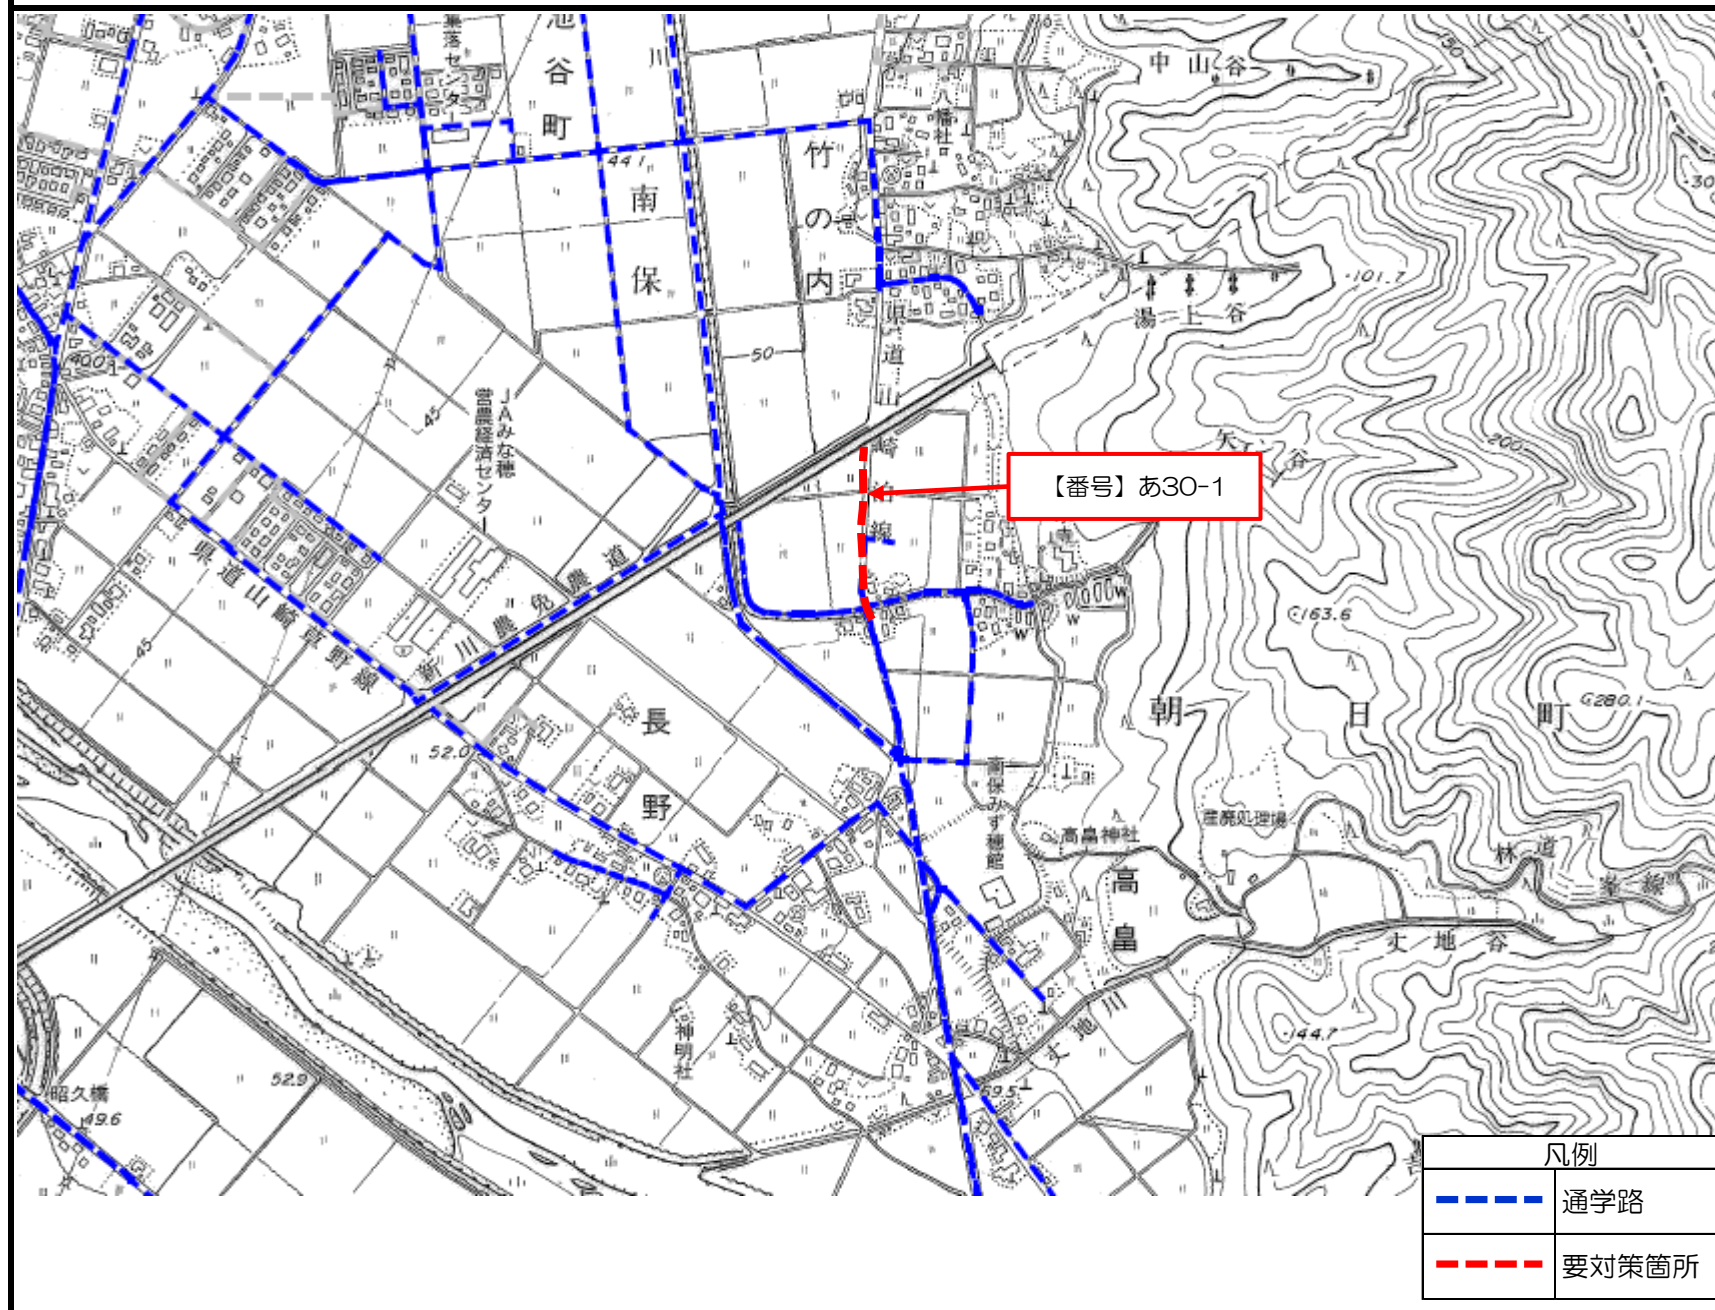

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

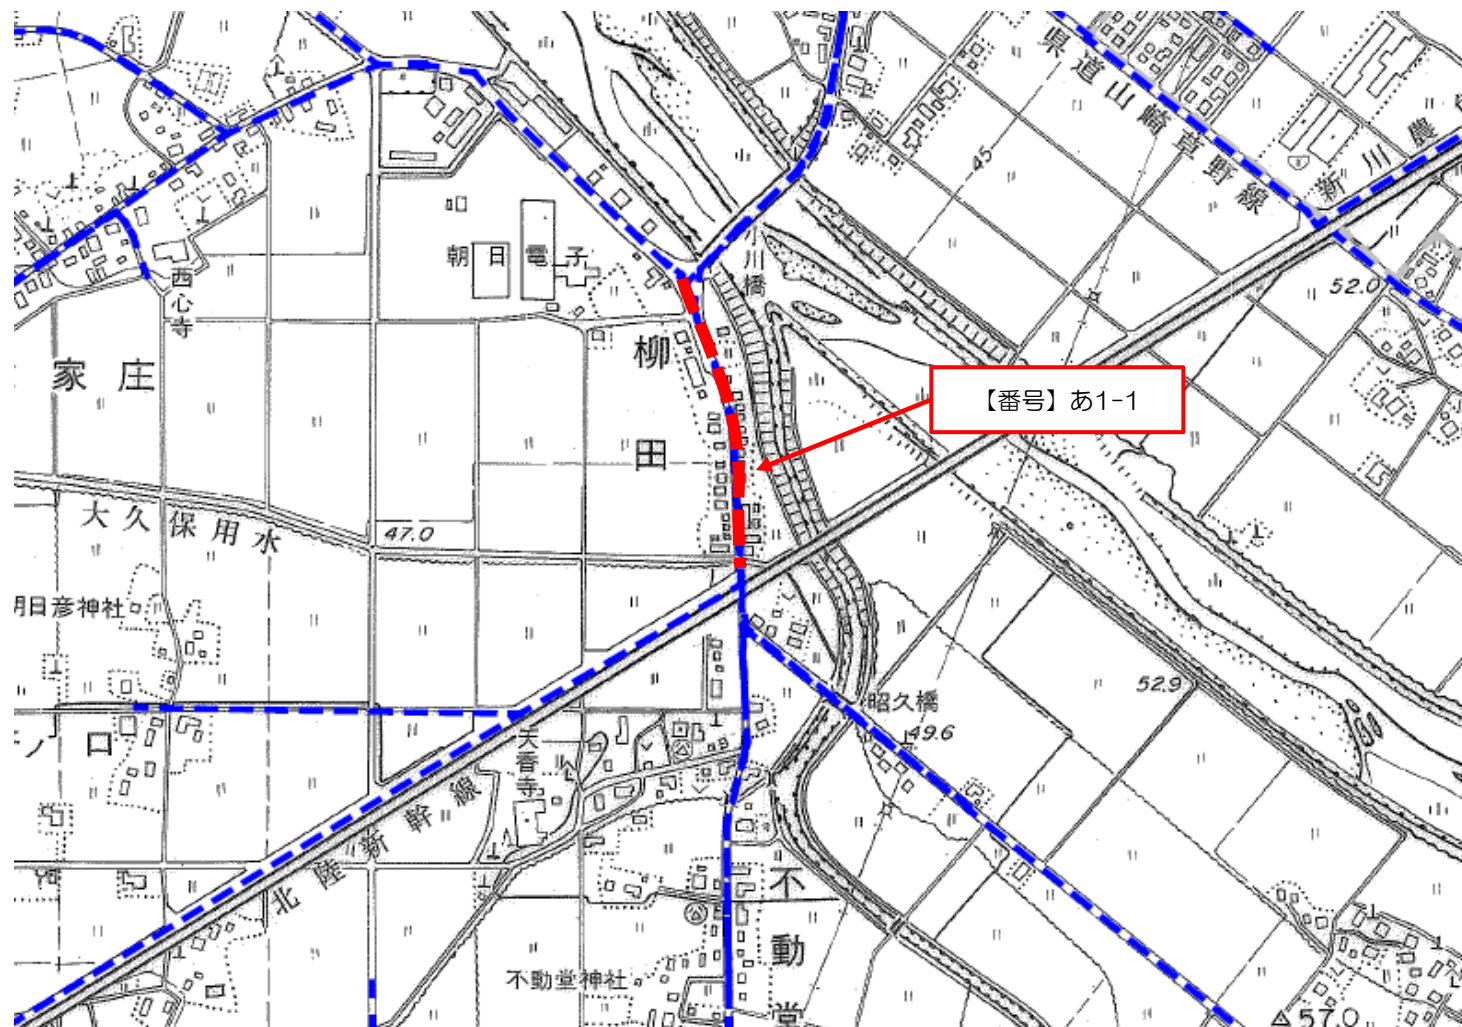

凡例	
----	通学路
----	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 あさひ野小学校区

【番号】あ30-1 【箇所】高畠地内 【路線】県道山崎泊線 【対策】実施済 【対策機関】富山県



【点検結果】

- ・交差点付近の見通しが悪く危険

【対策内容と実施状況】

- 対策内容
路面表示（イメージハンプ）の設置
- 実施状況
実施済

【番号】あ1-1 【箇所】柳田地内 【路線】県道朝日宇奈月線 【対策】検討中 【対策機関】富山県



【点検結果】

- ・歩道がなく危険

【対策内容と実施状況】


- 対策内容
歩道の整備
- 実施状況
検討中
(注意喚起の路面表示を追加)

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区



凡例	
	通学路
	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

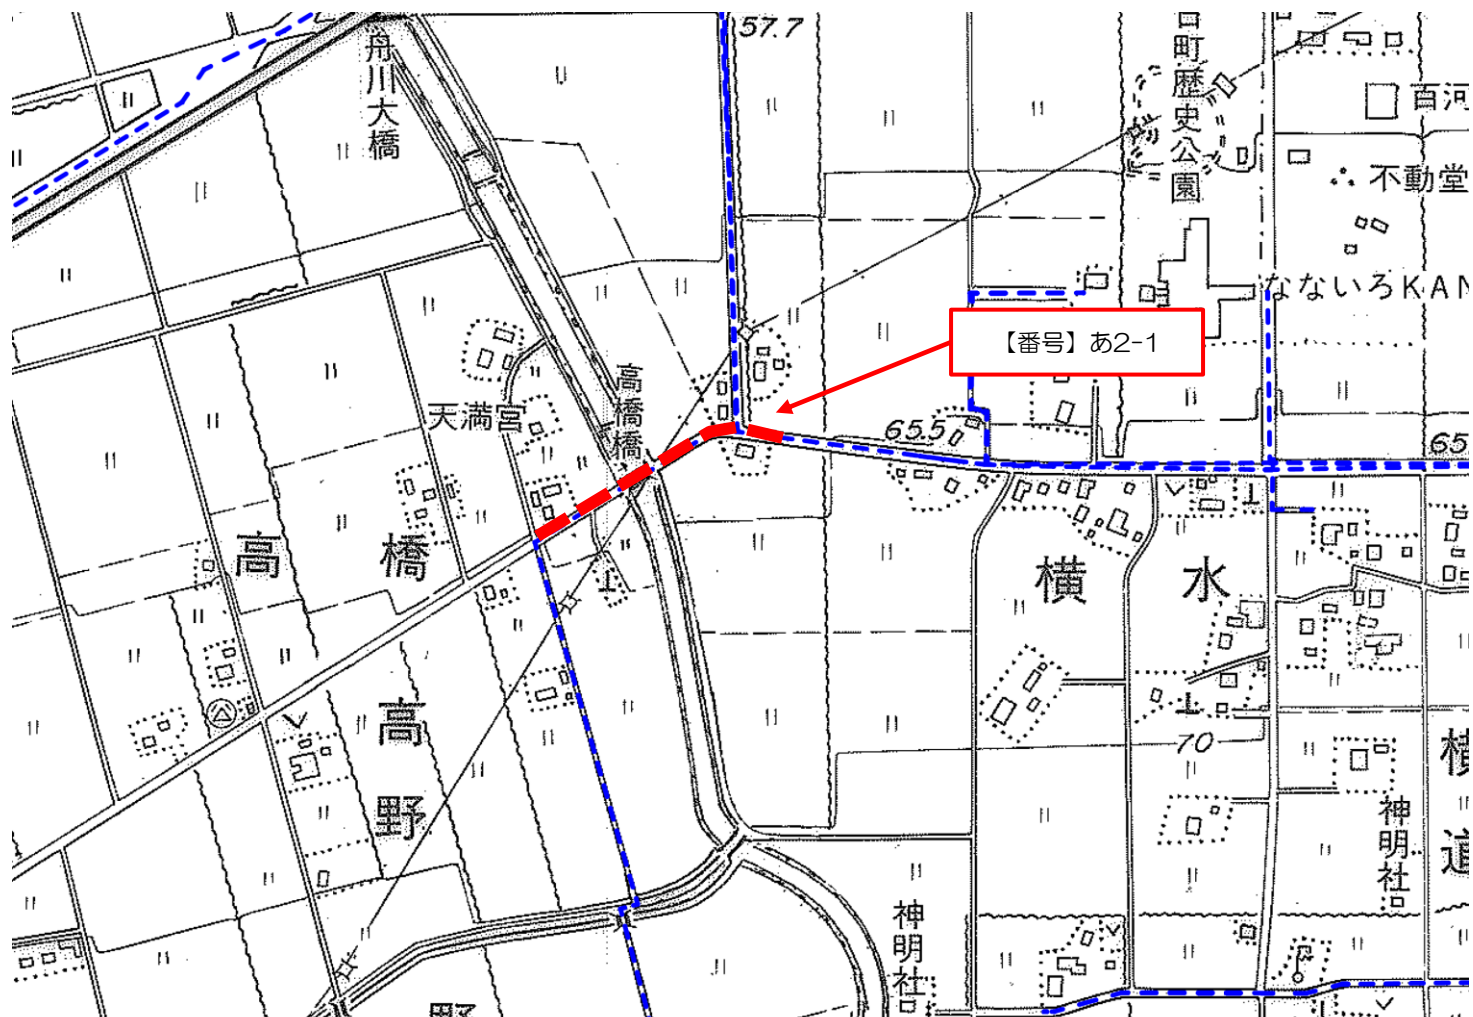

凡例	
	通学路
	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 あさひ野小学校区

【番号】あ1-2 【箇所】横水地内 【路線】県道朝日宇奈月線,町道横水下山新線 【対策】実施済 【対策機関】富山県



【点検結果】

- ・信号待ちの際に児童が車道寄りの位置で待つため危険

【対策内容と実施状況】

○対策内容

- 交差点の視認性向上(カラー化)及び路面表示(待機位置表示マーク)の追加と位置の見直し
- 車の経路を規制するボールの設置(R4追加案件)

○実施状況

- 実施済(カラー化、待機位置マーク、ポール設置)

【番号】あ2-1 【箇所】高橋地内 【路線】町道横水下山新線 【対策】実施済 【対策機関】朝日町



【点検結果】

- ・カーブの見通しが悪く徒歩通学中危険

【対策内容と実施状況】


○対策内容

- 通学路表示追加、減速表示、区画線引き直し

○実施状況

- 実施済

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

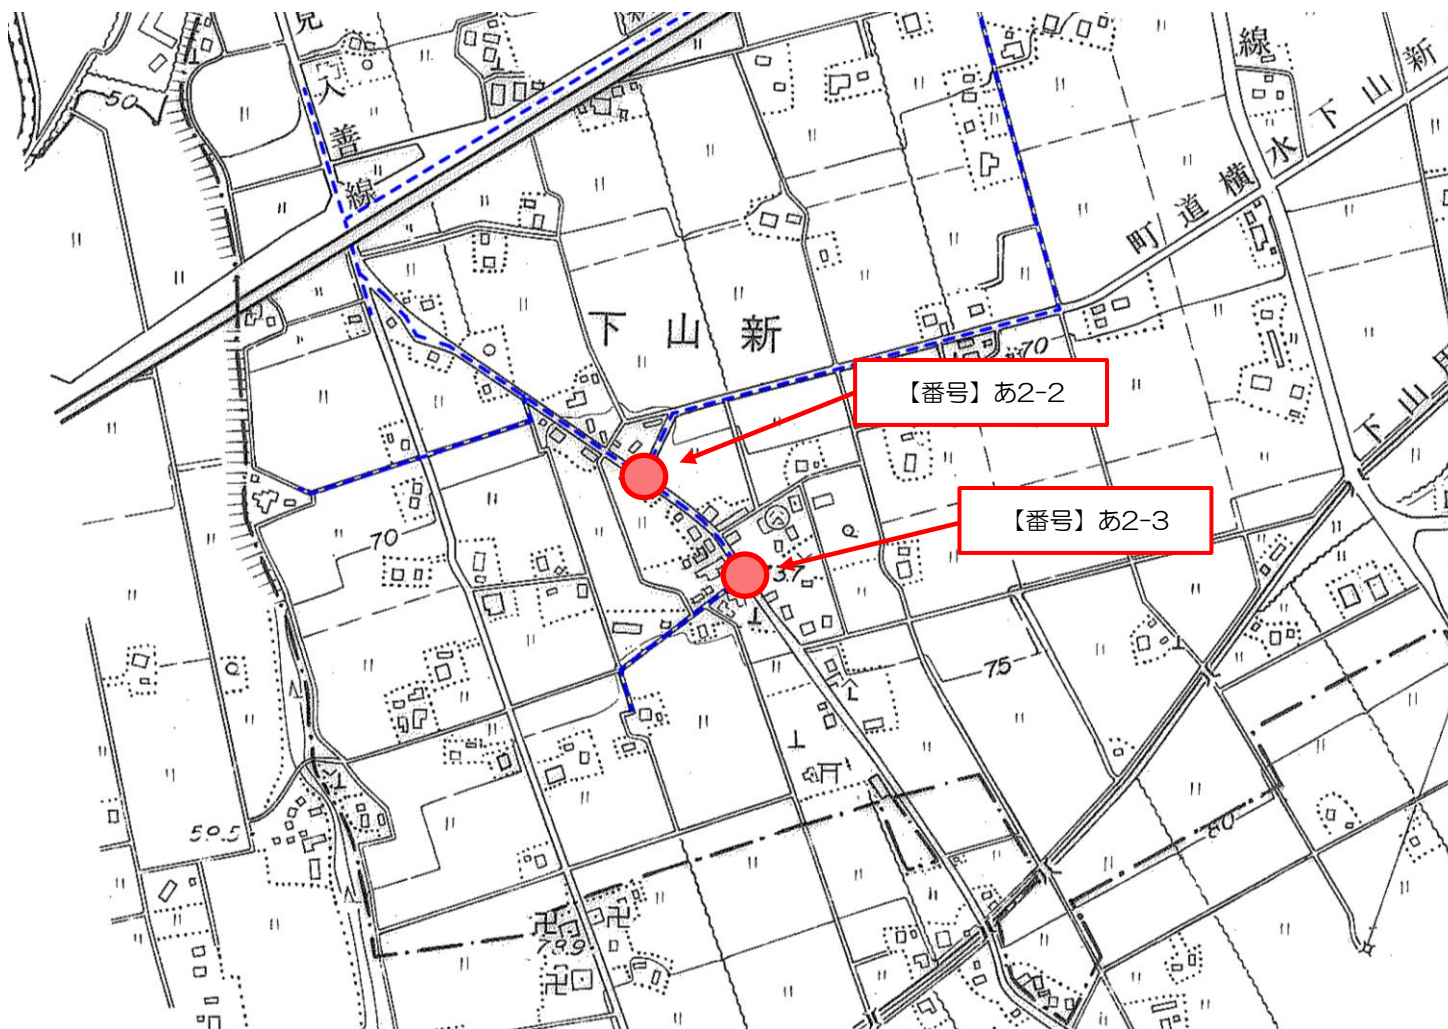

凡例	
	通学路
	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 あさひ野小学校区

【番号】あ2-2 【箇所】下山新地内 【路線】県道舟見入善線、町道横水下山線 【対策】実施済 【対策機関】富山県



【点検結果】

- ・交差点付近の見通しが悪く危険

【対策内容と実施状況】

○対策内容

減速表示の設置

○実施状況

実施済

【番号】あ2-3 【箇所】下山新地内 【路線】県道舟見入膳線 【対策】実施済 【対策機関】入善警察署、富山県



【点検結果】

- ・交通量が多く徒歩通学及び横断時危険

【対策内容と実施状況】


○対策内容

一旦停止線の引き直し
減速表示の設置

○実施状況

実施済

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

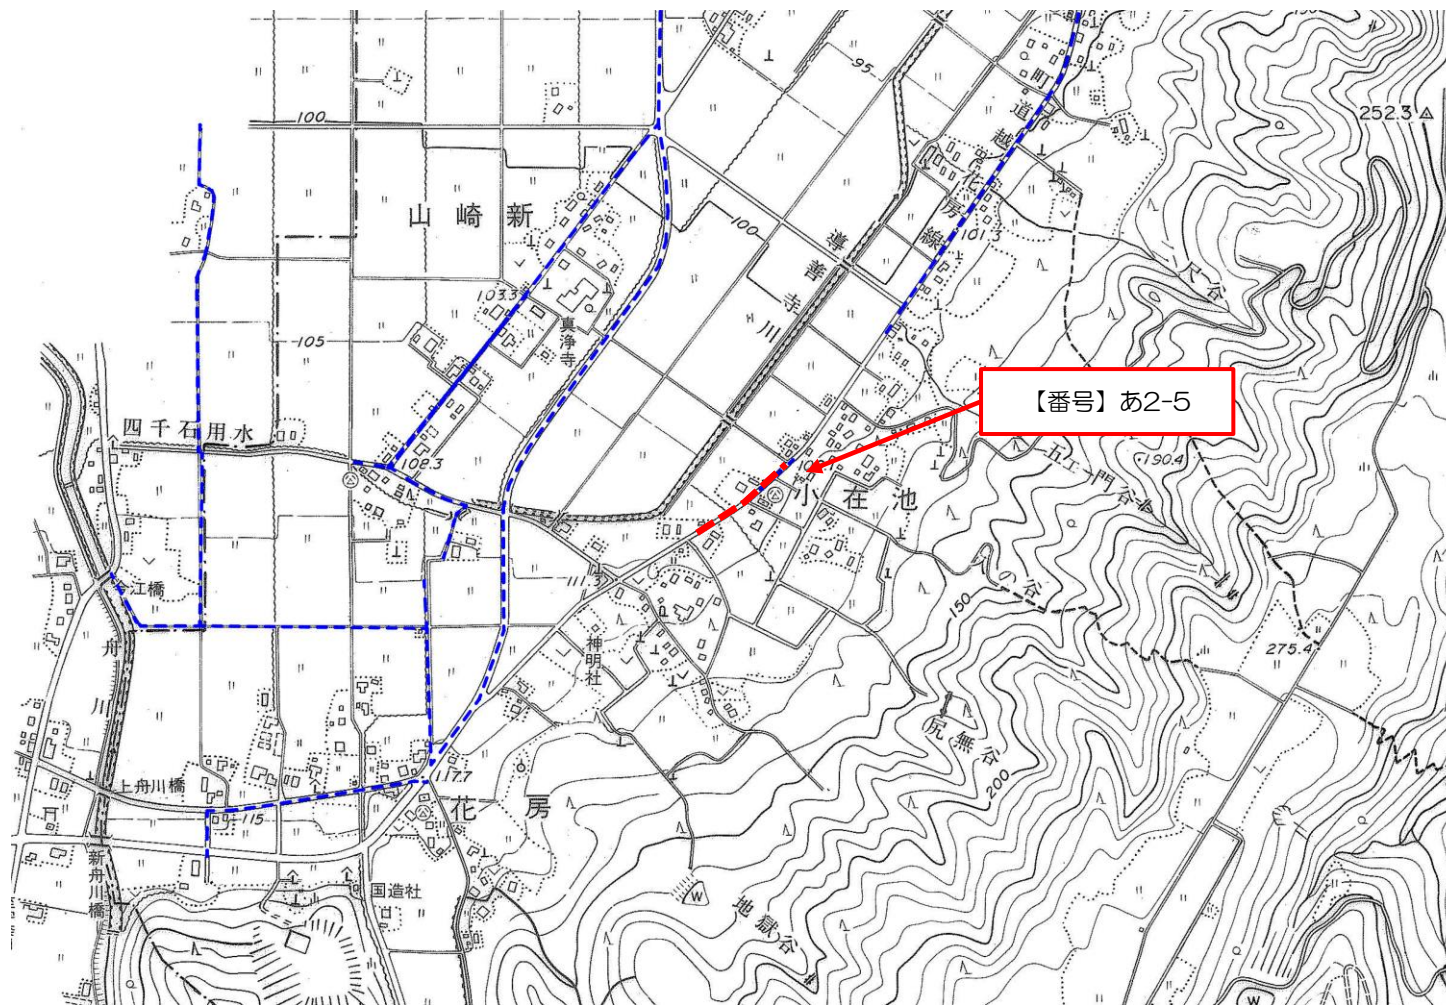

【番号】あ2-5

凡例	
----	通学路
----	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 あさひ野小学校区

【番号】あ2-4 【箇所】藤塚地内 【路線】県道朝日宇奈月線、町道藤塚下野金山線 【対策】実施済
 【対策機関】入善警察署、富山県



【点検結果】

- 交通量が多く徒歩通学及び横断時危険

【対策内容と実施状況】

○対策内容

- 既設路面表示の補修
- 減速表示の設置(路面表示)

○実施状況

- 実施済

【番号】あ2-5 【箇所】小在池地内 【路線】町道越花房線 【対策】実施済 【対策機関】朝日町



【点検結果】

- 道路幅が狭く危険

【対策内容と実施状況】

○対策内容

- 通学路表示設置

○実施状況

- 実施済み

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 あさひ野小学校区

【番号】 あ3-1 【箇所】 藤塚地内 【路線】 町道辻横水線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町



【点検結果】

- ・歩道に柵などがなく、境界がわかりづらいため、隣接する圃場などへの児童の転落の危険がある

【対策内容と実施状況】


○対策内容

境界を示す標識(デリネータ)の設置

○実施状況

実施済

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

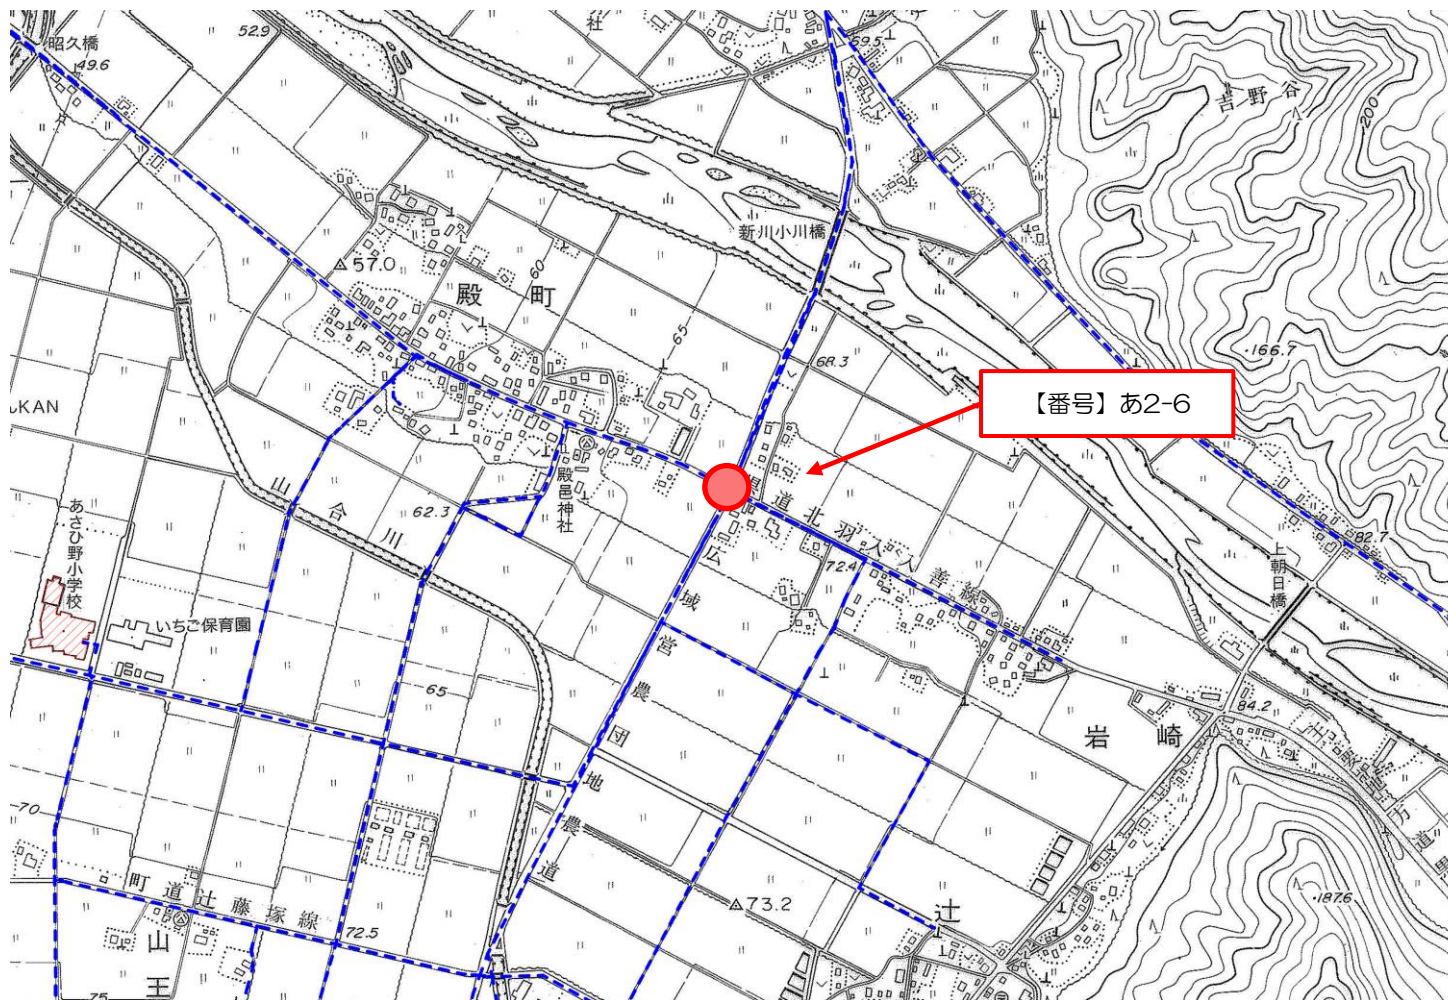

凡例	
	通学路
	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 あさひ野小学校区

【番号】あ2-6【箇所】殿町地内【路線】県道北羽入入善線、新川広域農道【対策】実施済【対策機関】富山県



【点検結果】

- ・信号交差点の安全確保（信号待ち時など）

【対策内容と実施状況】


○対策内容

保護構造物の設置等

○実施状況

実施済み（ラバーポール設置による車の通行経路の規制）

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

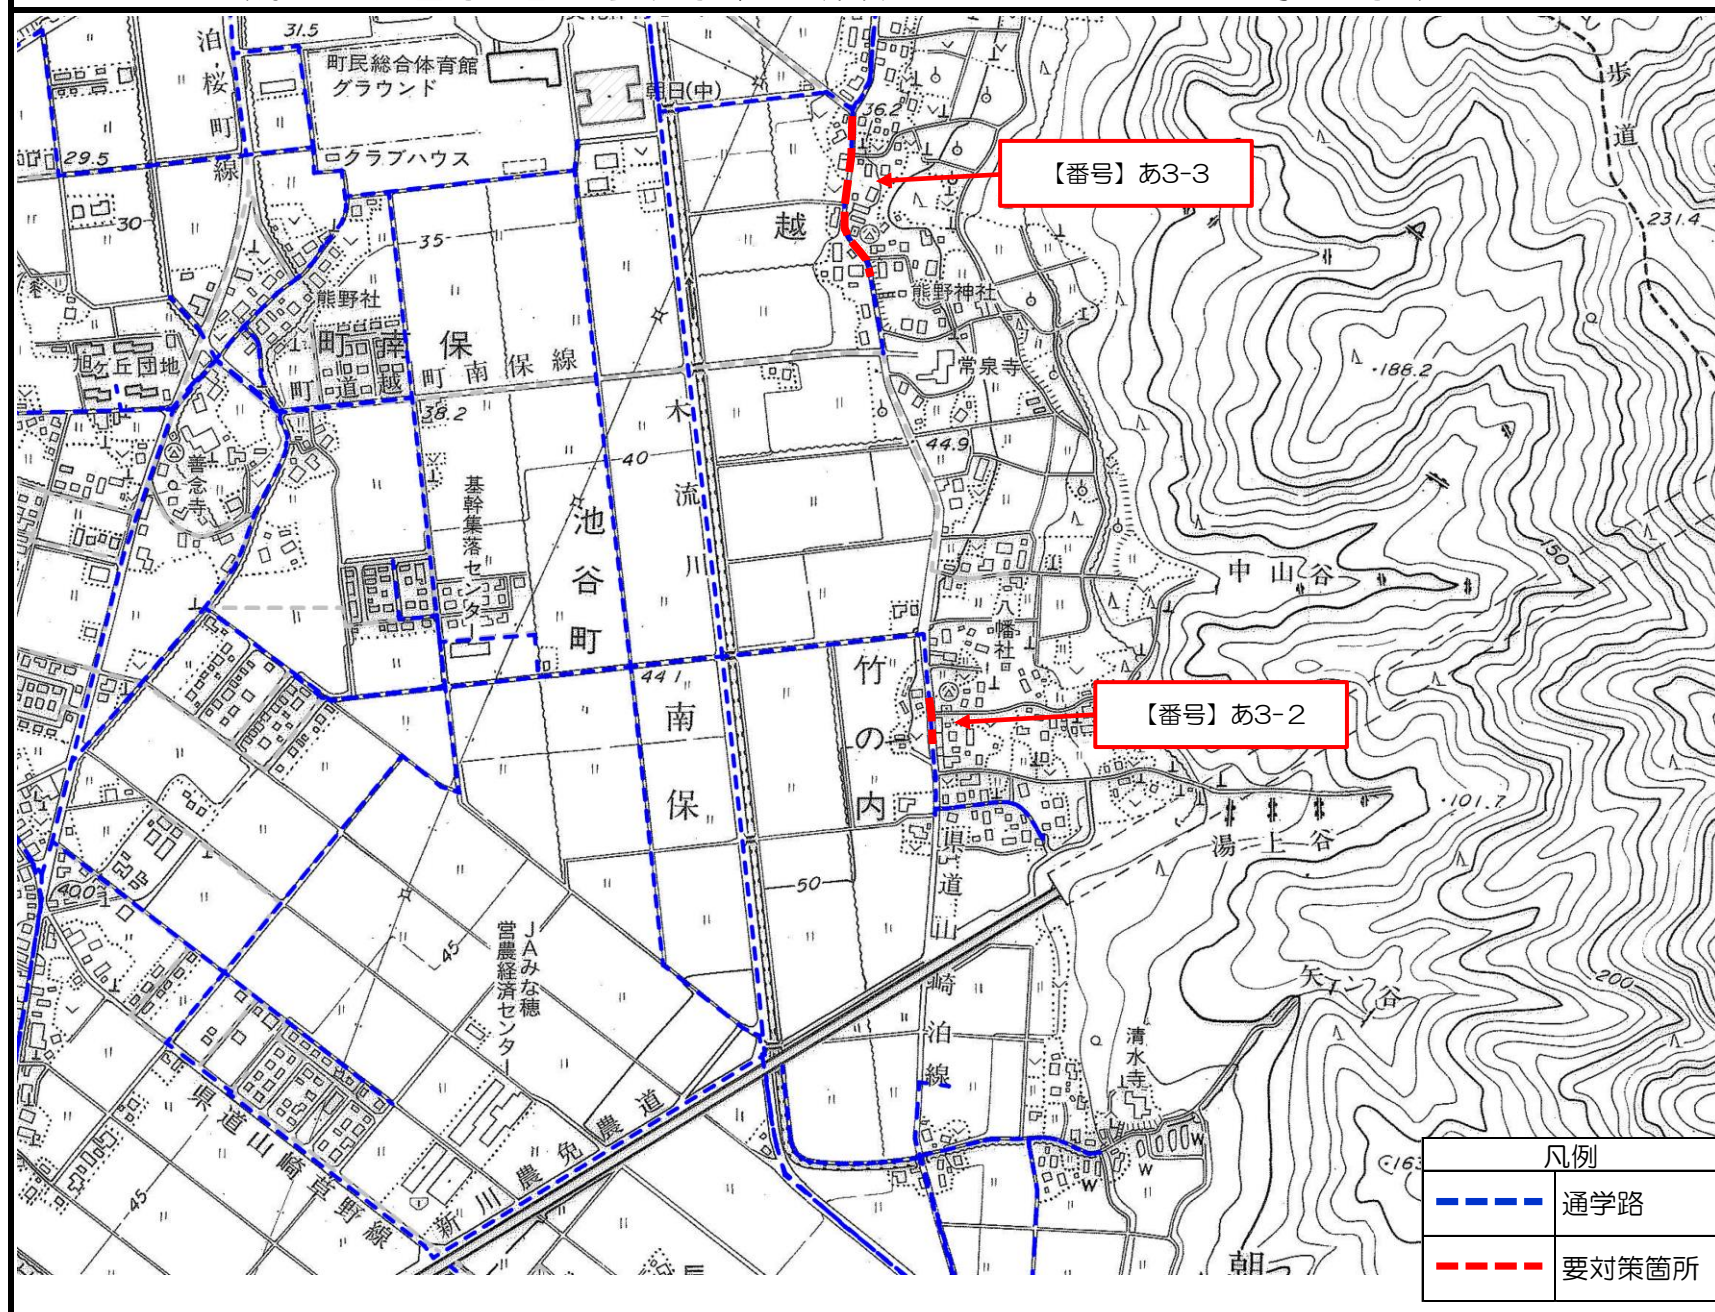

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 あさひ野小学校区

【番号】あ3-2 【箇所】竹ノ内地内 【路線】県道山崎泊線 【対策】実施済 【対策機関】富山県、入善警察



【点検結果】

- 車の速度が出やすいため危険

【対策内容と実施状況】

○対策内容

減速を促す路面表示等の追加及びパトロールの強化等

○実施状況

実施済

【番号】あ3-3 【箇所】南保越地内 【路線】県道山崎泊線 【対策】実施済 【対策機関】富山県、入善警察



【点検結果】

- 見通しが悪く危険

【対策内容と実施状況】


○対策内容

減速を促す路面表示等の追加及びパトロールの強化等

○実施状況

実施済

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

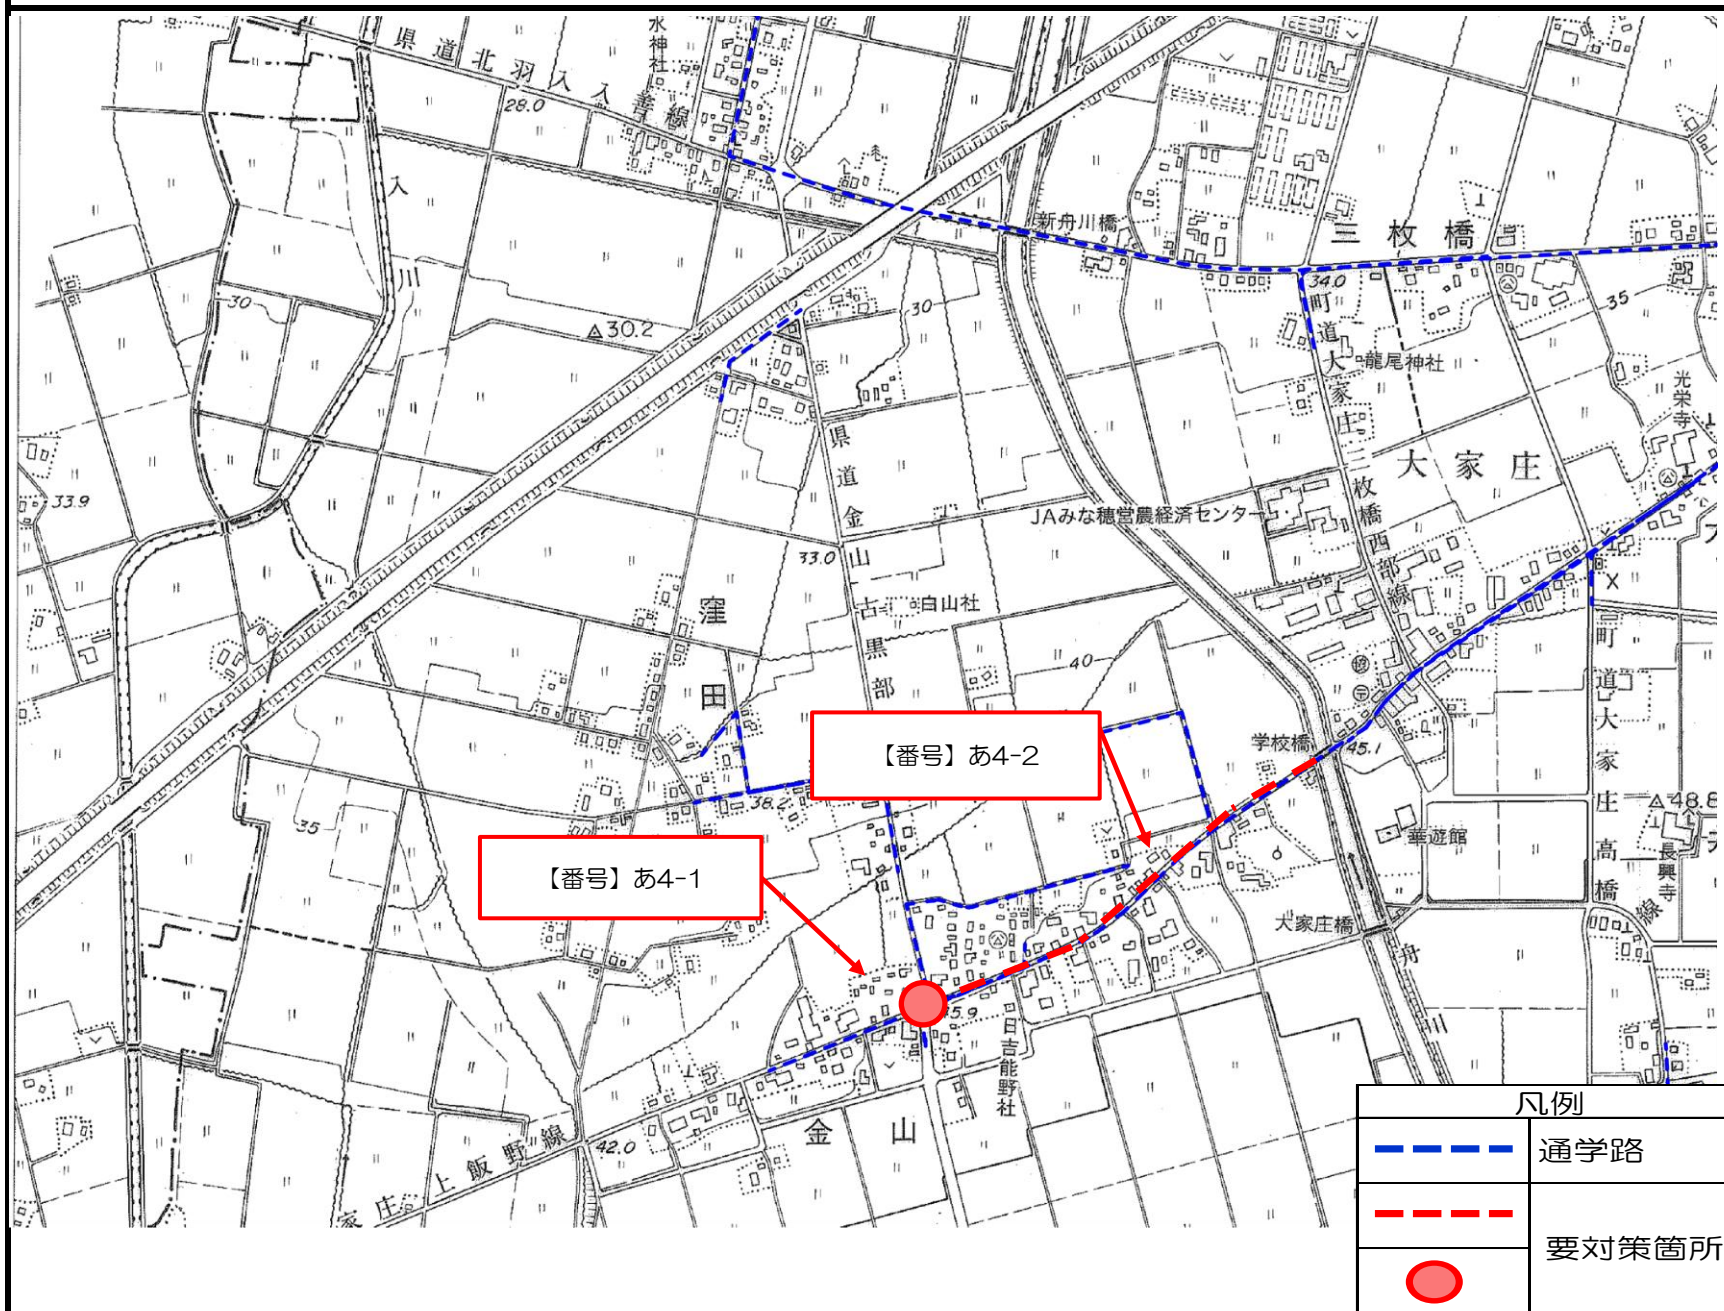

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 あさひ野小学校区

【番号】あ4-1 【箇所】金山地内 【路線】県道金山古黒部線/大家庄上飯野線 【対策】検討中 【対策機関】入善警察



【点検結果】

- ・見通しが悪く、交通量が多い。横断歩道がない。

【対策内容と実施状況】

○対策内容

横断歩道の設置

○実施状況

検討中

【番号】あ4-2 【箇所】金山地内 【路線】県道大家庄上飯野線 【対策】検討中 【対策機関】富山県



【点検結果】

- ・交通量が多い。歩道がない。


【対策内容と実施状況】

○対策内容

検討中（側溝の蓋、路面表示）

○実施状況

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

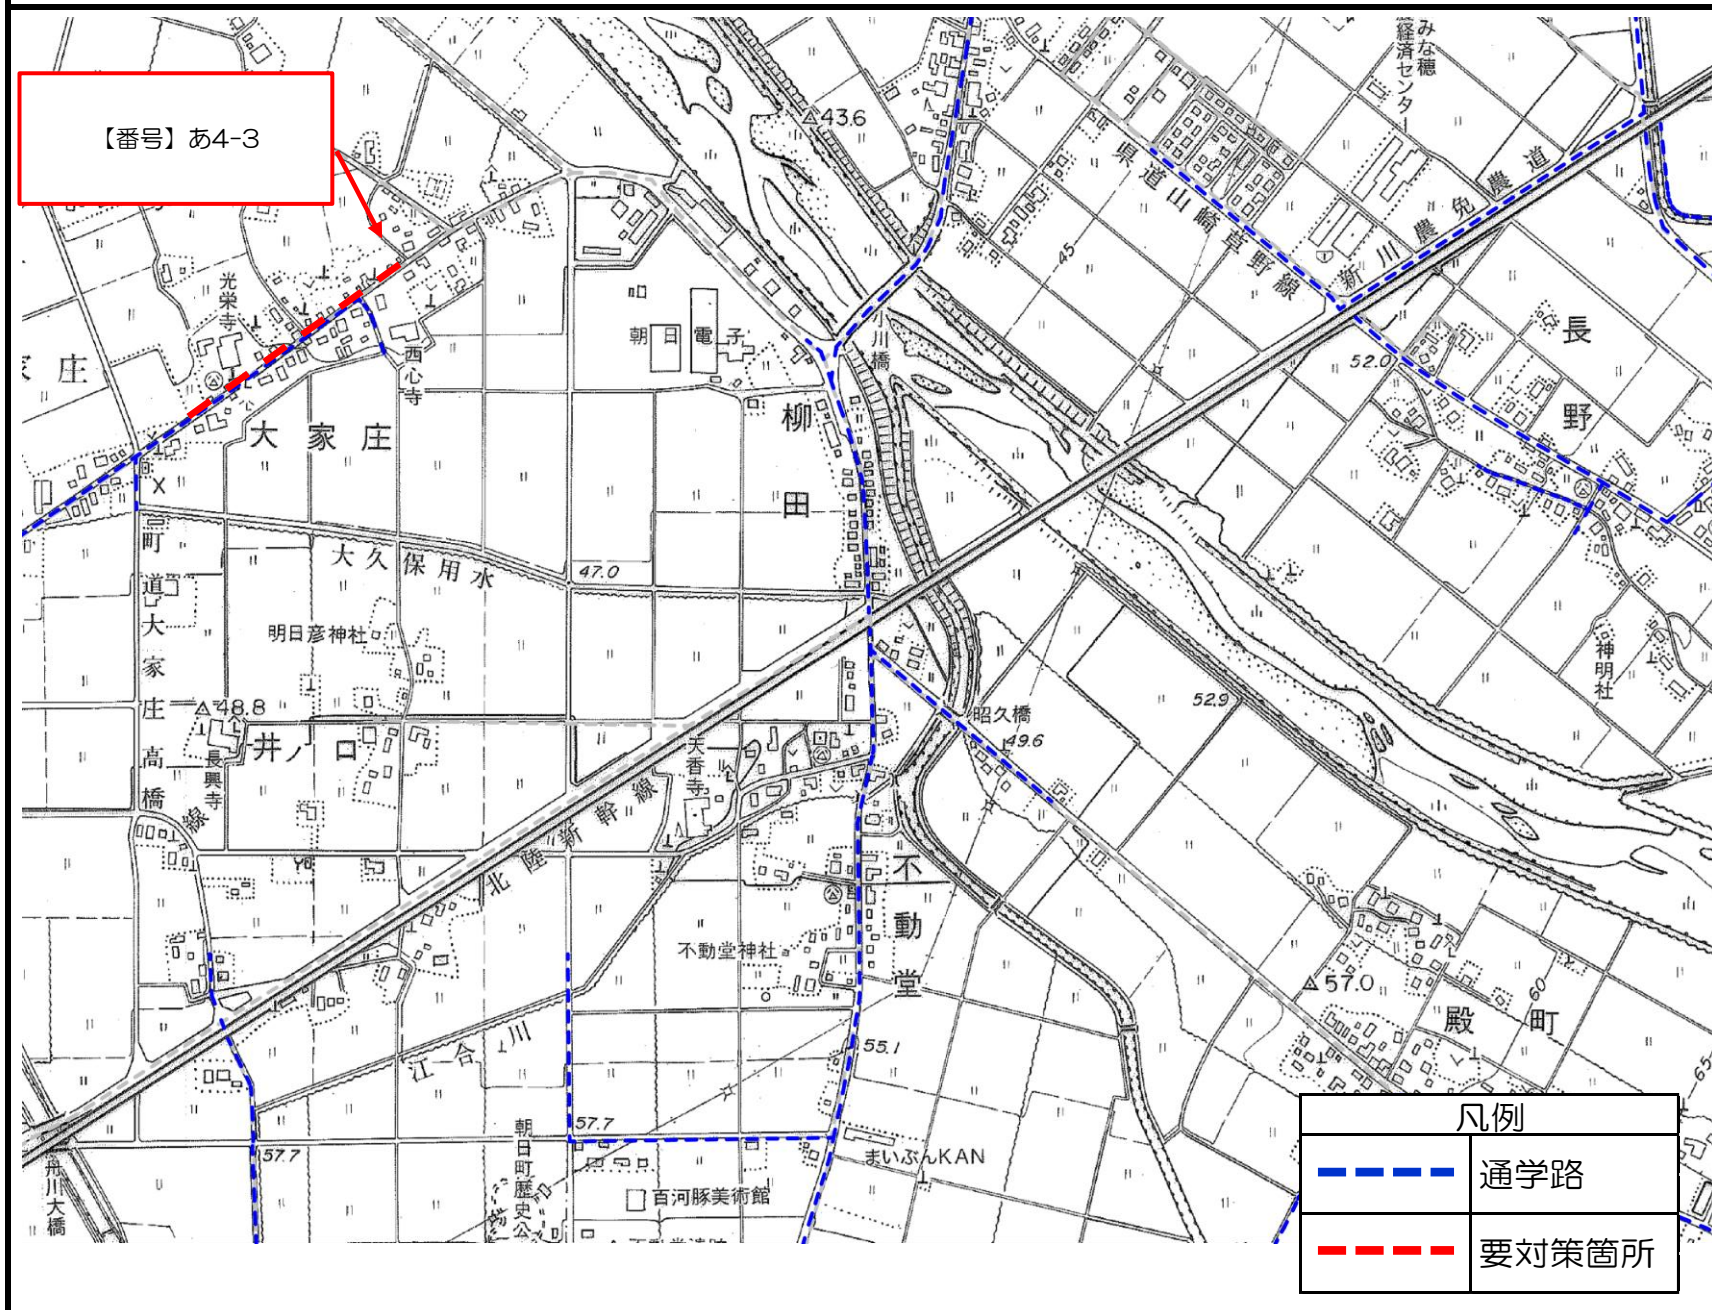

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区



【番号】あ4-4

凡例	
	通学路
	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 あさひ野小学校区

【番号】あ4-3 【箇所】大家庄地内 【路線】県道大家庄上飯野線 【対策】検討中 【対策機関】富山県



【点検結果】
・往通量が多い。歩道がない

【対策内容と実施状況】
○対策内容
検討中（路面表示）

○実施状況
検討中

【番号】あ4-4 【箇所】細野藤塚地内 【路線】町道藤塚山王線/殿町細野線 【対策】実施済 【対策機関】朝日町




【点検結果】
・停止線や看板がなく、停止しない車がある

【対策内容と実施状況】
○対策内容
優先道路の明確化とドット線の追加

○実施状況
実施済


朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

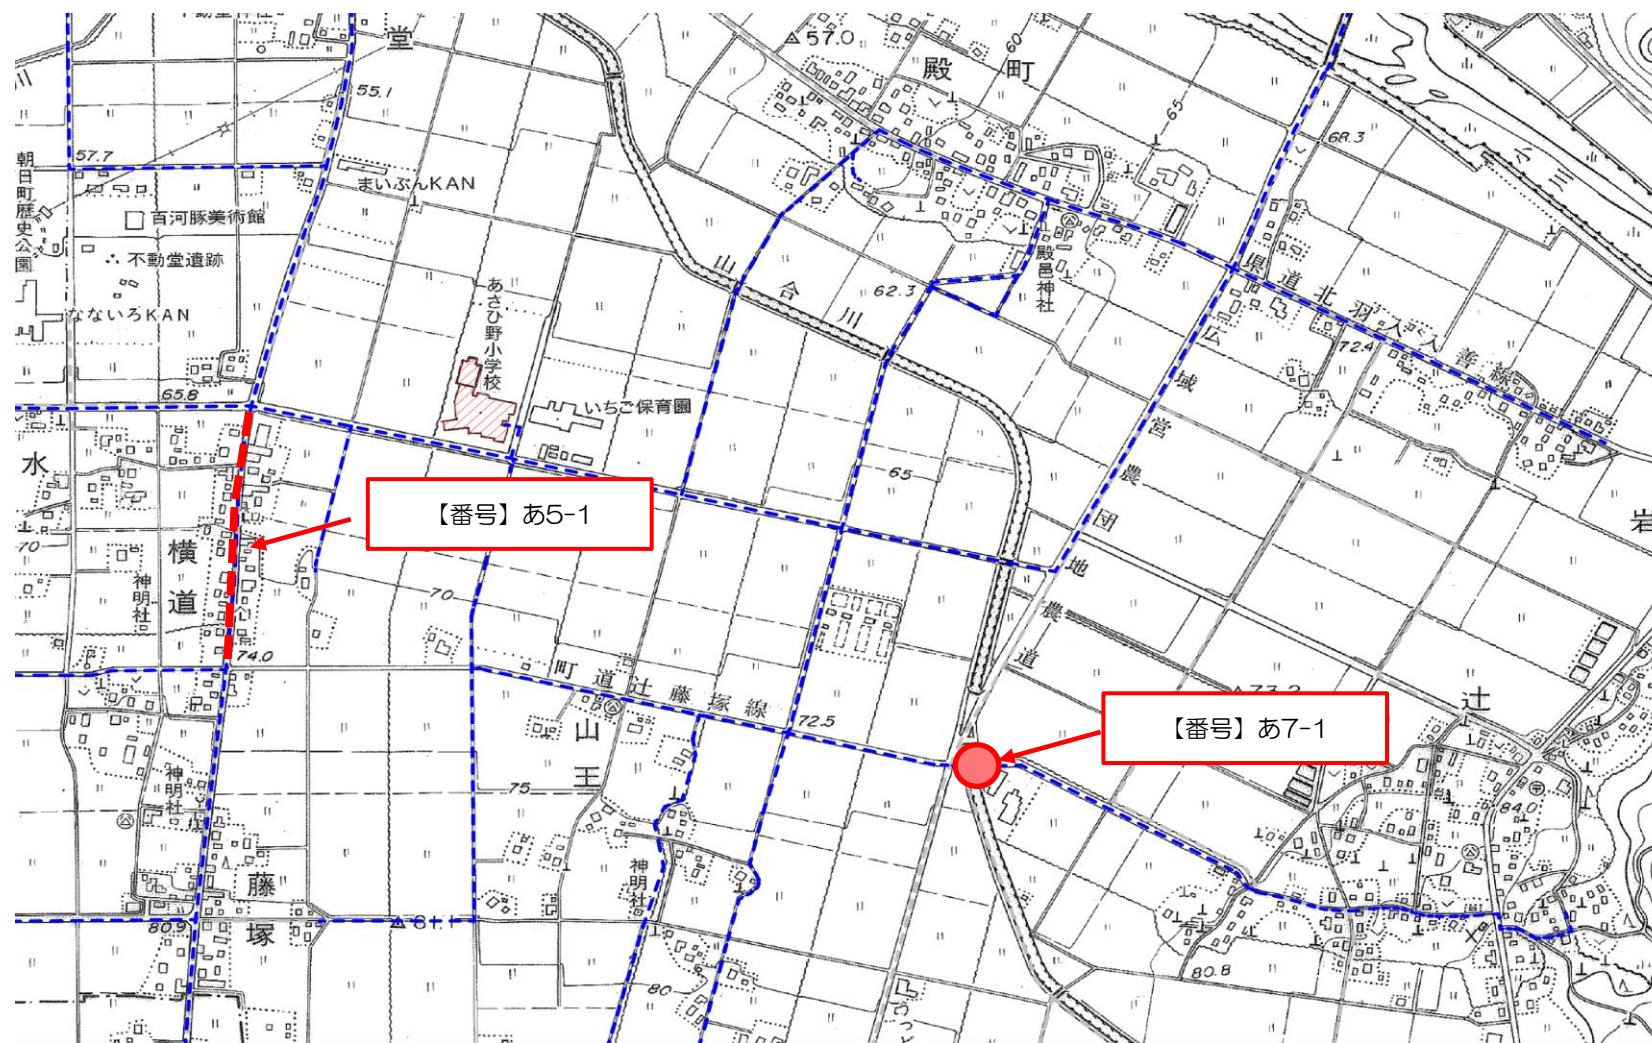

凡例	
	通学路
	要対策箇所

凡例	
	通学路
	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所位置図 あさひ野小学校区

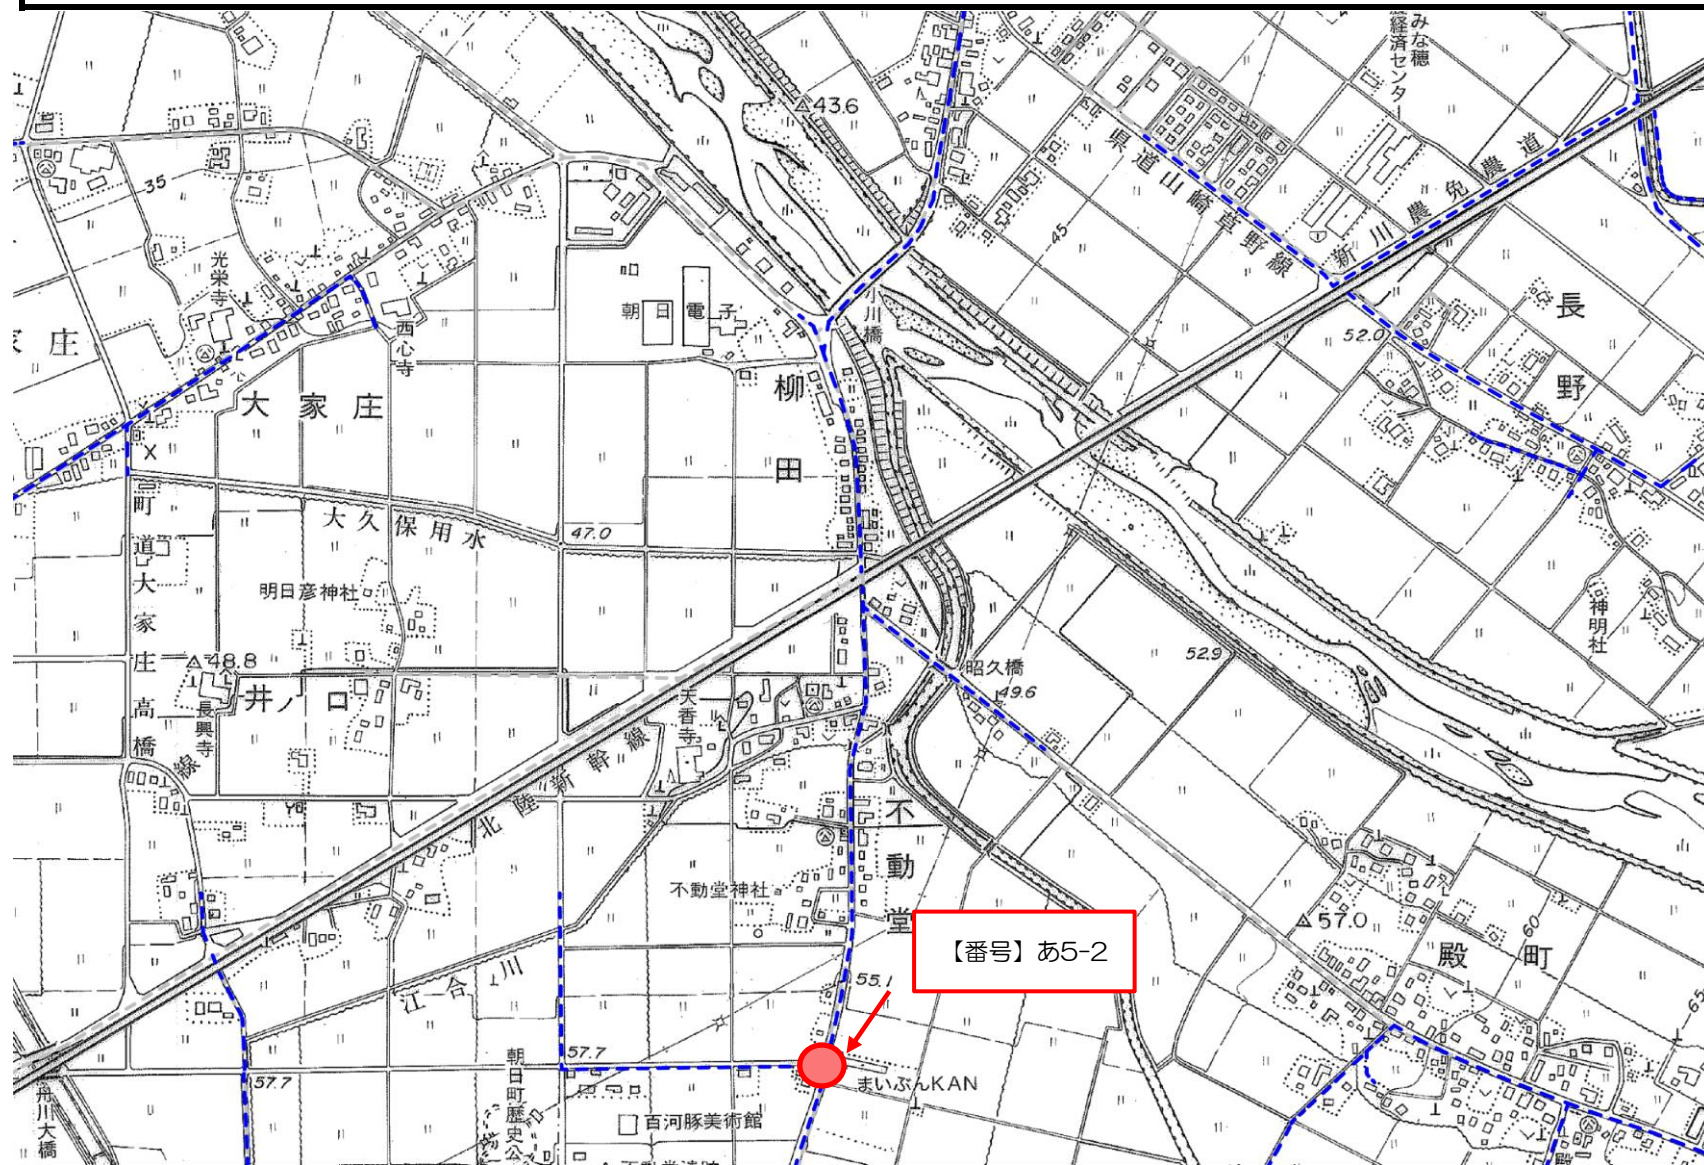

【番号】あ5-2

凡例	
---	通学路
●	要対策箇所

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 あさひ野小学校区

【番号】あ5-1 【箇所】横道地内 【路線】県道朝日宇奈月線 【対策】検討中 【対策機関】富山県



【点検結果】

- ・歩道の路面の状態が悪く危険

【対策内容と実施状況】

- 対策内容
補修
- 実施状況
検討中

【番号】あ5-2 【箇所】不動堂地内 【路線】県道朝日宇奈月線/町道不動堂馬坂線 【対策】実施済み 【対策機関】富山県、入善警察



【点検結果】

- ・建物があるため歩道の児童が確認しづらい

【対策内容と実施状況】

- 対策内容
歩道上に注意喚起の路面表示
一旦停止表示の補修
- 実施状況
一旦停止表示の補修/歩道上及び水門への注意喚起表示並びに着色

朝日町通学路 要対策箇所現況写真 あさひ野小学校区

【番号】あ7-1 【箇所】山崎地内 【路線】広域農道/町道辻藤塚線 【対策】実施中 【対策機関】朝日町



【点検結果】

- ・交通量が多く、車両の信号無視があり、危険

【対策内容と実施状況】

○対策内容

交差点の視認性の向上（ドットラインの整備）

○実施状況

実施中
